



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1744/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: [.....])

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: **M + M: RS PP Středočeský kraj**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: 316903150/8150

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Ing. Jan Semerád, jan.semerad@mottmac.com, +420 778 486 930

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: czech@mottmac.com, hana.cervenkova@mottmac.com

tel.: +420 221 412 800

ID: qwcnts7

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitelem – Členem sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele pro stavbu „**II/105 Velběhy - Spolí**“ v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace II/105 mezi obcemi Velběhy a Spolí:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 518.000,- Kč
DPH: 108.780,- Kč
včetně DPH: 626.780,- Kč

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 732.000,- Kč
DPH: 153.720,- Kč
včetně DPH: 885.720,- Kč

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 150.000,- Kč
DPH: 31.500,- Kč
včetně DPH: 181.500,- Kč

d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 180.000,- Kč
DPH: 37.800,- Kč
včetně DPH: 217.800,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 318.000,- Kč
DPH: 66.780,- Kč
včetně DPH: 384.780,- Kč

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena celkem	bez DPH	2.027.600,- Kč
	DPH	425.796,- Kč
Cena celkem	vč. DPH	2.453.396,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: ales.cermak@ksus.cz.
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj



Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.



Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 21-08-2017

V Praze dne 31. července 2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek



PODEPSÁN

za zhotovitele: **Společnost M + M:
RS PP Středočeský kraj**

Podpis:

Ing. Radko Bucek

Jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.

Podpis:

Ing. Jan Loško


Jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.

rádně oprávněněni podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednajícím prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED - organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.motlmac.com

Technická specifikace

Název akce : II/105 Velběhy - Spolí
Místo realizace akce : silnice II/105 Velběhy- Spolí ,staničení 35,174 – 34,350 km a 32,900-29,874 km
Most ev.č. 105-020, staničení 32,358 km
Most ev.č. 105-019, staničení 31,759 km

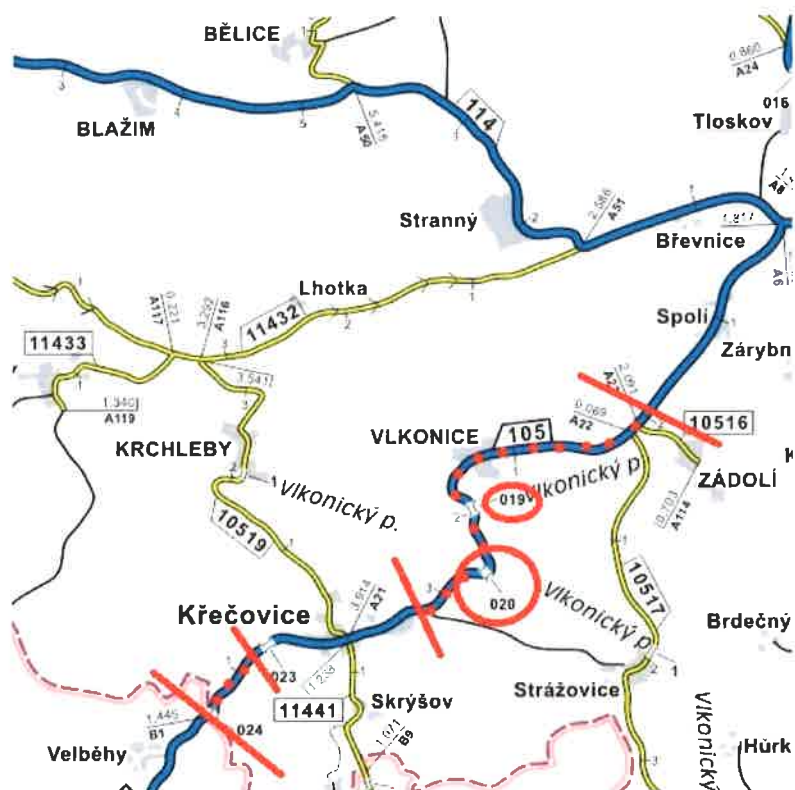

Základní popis akce:

Provedení diagnostiky a PD (vč. případné opravy objízdnych tras) zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

1. Úsek – II/105 Velběhy – Křechovice, staničení 35,174 – 34,350 km, délka úseku 824 m, průměrná šířka vozovky v 6,0 m.

Stávající stavebně technický stav a nevyhovující možnosti provedení opravy formou výměny živičného souvrství si vyžadají provedení diagnostiky vozovky včetně zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Bude nutno provést výměnu podkladních vrstev vozovky včetně místních sanací konstrukce silničního tělesa. Součástí bude též obnova odvodnění p.k. včetně návrhu vodorovného dopravního značení a případná rekonstrukce trubních propustků v trase.

2. Rekonstrukce mostu ev.č. 105-020, staničení 32,358 km, stav IV-uspokojivý

Popis prací: Zajistit projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci mostu. Stávající konstrukce (jedná se o kamennou původní část s rozšířením ŽB konstrukcí) je značně problematická. Dle výsledku hydrologického posouzení zvážit též přestavbu na propust, např. typu tubosider. Dle možností daných pozemkem provést rozšíření vozovky na mostě.

Stávající nosná konstrukce je desková, původní část je z kamenných desek, rozšířenou o jednopolovou část, jež tvoří železobetonová monolitická deska. Mostní podpěry jsou masivní tížné, zděné z nepravidelně opracovaného kamene. Most je přesypaný. Délka přemostění 2,700 m, šířka 8,800 m.

Zatížitelnost je omezena - normální na 25 t, na nápravu na 17,2 t.

Spárování zdiva opěr je porušené trhlinami. Zdivo pravého křídla opěry 3 je rozvolněné, spárování již zcela chybí. Beton rozšiřující žb. desky je degradovaný, porušený trhlinami s výluhy pojiva s krápníčky. V místě navázání na původní konstrukci výrazně aktivně zatéká. V krajní části jsou stopy po zatékání z boku konstrukce. Pod náterem zábradlí koroduje. Záchytný systém neodpovídá ČSN - chybí silniční svodidla.

3. Oprava mostu ev.č. 105-019 za obcí Vlkonice, staničení 31,759km, stav III-dobrý

Dle výsledků BMP z roku 2015 je nutno provést nezbytné opravy, které budou mít pozitivní vliv na zvýšení životnosti mostu.

Je nutno provést výměnu zádržného systému –neodpovídá ČSN a dále zajistit sanaci lokálně porušených míst ŽB mostovky a říms. Vzhledem ke stavebnímu stavu odvodnění mostu (patrně jsou výluhy – izolační systém je nefunkční) se předpokládá zhotovení nové izolace mostovky a rekonstrukci odvodňovacích skluzů.

4. Úsek – II/105 Křečovice – Spolí, staničení 32,900 – 29,874 km, délka úseku 3 026 m, průměrná šířka vozovky v 6,0 m.

Stávající stavebně technický stav a nevyhovující možnosti provedení opravy formou výměny živičného souvrství si vyžádají provedení diagnostiky vozovky včetně zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení ev. ÚR. Bude nutno provést výměnu podkladních vrstev vozovky včetně místních sanací konstrukce silničního tělesa. Součástí bude též obnova odvodnění p.k. včetně návrhu vodorovného dopravního značení a případná rekonstrukce trubních propustků v trase. V případě prostorových možností daných pozemkem ve vlastnictví investora zvážit případné rozšíření na kategorii S7,5.

V průtahu obce Křečovice bude provedena rekonstrukce vozovkového souvrství v rámci homogenizace v roce 2017, most ev.č. 105-024 byl rekonstruován v roce 2016.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o VZ**“) a vyhláškou č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o předmětu stavebních prací**“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

d) Výkon IČ k SP a ÚR

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním

řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

e) Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).

Vzhledem k charakteru zakázky (případná rozšíření stávající p.k. a kompletní rekonstrukce mostního objektu) se uvažuje s případným územním řízením.

Zdůvodnění záměru akce:

Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, odstranění neuspokojivého stavu mostu 105-020 a zvýšení jeho zatížitelnosti. **Úsek včetně mostů bude navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3.**

Součástí projektových prací pro most ev.č. 105-020 bude zjištění inženýrských sítí a případné vymístnění z mostního objektu. Po dokončení stavby bude provedena obnova krytu vozovek objízdných tras. Projektová dokumentace bude obsahovat též DIO a rozpočet v cenách URS.

Součástí bude vypracování HMP včetně uvedení do systému BMS.

Fotodokumentace:



II/105– staničení cca 33,200 km

Deformace vozovky, rozpad krajnice



II/105, most ev.č. 105-020

Chybí zádržný systém



II/105, most ev.č. 105-020

Vtoková část mostu



II/105, most ev.č. 105-020

Výtoková část mostu



II/105, most ev.č. 105-020

Silné zatékání



II/105 propustek staničení cca 30,700 km

Deformace krajnice, nefunkční propustek



II/105 staničení cca 30,000 km

Ztráta mikrotextury a koroze vozovky

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„II/105 Velběhy - Spojí“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. - část VD-ZDS*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	24,325,000						
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	800	
						162	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ****)	560,000	205,000	800,000	350,000	177,000	130,200	2,222,200
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	518,000	180,000	732,000	318,000	150,000	129,600	2,027,600
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	92.50%	87.80%	91.50%	90.86%	84.75%	99.54%	91.24%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soutěpisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soutěpisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	0%
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	0%
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	0%
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	0%
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	0%

V Praze dne 29. června 2017


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel


MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottimac.com

Pa

„II/105 Velběhy - Spolí“ – PD

žlutě ocení uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	70,000.00
Předběžný GTP dle TP 76	30,000.00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a omice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	70,000.00
Průzkumy DUR celkem	170,000.00
DÚR	
Průvodní zpráva	88,000.00
Výkresová část	210,000.00
Dokladová část	50,000.00
DÚR celkem	348,000.00
DUR celkem včetně průzkumů	518,000.00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	30,000.00
Podrobný GTP dle TP 76	70,000.00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	30,000.00
Průzkumy DSP celkem	130,000.00
DSP	
Průvodní zpráva	60,000.00
Souhrnné technické řešení	60,000.00
Stavební část	412,000.00
DIO	30,000.00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20,000.00
BOZP	20,000.00
DSP celkem	602,000.00
DSP celkem včetně průzkumů	732,000.00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	90,000.00
majetkoprávní podklady	70,000.00
podání žádosti bez poplatků	20,000.00
IČ celkem	180,000.00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	110,000.00
majetkoprávní podklady	168,000.00
podání žádosti bez poplatků	40,000.00
IČ celkem	318,000.00
PDPS	
Technická zpráva	20,000.00
Výkresová část	90,000.00
ZTKP	20,000.00
Soupis prací a rozpočet	20,000.00
PDPS celkem	150,000.00
celkem bez DPH	1,898,000.00

V Praze dne 29. června 2017



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 934/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com



Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„II/105 Velběhy - Spolí“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	800	38,400
Cena AD celkem bez DPH	114		91,200
Celkem	162		129,600

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.


Díleč činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	15
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	14
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	15
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	40
celkem hodin	114
Kč/hod	780
Celkem Kč bez DPH	88,920

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši


Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 29. června 2017


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com


Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

Po
