

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

číslo objednatele: *S-5700/DOP/2015*

číslo zhotovitele: 15 181 00

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: 005-70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „Objednatel 1“

a

Obec Klíneč

se sídlem: Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

zastoupená: Markétou Hanákovou, starostkou obce Klíneč

IČO: 00640719

DIČ: CZ00640719

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 388079359/0800

dále jen „Objednatel 2“

Objednatel 1 a Objednatel 2 dále společně jako „Objednatelé“

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným –
jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně
dle výpisu z OR)

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.

dále jen „Zhotovitel“

Objednatelé a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatelé společně provedli výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „**III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice**“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 3.1 a 3.2. této Smlouvy, na rekonstrukci a odvodnění silnice, rekonstrukci propustků, opěrných zdí, seřezání krajnic a čištění příkopů strojně, bezpečnostní prvky na silnici, otočku autobusu, vybudování chodníků na třech úsecích komunikace č. III/1025 v obci Klíнец, veřejné osvětlení, dvě zastávky autobusů (s nástupními ostrůvky, přístřeškem, příslušenstvím a mobiliářem, bez zálivu, pro Objednatele (dále jen „**Veřejná zakázka**“; dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);
- (B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem 1 vybrána jako nejvhodnější;
- (C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má příslušná oprávnění; a
- (D) Objednatelé mají s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla vymezeného v čl. 3 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému zhotovení díla.
- 1.2 Účelem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 3.1 a 3.2. této Smlouvy, na rekonstrukci a odvodnění silnice, rekonstrukci propustků, opěrných zdí, seřezání krajnic a čištění příkopů strojně, bezpečnostní prvky na silnici, otočku autobusu, vybudování chodníků na třech úsecích komunikace č. III/1025 v obci Klíнец, veřejné osvětlení, dvě zastávky autobusů (s nástupními ostrůvky, přístřeškem, příslušenstvím a mobiliářem, bez zálivu, pro provedení akce „**III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „**Stavba**“) a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. OBJEDNATELÉ

- 2.1 Objednatelé jsou oprávněni z této Smlouvy společně a nerozdílně, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.

- 2.2 Objednatelé se dohodli, že ve vztahu ke Zhotoviteli je oprávněn vůči Zhotoviteli vystupovat Objednatel č. 1, vůči kterému je Zhotovitel povinen a oprávněn plnit veškeré povinnosti nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak. Hovoří-li tato Smlouva o Objednateli či Objednatelích, míní se tím Objednatel uvedený v tomto odst. 2.2 této Smlouvy, neplyne-li z daného ustanovení výslovně jinak. Tím není dotčeno ustanovení odst. 2.1 této Smlouvy. Objednatelé jsou oprávněni písemně oznámit Zhotoviteli nového Objednatele oprávněného vystupovat vůči Zhotoviteli v rozsahu dle tohoto odstavce tohoto článku.
- 2.3 Cenu díla jsou povinni zaplatit Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 dlelem stanoveným ve Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů. Fakturovat cenu díla dle této Smlouvy bude Zhotovitel Objednatelům každému individuálně za jeho projekční a stavební část (odsouhlasené stavební objekty).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující dílo: zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 3.1 a 3.2. této Smlouvy, na rekonstrukci a odvodnění silnice, rekonstrukci propustků, opěrných zdí, seřezání krajnic a čištění příkopů strojně, bezpečnostní prvky na silnici, otočku autobusu, vybudování chodníků na třech úsecích komunikace č. III/1025 v obci Klíneč, veřejné osvětlení, dvě zastávky autobusů (s nástupními ostrůvky, přístřeškem, příslušenstvím a mobiliářem, bez zálivu, (dále jen „**Dílo**“; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. 3.2 Smlouvy; zadání a podklady tvoří přílohu č. 2. Objednatelé se zavazují Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 6 této Smlouvy.
- 3.2 Součástí Díla je zejména:
- 3.2.1 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „**Projektová dokumentace pro územní řízení**“);
- 3.2.2 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „**Projektová dokumentace pro stavební řízení**“);
- 3.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“) (dále jen „**Projektová dokumentace pro provádění stavby**“);

- 3.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen „**Záborový elaborát**“);
- 3.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů Objednatelů upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Výkaz výměr**“);
- 3.2.6 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen „**Položkový rozpočet stavby**“);
- 3.2.7 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „**Dokladová část**“);
- 3.2.8 zastupování Objednatelů (či jednoho z Objednatelů, který bude Objednateli specifikován) na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednatelům (dále jen „**Zastupování v územním řízení**“);
- 3.2.9 zastupování Objednatelů (či jednoho z Objednatelů, který bude Objednateli specifikován) na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednatelům (dále jen „**Zastupování ve stavebním řízení**“);
- 3.2.10 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatelů (či jednoho z Objednatelů, který bude Objednateli specifikován), tedy uzavření dohod s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; Zhotovitel tyto dohody uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právní předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatelů (včetně jejich vnitřních předpisů) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem v souladu s metodikou kraje, upravující uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen „**Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby**“);
- 3.2.11 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen „**Zajištění věcných břemen**“);
- 3.2.12 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatelů (či jednoho z Objednatelů, který bude Objednateli specifikován) tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i pravidelný v rozsahu podle

- potřeb Objednatele 2 a dle odborného uvážení Zhotovitele (dále jen „**Autorský dozor**“);
- 3.2.13 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednateli jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen „**Účast na jednání hodnotící komise**“);
- 3.2.14 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných zakázek; a
- 3.2.15 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací (dále jen „**Diagnostika stavby**“).
- 3.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a (ii) umožňují, aby Objednatelé mohli bez součinnosti Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst. 3.2.1 až 3.2.3 musí být předána ve formátu pdf a dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný. Takovým formátem může být např. xml formát odpovídající uvedené vyhlášce.
- 3.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby a stavebního povolení dle pokynů Objednatelů a odborného uvážení Zhotovitele.
- 3.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností Zhotovitele dle odst. 3.2.10 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy mezi investory potřebné pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 3.2 Smlouvy.
- 3.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že:
- 3.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;
- 3.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

- 3.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 3.2 této Smlouvy v následujících lhůtách:
- 4.1.1 Projektovou dokumentaci pro územní řízení vyhotoví Zhotovitel do 90 dnů od podpisu SoD;
 - 4.1.2 Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vyhotoví Zhotovitel do 70 dnů od vydání ÚR;
 - 4.1.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Zhotovitel do 40 dnů od vydání SP;
 - 4.1.4 Záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 45 dnů od podpisu SoD;
 - 4.1.5 Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 40 dnů od vydání SP;
 - 4.1.6 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 40 dnů od vydání SP;
 - 4.1.7 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení;
 - 4.1.8 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednateli alespoň třicet (30) dnů předem;
 - 4.1.9 účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.
- 4.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 4.1 Smlouvy, provede Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.
- 4.3 Lhůty dle odst. 4.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho části provést i před sjednaným termínem.
- 4.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 4.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
- 4.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatelů.
- 4.7 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-li si Smluvní strany jinak.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 3.1 Smlouvy) dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 4.1 a 4.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:
- 5.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé soutěže);
 - 5.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
 - 5.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
 - 5.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého dotačního programu;
 - 5.1.5 pokyny Objednatelů; a
 - 5.1.6 dokumentací Veřejné zakázky.
- 5.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 5.1 této Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 5.1 Zhotovitel Objednatel předem upozorní.
- 5.3 Dílo lze předat i po částech.
- 5.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení Zhotovitele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyznat Zhotovitele písemně.
- 5.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
- 5.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla každému z Objednatelů následující počet paré uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace	Počet paré
Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním úřadem	jedenkrát (1)
Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním úřadem	jedenkrát (1)
Projektová dokumentace pro provádění stavby	pětkrát (5)
Záborový elaborát	dvakrát (2)
Výkaz výměr	pětkrát (5)
Položkový rozpočet stavby	dvakrát (2)

Dokladová část	třikrát (3)
Zastupování v územním řízení - originál platného územního rozhodnutí o povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci	jedenkrát (1)
Zastupování v stavebním řízení - originál platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	jedenkrát (1)
Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená smlouva	dvakrát (2)
Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva	jedenkrát (1)

- 5.7 Současné předá Zhotovitel každému z Objednatelů na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické podobě ve formátech dle odst. 3.3 této Smlouvy.
- 5.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla.
- 5.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.
- 5.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělkami, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělkami odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.
- 5.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení. V takovém případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy.

6. CENA DÍLA

- 6.1 Cena za Dílo dle odst. 3.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	510 000 Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení	230 000 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	100 000 Kč
Záborový elaborát	40 000 Kč

Výkaz výměr	12 500 Kč
Položkový rozpočet stavby	12 500 Kč
Dokladová část	30 000 Kč
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	50 000 Kč
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	50 000 Kč
Autorský dozor	30 000 Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	2 500 Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	55 000 Kč
Cena celkem	1 122 500 Kč

- 6.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 6.4 Smlouvy.
- 6.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 6.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.
- 6.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výši ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.
- 6.6 Objednatelé mohou vypsát výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatelé jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23 zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností

Zhotovitele prokázat existenci okolností, které s náležitou péčí nemohl předvídat. V pochybnostech se má za to, že nenastaly.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatelé uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 6 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 2 této Smlouvy. Objednatelé nebudou poskytovat na provedení Díla zálohy.
- 7.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, následně:
- 7.2.1 části Díla dle odst. 3.2.1 až 3.2.9 Smlouvy budou Objednatelům fakturovány řádným daňovým dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy;
- 7.2.2 části Díla dle odst. 3.2.10 až 3.2.15 Smlouvy budou účtovány na základě Objednateli písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení.
- 7.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude obsahovat název akce „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“.
- 7.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídel Objednatelů, nedohodou-li se Smluvní strany jinak.
- 7.5 Splatnost faktur se sjednává na šedesát (60) dnů od jejich doručení každému Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu dotčeného Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat dotčenému Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 7.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 7.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány ceny jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 6 Smlouvy včetně DPH („Zádržné“). Zbylou část ceny každé části Díla bude Zhotovitel oprávněn Objednatelům vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělkami po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.
- 7.8 Objednatelé jsou oprávněni pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči Objednatelům podle této Smlouvy.

8. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

- 8.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

- 8.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda Dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 8.3 Objednatelé nabydou vlastnické právo k Dílu či jeho části v poměru stanoveném v čl. 2 této Smlouvy okamžikem jeho provedení.
- 8.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednatelům (každému z nich) časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 3.2 Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednatelům licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednatelům předat.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

- 9.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách.
- 9.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.
- 9.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednatelům informaci o činnosti a postupu prováděných prací 1x měsíčně písemnou formou.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen Objednatelům neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatelů v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
- 9.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dotčeného Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednatelům proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatelů vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednatelům ve prospěch třetí osoby.
- 9.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednavatelů, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednatelům za jejich nesoučinnost sám.

10. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 10.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu třicet šest (36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů díla. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší.
- 10.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné smlouvy prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.
- 10.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, jsou Objednatelé oprávněni sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sami. Zhotovitel se zavazuje

Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatелеm. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

- 10.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatelů od Smlouvy odstoupit.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

- 11.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinili Objednatelé. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 5.8 této Smlouvy.
- 11.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.
- 11.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 11.2 Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatelé přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit.
- 11.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 11.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za:

- 12.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatelů, veřejného majetku či majetku třetích osob;
 - 12.1.2 škodu vzniklou Objednatelům či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím osobám a Objednatelům v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;
 - 12.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednatelům jako zadavatelům veřejné zakázky a příjemcům dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla;
 - 12.1.4 udělení shora popsanych sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně); a
 - 12.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno.
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednatelům záruku, že cena za kterou bude vysoutěženo zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 3.2.3 této Smlouvy nebude v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Zhotovitel tuto záruku, nahradí tomu Objednateli, který bude investorem Stavby, případně oběma Objednatelům společně a nerozdílně, škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedení Stavby, nejdéle však šedesát (60) měsíců po provedení Díla.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatelé (každý z nich nezávisle na sobě) mohou odstoupit od Smlouvy:
- 13.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;
 - 13.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - 13.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatelů, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
 - 13.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

- 13.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.
- 13.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatelů přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (10) denní lhůtu.
- 13.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku druhé Smluvní strany.
- 13.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 13.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.
- 13.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 13.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.
- 13.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):
- 13.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatele pozbydou;
- 13.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.
- 13.11 Částky dle odst. 13.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.
- 13.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodluženě Objednateli. Převzetím nabydou Objednatelé vlastnictví k Dílu či předaným částem v poměru dle čl. 2 této

Smlouvy. Objednatel Dílo či jeho části nepřevzme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 5 této Smlouvy přiměřeně.

14. SMLUVNÍ POKUTA

- 14.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s odst. 4.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednatelům (společně a nerozdílně) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.
- 14.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele.
- 14.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 11.3 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednatelům (společně a nerozdílně) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 14.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatelé jsou vedle smluvních pokut oprávněni vůči Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednatelům v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 14.2 této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 12.2 této Smlouvy.

15. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 15.1 Oprávněnými zástupci Objednatelů jsou:

15.1.1 Za Středočeský kraj:

- (a) ve věcech technických Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy, telefon: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz
- (b) ve věcech smluvních Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek, telefon: 257 280 237, e-mail: moravcikova@kr-s.cz
- (c) kontaktní osoba projektu Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí oddělení pozemních komunikací, telefon: 257 280 428, e-mail: urbancova@kr-s.cz

15.1.2 Za obec Klíneč:

- (a) ve věcech smluvních Markéta Hanáková, starostka obce Klíneč, telefon: 257 730 306, e-mail: marketa.hanakova@obecklinec.eu

- 15.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

- 15.2.1 smluvních je Ing. Václav Hvízdal, telefon 244 462 219, 606 646 680, e-mail pontex@pontex.cz

- 15.2.2 technických je Ing. Jindřiška Čamrová, telefon 241 096 760, 724 011 007, e-mail camrova@pontex.cz.

16. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.
- 17.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 17.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 17.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.
- 17.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednateli a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran.
- 17.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 17.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatelů, dle § 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.
- 17.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 17.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

17.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.

17.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

17.11.1 Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

17.11.2 Příloha č. 2: Technická specifikace

17.12 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel 1 obdrží tři stejnopisy, objednatel 2 dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Objednatel 1

V Praze, dne 31-08-2015



Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyně hejtmana

pro oblast investic a veřejných zakázek



Objednatel 2

V Klíněci, dne 31-08-2015



Markéta Hanáková

starostka obce Klíneček



Zhotovitel

V Praze, dne 30. 7. 2015



Ing. Václav Hvízdal

jednatel společnosti

Pontex spol. s r. o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-

Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

Číslo: S-5497/DOP/2015

uzavřená ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX177, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen Kraj)

2. Obec Klíneč

se sídlem: Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

zastoupená: Markétou Hanákovou, starostkou obce Klíneč

IČ: 00640719; DIČ: CZ00640719

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 388079359/0800

(dále jen Obec)

I. Účel smlouvy

1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 písmeno c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na projekční a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě pro akci: „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“.
2. K dosažení účelu uvedeného v bodu 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II. Předmět smlouvy a specifikace veřejné zakázky

1. Předmětem této smlouvy podle čl. I. této smlouvy je závazek Obce se finančně spolupodílet na nákladech na přípravu a realizaci akce „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“ a to ve výši 6,6 % z celkových finančních nákladů akce, což v předpokládaných nákladech činí 2 585 029,- Kč vč. DPH (poměr byl stanoven podílem obou investorů na předpokládaných stavebních nákladech akce).
2. Předmětem této smlouvy podle čl. I. této smlouvy je závazek Kraje se finančně spolupodílet na nákladech na přípravu a realizaci akce „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“ a to ve výši 93,4 % z celkových finančních nákladů akce, což v předpokládaných nákladech činí 36 582 066,- Kč vč. DPH (poměr byl stanoven podílem obou investorů na předpokládaných stavebních nákladech akce).
3. Předmětem veřejné zakázky podle čl. I. této smlouvy je výběr nejvhodnějšího dodavatele na zhotovení projektové dokumentace a provedení stavebních prací pro akci „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“.
4. Realizace veřejné zakázky dle čl. I. bude v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

III. Zajištění akce

1. Středočeský kraj

- a) se zavazuje finančně se spolupodílet na zpracování projektové dokumentace podle čl. II, bod 2 ve výši 93,4 %.
- b) se zavazuje finančně se spolupodílet na inženýrsko-investorské činnosti ve fázi přípravy akce, podle čl. II, bod 2 ve výši 93,4 %.
- c) se zavazuje finančně se spolupodílet na realizaci stavební část akce „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“ podle čl. II, bod 2 ve výši 93,4 %.

2. Obec Klíneč

- a) se zavazuje finančně se spolupodílet na zpracování projektové dokumentace podle čl. II, bod 1 ve výši 6,6 %.
- b) se zavazuje finančně se spolupodílet na inženýrsko-investorské činnosti ve fázi přípravy akce, podle čl. II, bod 1 ve výši 6,6 %.
- c) se zavazuje finančně se spolupodílet na realizaci stavební část akce „III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice“ podle čl. II, bod 1 ve výši 6,6 %.

Na základě uzavřených smluv o dílo bude fakturace probíhat pro každého investora samostatně za jeho projekční a stavební část (odsouhlasené stavební objekty), platby budou realizovány na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem akce.

IV.

Jednání za sdružení zadavatelů

1. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky podle čl. II, bod 3., není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn na základě zmocnění účastníka sdružení:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095,

jehož jménem jedná: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
(dále jen „zástupce sdružení zadavatelů“)

2. Zástupce sdružení zadavatelů nese odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

V.

Povinnosti smluvních stran

1. Kraj jako zástupce sdružení zadavatelů je povinen:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení na projekční a stavební práce, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy,
- b) zahájit a vést zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách podle čl. II, odst. 3
- c) přijímat nabídky dodavatelů/uchazečů,
- d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
- e) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu se zhotovitelem na provedení projekčních stavebních prací,
- f) zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách,
- g) kdykoliv na požádání předložit druhé smluvní straně příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
- h) po zániku sdružení dle této smlouvy předat druhé smluvní straně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru nejvhodnějšího uchazeče.

2. Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu zadání veřejných zakázek,
 - b) po výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komisí, zástupci sdružení zadavatelů uzavřít smlouvu podle čl. VII. bod 2 této smlouvy.
3. Po předložení zpracované zadávací dokumentace zpracovatelem zástupce sdružení předá kopie této zadávací dokumentace druhé smluvní straně a současně ji informuje o termínu společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednání zadávací dokumentace smluvními stranami se uplatní postup podle čl. VIII. bodu 2. této smlouvy.
 4. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle bodu 3. tohoto článku, mohou smluvní strany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy (s uvedením, zda se jedná o připomínku zásadní, jinak za zásadní nebude považována), a to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do 5 dnů po projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
 5. Případné připomínky či návrhy smluvních stran k zadávací dokumentaci je zástupce sdružení ve spolupráci se zpracovatelem zadávací dokumentace povinen vypořádat nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle bodu 4. tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námítky druhou smluvní stranu informovat. Nebude-li smluvní strana se způsobem vypořádání své připomínky či námítky souhlasit a nedohodne-li se zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či námitku označí jako zásadní, je oprávněna ze sdružení zadavatelů vystoupit.
 6. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle bodu 5. tohoto článku předloží zástupce sdružení pro informaci druhé smluvní straně kopii konečné verze zadávací dokumentace.

VI.

Hodnocení nabídek

1. Za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení jmenují zástupci Středočeského kraje a obce Klíneč pětičlennou hodnotící komisí a náhradníky jejích členů. Smluvní strany jsou oprávněny delegovat dva své zástupce, kteří budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, jmenováni členy této hodnotící komise a dva jejich náhradníky. V případě veřejné zakázky podle článku II. bod 3 této smlouvy jmenuje Středočeský kraj pátého člena hodnotící komise a jeho náhradníka. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zajistí zástupce sdružení zadavatelů, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise budou mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky.
2. Pro postup a jednání hodnotící komise platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách v platném znění, dále platí hodnotící podmínky uvedené v zadávací dokumentaci

(viz § 44 odst.3 písm.f) zákona o veřejných zakázkách) a interní předpis Středočeského kraje Směrnice č. 103.

3. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení zadavatelů v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VII.

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupce sdružení zadavatelů rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, hodnotících podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci a interním předpisem Středočeského kraje Směrnice č. 103. Současně zástupce sdružení zadavatelů o výběru nejvhodnější nabídky informuje druhého účastníka sdružení, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po provedení výběru.
2. Po uplynutí lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle zákona o veřejných zakázkách jednotlivé smluvní strany s vybraným uchazečem uzavřou smlouvu na akci „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“, v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami. Formální postup uzavření smlouvy bude probíhat na základě výzvy zástupce sdružení v součinnosti obou smluvních stran.

VIII.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Při komunikaci mezi smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.
2. V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení zadavatelů, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

IX.

Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I. této smlouvy, tj. do uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací podle čl. VII. bod 2 této smlouvy všemi smluvními stranami. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.
2. Pokud nedojde k dohodě účastníků o rozdělení jednotlivých objektů k financování účastníků dle čl. III. písm. c) obou odstavců, tj. objekty nebudou specifikovány po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), specifikace jednotlivých objektů nebude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany ve lhůtě v tomto odstavci stanovené, tato smlouva zaniká.

Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, nemá vliv na případnou odpovědnost zástupců sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacích řízení podle čl. III. této smlouvy.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky. Ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech smluvních stran a předchozí schválení v příslušných orgánech Středočeského kraje a obce Klínek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Středočeský kraj obdrží 3 stejnopisy a obec Klínek 2 stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.
5. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu porozuměli a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 050-13/2015/RK ze dne 13.4.2015.

a

Zastupitelstva obce ze zasedání ZO usnesením č. 3/16/15 ze dne 19.5.2015.

Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne:

- 5 - 00 - 2015

Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

V Klínci dne: 20.5.2015

Markéta Hanáková


starostka obce Klínek

Technická specifikace

Název akce: III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice

Místo realizace akce:

- Silnice III/1025 v km 3,420 – 11,331 ve stávající šíři o délce 6,005 km, uzlové body 1243A125 1242A194 1242A197 a III/0042 ve stávající šíři v km od 0,000 – 1,050 o délce 1,050 km, uzlové body 1242A194 1241A033, o celkové délce 7,055 km, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav.

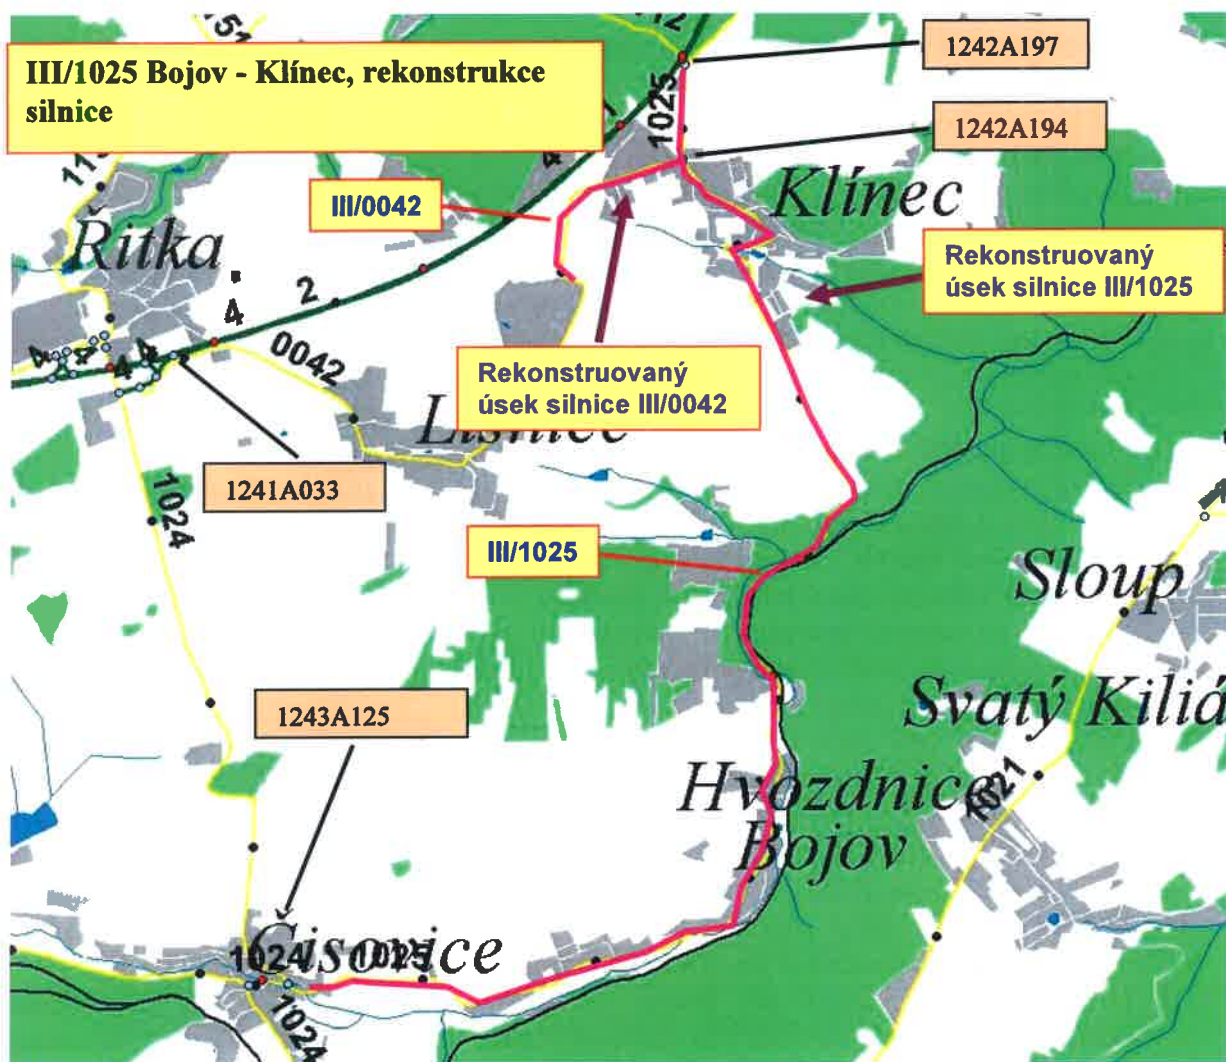

Základní popis akce:

- Zpracování PD ve stupni DUR, DSP, PDPS na rekonstrukci a odvodnění silnice, rekonstrukci propustků, opěrných zdí, seřezání krajnic a čištění příkopů strojně, bezpečnostní prvky na silnici, otočku autobusu, včetně dokumentace pro územní a stavební řízení, PDPS, jejího projednání a schválení a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.
- Při spolufinancování s obcí Klíneč vybudování chodníků na třech úsecích komunikace č.III/1025, veřejné osvětlení, dvě zastávky autobusů (s nástupními ostrůvky, přístřeškem, příslušenstvím a mobiliárem, bez zálivu).

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:

- a) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, soliterních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
- b) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zpracována tak, aby byl minimalizován zábor pozemků.
- c) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele
- d) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**zákon o VZ**“) a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o předmětu stavebních prací**“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy,

podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

e) Výkon IČ k ÚR

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

f) Výkon IČ k SP

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

g) Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).


Technický popis stávajících objektů:

- Silnice III/1025 a III/0042: rekonstrukce silnice III/1025 – od 3,420 – 11,331 o **délce 6,005 km (mimo úseky opravené po povodních 2013)** a III/0042 v km od 0,000 – 1,050 o **délce 1,050 km** řešení odvodnění silnic, rekonstrukce a čištění propustků, sanace opěrných zdí, seřezání krajnic, čištění příkopů strojně, v **celkové délce 7,055 km**, VDZ v celém úseku.
- Rekonstrukce silnice III/1025 začíná v obci Čísovice, v km 3,420 s napojením na již opravenou silnici, těleso komunikace vykazuje podélné a příčné trhliny, propadlé a vymleté krajnice a výtluhy, řešit odvodnění včetně opravy a čištění propustků v celé trase, seřezání krajnic, čištění příkopů strojně, průměrná šíře silnice cca 5,0 m.
- Ve směru staničení, kolem km cca 4,250 po levé straně vyspravit opěrnou zeď.
- V průtahu obcí Bojov rekonstrukce silnice a řešení odvodnění, vyčištění a rekonstrukce propustků, ve směru staničení v km cca 5,750 po pravé straně vyspravení opěrné zdi a zatrubnění výtoku propustku na soukromém pozemku až do vodoteče, průměrná šíře vozovky 5,2 m.
- Mezi obcí Bojov a Klíнец rekonstrukce silnice a řešení odvodnění, vyčištění a rekonstrukce propustků, (**mimo již rekonstruované úseky silnice: cca km 5,650-7,727 délce 0,0769 km, 6,760-6,847 v délce 0,087 km a 7,141-7,930 v délce 0,789**

km), v lesním úseku v km cca 8,100 – 8,400 řešit bezpečnostní prvky na silnici (např. svodidla), seřezání krajnic, čištění příkopů strojně, průměrná šíře silnice cca 4,5 až 5,0 m.


- V průtahu obcí Klíнец rekonstrukce silnice řešit bezpečnostní prvky na silnici, otočku autobusu, řešení odvodnění, vyčištění a rekonstrukce propustků, čištění příkopů strojně, v km staničení cca 10,300 je pramen v silnici, řešit její odvodnění, v km 10,842 bezpečnostní řešení křižovatky silnic III/0042 a III/1025 a místních komunikací, průměrná šíře silnice je 4,5 až 5,5 m.
- Obec Klíнец se bude finančně spolupodílet na projektové dokumentaci a na realizaci akce. V této souvislosti je nutné uzavřít smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů, mezi KÚSK a obcí Klíнец.
- V obci Klíнец vybudování chodníků na třech úsecích, veřejné osvětlení, dvě zastávky autobusů (s nástupními ostrůvky, přístřeškem, příslušenstvím a mobiliárem, bez zálivu).

Úsek č. 1

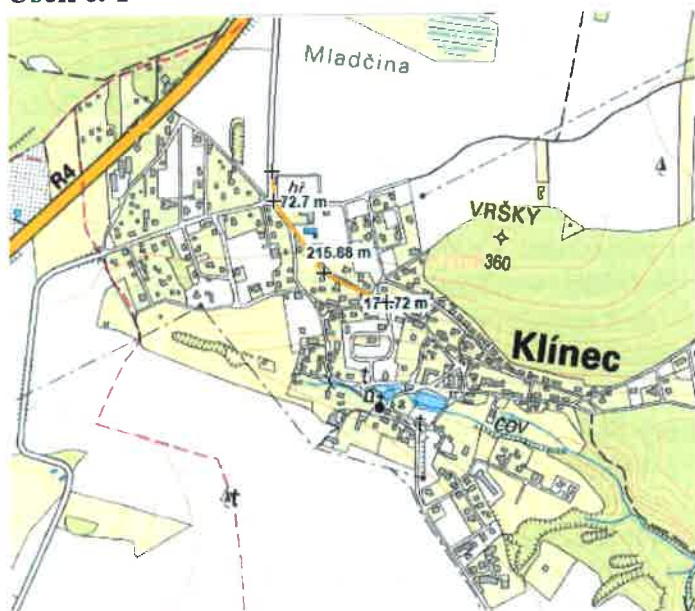


- délka 460 m, šířka 1,5 m, celkem 690 m², v úseku 2x přerušení v křížení s komunikací, 3x vjezd k RD,
- Provedení: zámková dlažba, obruba.

Úsek č. 2

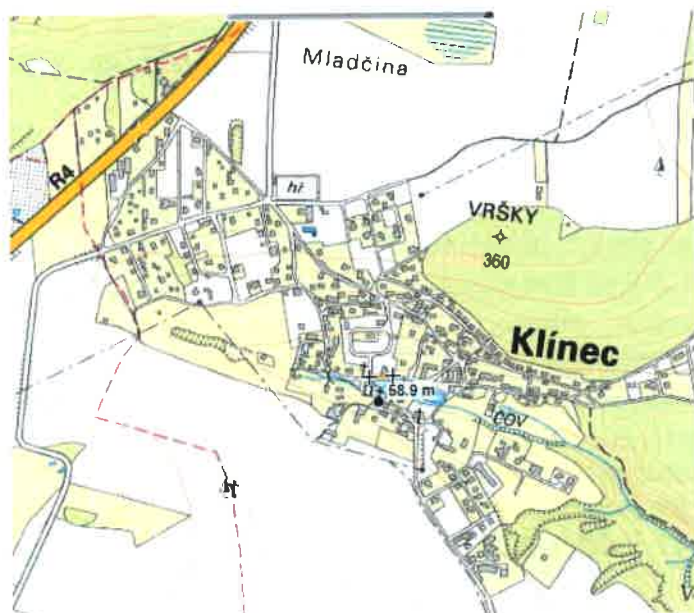

- délka 59m, šířka 1,5 m, celkem 88,5 m², v tom 2 autobusové zastávky – bez zálivu (2x nástupní ostrůvek, 1x přístřešek, 2x koš, 1x lavička)
- Provedení: zámková dlažba, obruba

Úsek č. 3

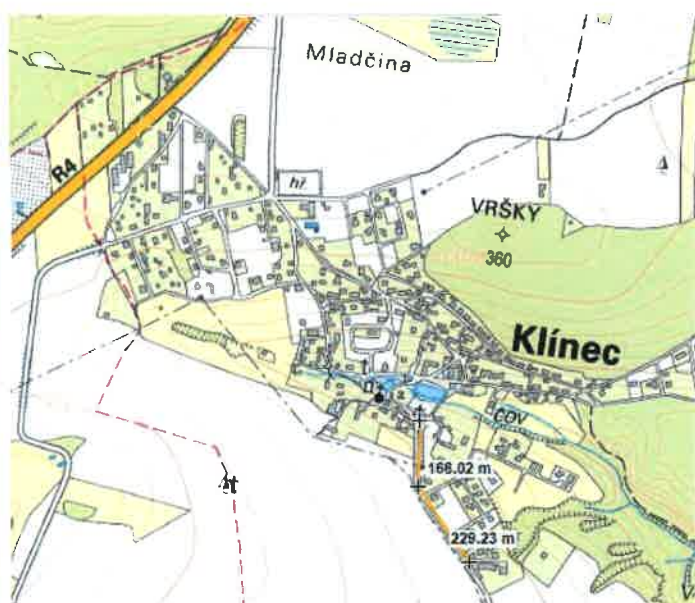

- délka 395 m, šířka 1,5 m, celkem 592,5 m², včetně veřejného osvětlení
- Provedení: zámková dlažba, obruba
- Rekonstrukce silnice a řešení odvodnění za obcí Klíneček, do km 11,331 do křižovatky s komunikací III/11512, včetně její úpravy, seřezání krajnic, čištění příkopů strojně, průměrná šíře silnice cca 6,5 m.

- Rekonstrukce silnice III/0042 od křižovatky s III/1025, v průtahu obcí šíře cca 6,0 – 6,7 m, za obcí cca 4,6 m, konec úseku v km 1,050 u golfového hřiště, řešení odvodnění, seřezání krajnic, čištění příkopů strojně.
- **V rámci projektové přípravy je nutné ve spolupráci s obcí Čísovice koordinovat pokládku kanalizace v průtahu obcí Bojov (v roce 2014 probíhá projektová příprava, následně bude probíhat vlastní stavba) a s obcí Klíneček výstavbu vodovodního přivaděče podél krajnice komunikace III/1025 - úsek od km 11,331 pod křižovatku s III/0042 (V roce 2014,2015 projektová příprava, následně realizace).**
- Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny přeložky inženýrských sítí, POV a DIO.
- Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
- Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:

- Na základě výsledků diagnostiky, provedení kompletní rekonstrukce stávající silnice
- Vyčištění a rekonstrukce propustků, řešení odvodnění silnice
- Řešení bezpečnostních prvků v intravilánu a v průtahu obcí, po dohodě s obcemi
- Výstavba chodníků, veřejného osvětlení, nástupních ostrůvků, autobusových zastávek s příslušenstvím a mobiliářem.

Silnice III/1025 před obcí Bojov



Opěrná zeď na začátku Bojova



Opěrná zeď na začátku Bojova



Propustek v průtahu obce Bojov



Opěrná zeď v obci Bojov





Silnice v obci Bojov



Propustek v lesním úseku za Bojovem



Silnice mezi obcí Bojov a Klíнец



Silnice v obci Klíнец



Pramen v silničním tělese III/1025 v obci Klíneč



Silnice III/0042 před obcí Klíneč



Silnice III/0042 před obcí Klínek

