

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021  
Číslo smlouvy objednatele: SMLD-0042/00066001/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23PH12002

Název související veřejné zakázky: **„Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM“**

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Sdružení Valbek – MOTT  
**vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.**  
sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec  
zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. C4487

a

**další společník Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o.**  
sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky:  
**„III/1166 Zdejcina - havárie zemního tělesa - PD“** dále jen „smlouva“.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) pro akci: „III/1166 Zdejcina - havárie zemního tělesa“.

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DUSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).

Předmětem je zpracování dokumentace na řešení nestabilního zemního tělesa silnice III/1166 u obce Zdejcina. Stabilita tělesa silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím (havarijním) technickém stavu a hrozí zborcení krajů vozovky, což může vést k uzavření silnice III/1166.2.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

|             |                |
|-------------|----------------|
| bez DPH:    | 3 000 000,- Kč |
| DPH:        | 630 000,- Kč   |
| včetně DPH: | 3 630 000,- Kč |

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Karel Motal  
email: \_\_\_\_\_  
tel:

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
**Předpokládaná lhůta plnění:**

**Dokumentace pro sloučené povolení - koncept**

- Nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy

#### **Dokumentace pro sloučené povolení - čistopis**

- Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro sloučené povolení od Objednatele

#### **Podání žádosti o vydání společného povolení**

- Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DÚSP

Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodloužení s plněním, jenž je sankciována.

#### **Projektová dokumentace pro provádění stavby**

- Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného sloučeného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

#### **Výkon autorského dozoru**

- Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby do kolaudace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na stavbě „III/1166 Zdejcina - havárie zemního tělesa“

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Technická specifikace
 Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
5. Oprávněnými osobami objednatel a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 

za objednatel Karel Motal

za zhotovitele Ing. Tomáš Trachta
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
 

**Výsledky poskytnutých služeb:**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Průzkumy a zaměření                                                                                                                                                       | 1x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku                                                                                            |
| • Dokumentace pro společné povolení (DUSP)                                                                                                                                  | 1x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku,                                                                                           |
| • Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)                                                                                                                                   | 4x v listinné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku,                                                                                           |
| • Dokladová část                                                                                                                                                            | 1x v tištěné podobě<br>a 1x digitálně na flash disku                                                                                             |
| • Originál pravomocného územního rozhodnutí (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) a stavebního povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. | včetně dokladové části a stavebního povolení<br>včetně dokladové části a ověřené projektové<br>1x v tištěné podobě<br>a 1x kopie na flash disku. |

- Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
- Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
  - Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - Podrobná specifikace ceny.
- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

**Sdružení Valbek – MOTT**  
zastoupené vedoucím společníkem  
Valbek, spol. s r.o.  
Ing. František Hanuš, na základě plné moci


# **Technická specifikace**

## **pro vypracování projektové dokumentace**

### **1. Identifikační údaje stavby:**

Název projektu (stavby):

**III/1166 Zdejčina - havárie zemního tělesa - PD**

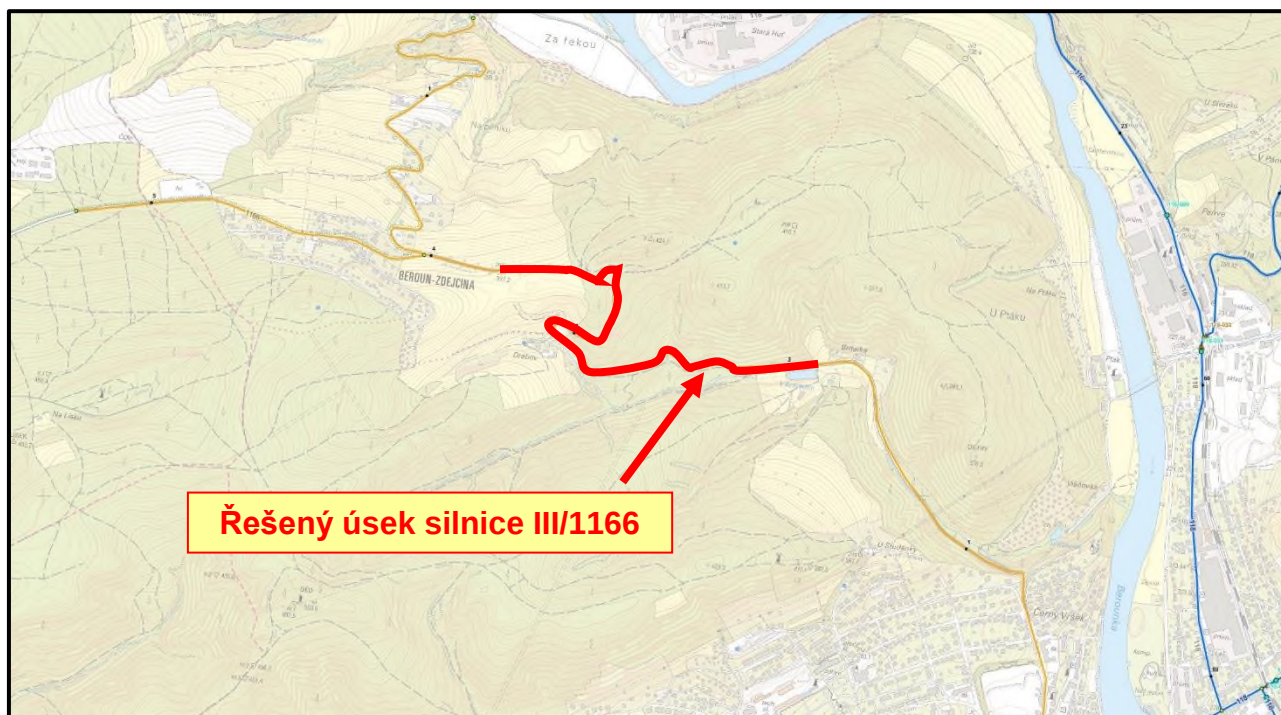

### **Místo realizace akce:**

Silnice III/1166, staničení km 1,8 až 3,5 v délce 1,700 km, úsek mezi uzlovými body 1241A023 – 1241A167, Středočeský kraj, okres Beroun, oblast Kladno, cestmistrovství Králův Dvůr

### **Základní popis akce:**

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DUSP) a zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ (oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006Sb., bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, jinak stavební řízení) při dodržení platných norem (např. 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).

Dokumentace bude spravována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

### **2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:**

Stabilita tělesa silnice ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím (havarijním) technickém stavu a hrozí zborcení krajů vozovky. Předmětem PD bude především řádné zajištění stability svahu, rozšíření tělesa komunikace (armované svahy, opěrné a zárubní zdi), vybudování záchytného systému a řešení likvidace dešťových vod z vozovky. V řešeném úseku bude opravena i vozovka komunikace.

Jedná se o řešení havarijního stavebního stavu zemního tělesa – neřešení tohoto stavebního stavu může vést až k uzavření silnice III/1166, která je jedinou přístupovou komunikací pro obec Zdejcina.

### **3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby:**

Jedná se o zpracování PD na opravu silnice zejména z hlediska stability silničního tělesa.

Provést IG průzkum, diagnostiku vozovky vč. PAU celého úseku silnice a na základě navrhnout potřebná stabilizační opatření.

Zajistit řádné odvodnění silnice.

V rámci PD bude doplněn záchytný systém.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh projekčního řešení:

- provést diagnostiku vozovky, inženýrskogeologický průzkum
- provést geodetické zaměření
- návrh stabilizačních opatření dle výsledků IG průzkumu
- oprava vozovky v dotčeném úseku dle diagnostického průzkumu vozovky
- doplnění svodidel a směrových sloupků
- obnova VDZ i SDZ
- zajištění řádného odvodnění silnice

### **4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- návrh stabilizačních opatření (armované svahy, opěrné zdi)
- oprava silnice
- doplnění záchytných systémů
- odvodnění
- oprava či doplnění propustků
- pročištění a doplnění příkopů
- návrh DIO

### **5. Územně – technické podmínky:**

Stavba se bude realizována na stávající silniční síti na území Středočeského kraje, okres Beroun, oblast Kladno, cestmistrovství Králův Dvůr

**Předpokládané stavební náklady rekonstrukce:**

40 mil Kč bez DPH

### **6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

Rekonstruovaná komunikace je ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje. Provedením rekonstrukce bude zajištěn odpovídající technický stav komunikace, přičemž realizací této akce se podstatně zlepší bezpečnost provozu a dojde i ke zlepšení výkonu letní a zimní údržby.

**Zakázka obsahuje:**

- Dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení povolení (DÚSP).
- Inženýrskou činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby.
- Zajištění vydání pravomocného povolení stavby (společného povolení)
- Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr
- Oceněný výkaz výměr (rozpočet)
- Výkon autorského dozoru
- Průzkumy a rozbory (IGP průzkum, zaměření, průběh inženýrských sítí, diagnostika apod.)

**Termíny realizace:**

Dokumentace PD pro společné povolení DUSP – koncept

- **Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace PD pro společné povolení – DUSP – čistopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele**

Prověření možnosti využití oznámení o provedení souvislé údržby, jinak podání žádosti o vydání společného povolení

- **Nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DUSP**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele.**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu příprava a realizace stavby**

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,  
150 21 Praha 5, IČ 00066001**

**Oblast Kladno**

*Karel Motal*, vedoucí oblast Kladno, tel \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_


*Bohumil Taraba*, zástupce vedoucího oblasti Kladno, tel \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

*Luboš Krejčí*, provozní cestmistr csm. Králův Dvůr, tel \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

*Lenka Balejová*, správní cestmistr csm. Králův Dvůr, tel \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

*Pavel Špaček*, projektový manažer staveb, tel \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**Fotodokumentace:**

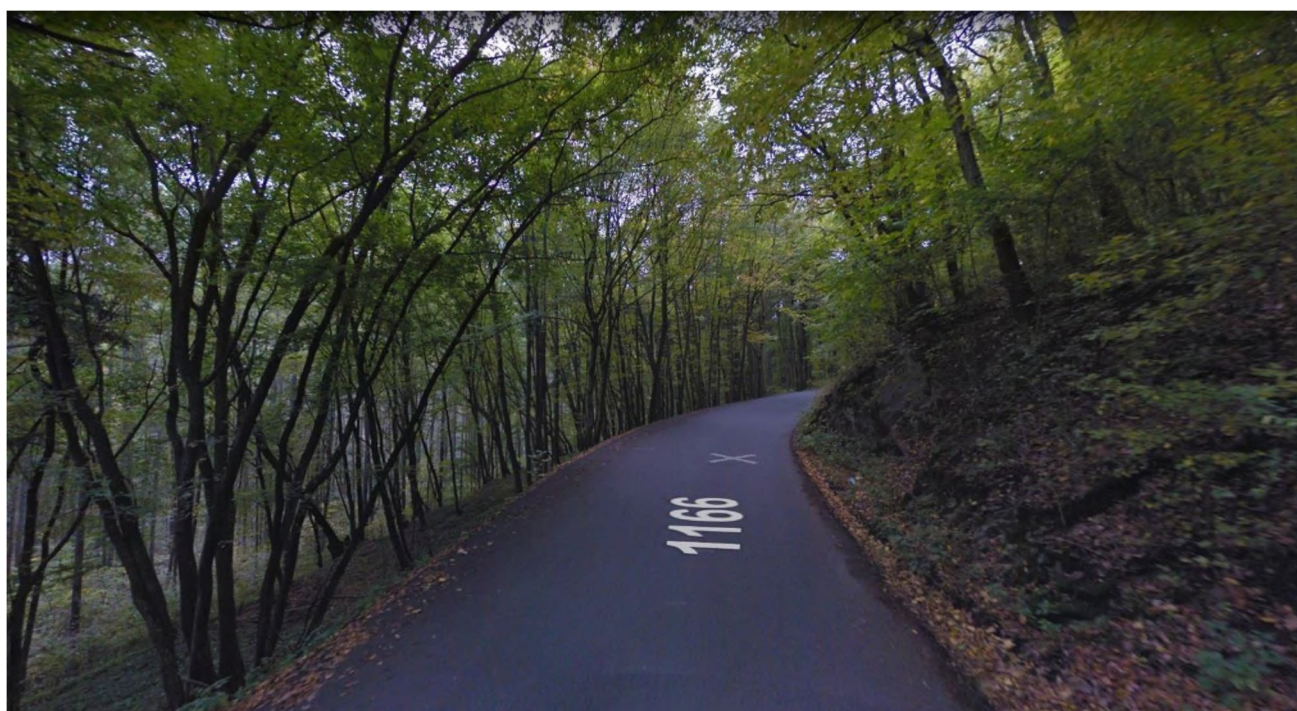



## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## III/1166 Zdejcina - havárie zemního tělesa

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH  | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému SP+UR vč. majetkopř. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH****) | Cena celkem v Kč s DPH |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 40 000 000                                             | 4,250%                                                                                    | 1,800%                                                                                                                                      | 1,000%                                                                                      | 900                                               |                               |                        |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci       | x                                                                                         | x                                                                                                                                           | x                                                                                           | 200                                               |                               |                        |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***) | 1 800 000                                                                                 | 1 080 000                                                                                                                                   | 440 000                                                                                     | 180 000                                           | 3 500 000                     | 4 235 000,00           |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH                           | 1 700 000                                                                                 | 720 000                                                                                                                                     | 400 000                                                                                     | 180 000                                           | 3 000 000                     |                        |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                        | 94,44%                                                                                    | 66,67%                                                                                                                                      | 90,91%                                                                                      | 100,00%                                           | 85,71%                        |                        |

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen  
v tabulce č. 2 - 6

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:                      | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ ke společnému UR a SP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:                   | Ok |

### III/1166 Zdejcina - havárie zemního tělesa

žlutě ocenění uchazeč

| popis položky                                                                                                                                       | Nabídková cena uchazeče v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>                                                                                                                   |                              |
| Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa                                                               | 40 000,00                    |
| Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod) a další doplňující průzkumy | 200 000,00                   |
| <b>Průzkumy DUSP celkem</b>                                                                                                                         | <b>240 000,00</b>            |
| <b>DUSP</b>                                                                                                                                         |                              |
| Průvodní zpráva                                                                                                                                     | 40 000,00                    |
| Dokladová část                                                                                                                                      | 40 000,00                    |
| Souhrnné technické řešení                                                                                                                           | 120 000,00                   |
| Výkresová část                                                                                                                                      | 440 000,00                   |
| Stavební část                                                                                                                                       | 700 000,00                   |
| DIO                                                                                                                                                 | 40 000,00                    |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady                                                                                                   | 30 000,00                    |
| BOZP                                                                                                                                                | 30 000,00                    |
| Reprografické práce                                                                                                                                 | 20 000,00                    |
| <b>DUSP celkem</b>                                                                                                                                  | <b>1 460 000,00</b>          |
| <b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>                                                                                                                  | <b>1 700 000,00</b>          |
|                                                                                                                                                     |                              |
| <b>IČ-zajištění vydání spolřčného povolení</b>                                                                                                      |                              |
| projednání dokumentace                                                                                                                              | 290 000,00                   |
| majetkoprávní podklady a uzavření smluv                                                                                                             | 290 000,00                   |
| podání žádosti bez poplatků                                                                                                                         | 140 000,00                   |
| <b>IČ celkem</b>                                                                                                                                    | <b>720 000,00</b>            |
|                                                                                                                                                     |                              |
| <b>PDPS</b>                                                                                                                                         |                              |
| Technická zpráva                                                                                                                                    | 40 000,00                    |
| Výkresová část                                                                                                                                      | 290 000,00                   |
| ZTKP                                                                                                                                                | 30 000,00                    |
| Soupis prací a rozpočet                                                                                                                             | 30 000,00                    |
| Reprografické práce                                                                                                                                 | 10 000,00                    |
| <b>PDPS celkem</b>                                                                                                                                  | <b>400 000,00</b>            |
|                                                                                                                                                     |                              |
| <b>celkem bez DPH</b>                                                                                                                               | <b>2 820 000,00</b>          |

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## III/1166 Zdejcina - havárie zemního tělesa

|                                                                      | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby | 20         | 900       | 18 000         |
| Cena AD celkem bez DPH                                               | 180        |           | 162 000        |
| <b>Celkem</b>                                                        | <b>200</b> |           | <b>180 000</b> |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při výkonu AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AD      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hodin   |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25      |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25      |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25      |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25      |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul> | 50      |
| celkem hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180     |
| Kč/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900     |
| Celkem Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162 000 |

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
