



SMLOUVA O DÍLO

Číslo Objednatele (Ginis): S-6311/OVM/2024

Číslo Zhotovitele:

Tato **SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

mezi:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 4440000221/6000

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Maturou, vedoucím Odboru veřejné mobility

zastoupený ve věcech technických:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČ: 00066001

zastoupený: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Jan Zákostelský, DiS., Vedoucí oddělení cyklostezky a P+R, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101306841/2010

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“)



1 ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu za účelem ověření možnosti umístění a realizace bezpečné komunikace pro cyklisty s asfaltovým povrchem v úseku Poříčí nad Sázavou - Nespeky v koridoru národní páteřní cyklotrasy NA 07, v současnosti č. 19 – Posázavská na území obcí Poříčí nad Sázavou, Nespeky a Řehenice s názvem „**Posázavská cyklotrasa, úsek Poříčí nad Sázavou – Nespeky studie proveditelnosti**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. vyhotovení technické studie proveditelnosti Posázavská cyklotrasa, úsek Poříčí nad Sázavou - Nespeky – studie proveditelnosti. Cílem této Smlouvy je tedy úprava právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem smlouvy je vyhotovení technické studie proveditelnosti na výstavbu cyklistické infrastruktury za účelem bezpečného a komfortního provozu cyklistů v koridoru národní páteřní cyklotrasy NA 07, v současnosti č. 19 – Posázavská na pravém břehu Sázavy v úseku od silničního mostu přes Sázavu č. 109-001 ke stávající asfaltové komunikaci na správním území města Týnec nad Sázavou na pozemku p.č. 4355 v k.ú. Týnec nad Sázavou (dále jen „**Dílo**“). Celková délka řešeného úseku je 7,6 km. Příslušný projektový záměr byl schválen Radou Středočeského kraje a je součástí v zásobníku akcí 2021+ spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů. Dílo bude dále sloužit jako odborný podklad pro rozhodování v území a jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace obcí. Dílo bude dále obsahovat popis a vyhodnocení jednotlivých variant vedení trasy uvedených v Technické specifikaci v příloze 1) této smlouvy jako řešený úsek a bude mít následující obsah:
- 2.1.1 Úvod - bude obsahovat popis cílů, způsobu zpracování a obsahu studie.
- 2.1.2 Celková zpráva studie proveditelnosti - bude rozčleněna na jednotlivé funkční úseky cyklotrasy – etapy – podle časové náročnosti dalších stupňů přípravy navrhované stavby, popis současného stavu z hlediska provozu cyklistů a chodců, územních limitů a dalších faktorů s vlivem na proveditelnost navrhovaných opatření, popis v minulosti realizovaných aktivit za účelem rozvoje bezmotorové dopravy, popis navrhovaných a proveditelných opatření a aktivit k jejich realizaci, odhad ploch záborů pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa v důsledku realizace navrhovaných staveb a počet a specifikaci dřevin kácených v důsledku realizace navrhovaných a proveditelných opatření.
- 2.1.3 Přehled strategických stavebních objektů - bude obsahovat názvy jednotlivých navrhovaných a proveditelných stavebních objektů, jejich popis, účel a aktivity k jejich realizaci.
- 2.1.4 Odhad stavebních nákladů dle metodiky SFDI a nákladů na další stupně projektové dokumentace se zohledněním stavu na trhu v oblasti stavebnictví a celkové délky navrhovaných a proveditelných novostaveb nebo rekonstrukcí. Odhad nákladů bude obsahovat strukturu nákladů na jednotlivé etapy realizace stavby a jejich ceny v Kč bez DPH



- 2.1.5 Doporučující stanovisko zpracovatele studie - bude obsahovat doporučení a další informace pro Objednatele.
 - 2.1.6 Situace trasování v měřítku minimálně 1:40 000 - fyzická mapa s širšími vztahy a návaznostmi řešené trasy, s hranicemi obcí, obcí s rozšířenou působností zákresem jednotlivých variant a etap.
 - 2.1.7 Situace v měřítku minimálně 1:10 000 - fyzická mapa s podrobným zákresem jednotlivých etap s prvky ochrany přírody a dalšími limity.
 - 2.1.8 Celková přehledná tabulka trasování rozčleněná na etapy s přehledem současného stavu z hlediska provozu cyklistů, proveditelných a navrhovaných opatření, kilometrů, odhadovanými investičními náklady, vlastnickými vztahy k pozemkům v jednotlivých etapách.
 - 2.1.9 Situace v měřítku minimálně 1: 2000 - ortofoto mapa s hranicemi a parcelními čísly pozemků, jednotlivými etapami navrhované stavby, prvky ochrany přírody, inženýrskými sítěmi, dotčenými dřevinami, limity v území a všemi dalšími limity pro realizaci opatření. Podélné profily a příčné řezy v měřítku minimálně 1:100.
 - 2.1.10 Přílohy zprávy Studie proveditelnosti - fotodokumentace, stanoviska, souhlasy, vyjádření, geometrické plány, geodetické zaměření.
- 2.2 Dílo bude Objednateli předáno následovně:
- 2.2.1 3 ks vyhotovení studie podle čl. 2 odst. 2.1. body 2.1.1 až 2.1.9 v listinné podobě podepsané a autorizované Zhotovitelem.
 - 2.2.2 Přílohy zprávy studie proveditelnosti – fotodokumentace 3 ks v listinné podobě, originály podepsaných souhlasů vlastníků dotčených pozemků podle čl. 2 odst. 2.3 bod 2.3.13 a originály stanovisek podle čl. 2 odst. 2.3. bod 2.3.12 v listinné podobě, 1 ks technické zprávy geodetické zaměření v listinné podobě, 1ks záborového elaborátu v elektronické podobě, výkresy a seznam bodů v elektronické podobě ve formátech podle čl. 7 odst. 7.15
 - 2.2.3 Situace trasování v měřítku minimálně 1:2000 podle čl. 2 odst. 2.1. bod 2.1.9 v elektronické podobě ve formátu .pdf v rozlišení pro tisk na papír o velikosti 85 cm x 30 cm.
 - 2.2.4 Celé Dílo v elektronické podobě ve formátech podle čl. 7 odst. 7.15.
- 2.3 Předmětem Díla jsou dále činnosti:
- 2.3.1 Navržení stavebně technického řešení tělesa, technických objektů a doprovodné infrastruktury bezbariérové komunikace pro pěší a cyklisty v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty s vyloučením, nebo omezeným přístupem motorové dopravy za účelem bezpečné bezmotorové dopravy a rekreace na území obcí Poříčí nad Sázavou, Nespeky a Řehenice v úseku vymezeném v příloze č. 1.
 - 2.3.2 Definice prostorového uspořádání a technických možností usazení tělesa komunikace, technických objektů a doprovodné infrastruktury do pozemků s ohledem na inženýrské sítě, prvky ochrany přírody a podélné linie stromů.
 - 2.3.3 Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu za účelem přesného určení hranic pozemků a jejich vlastníků a dalších prvků v území.
 - 2.3.4 Zjištění existence inženýrských sítí v prostoru navrhovaných opatření.



- 2.3.5 Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí k existenci inženýrských sítí v prostoru navrhovaných opatření.
 - 2.3.6 Provádění terénních průzkumů a fotodokumentace po celou dobu zhotovování Studie.
 - 2.3.7 Projednání navrhovaných řešení s orgány ochrany přírody na úrovni kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí a zohlednění jejich stanovisek při formulaci navrhovaných a proveditelných řešení.
 - 2.3.8 Popis požadavků na údržbu navržené komunikace, technických objektů a doprovodné infrastruktury.
 - 2.3.9 Identifikace parcelních čísel, vlastníků a druhů pozemků pro tělesa komunikace, technické objekty a doprovodnou infrastrukturu a ploch předpokládaných záborů pro jejich usazení.
 - 2.3.10 Stanovení odhadu ploch záborů pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa v důsledku realizace navrhovaných staveb.
 - 2.3.11 Projednání navrhovaných řešení s dotčenými orgány státní správy, městy, obcemi, organizacemi a vlastníky nebo správci dotčených pozemků.
 - 2.3.12 Získání stanovisek dotčených orgánů státní správy, měst, obcí, organizací a správců dotčených pozemků.
 - 2.3.13 Zajištění stanovisek vlastníků pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob dotčených ve studii navrhovanými opatřeními.
 - 2.3.14 Vyhotovení záborového elaborátu včetně katastrálních situací s uvedením vlastníků pozemků a orientačního budoucího záboru navrhované stavby.
 - 2.3.15 Organizace jednání za účelem plnění předmětu Díla, cestování na tato jednání, účast na těchto jednáních, vyhotovování prezentací a zápisů z jednání.
 - 2.3.16 Vyhodnocení navrhovaných etap stavby z hlediska hospodárnosti, reálnosti a jejich stavebně technického řešení, dopadu do územně plánovacích podkladů, dopadu do ÚSES a prvků ochrany přírody, umístění do zájmového území, realizovatelnosti s přijatelnými technickými parametry a schopnostmi splnit účel dle bodu 1.1.
 - 2.3.17 Účast na jednáních a provádění veškerých činností ke koordinaci návrhu cyklostezek s dalšími připravovanými stavbami, které mohou realizaci cyklistické infrastruktury řešené ve studii ovlivnit.
- 2.4 Práce nespecifikované v zadání podle bodů 2.1, 2.2 a 2.3, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět, jsou součástí Díla. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje ke všem postupům, činnostem, pracím a výkonům, které je zapotřebí pro provedení Díla v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR. Zhotovitel si je vědom použití veřejných prostředků, a s tím spojených povinností a odpovědností vůči Díla Objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků, a může tím způsobit Objednateli škodu. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny postupy, činnosti, práce a výkony, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit smlouvu o Dílo o další



postupy, činnosti, práce a výkony, nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné postupy, činnosti, práce a výkony jsou nezbytné pro provedení Díla, může Objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „**zákon**“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci objektivních okolností prokazuje Zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci Díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech obcí dotčených prováděním Díla.

2.7 Objednatel se zavazuje za provedení Díla bodů 2.1, 2.2 a 2.3 této smlouvy zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo uvedenou v článku 4. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Díla využívat součinnost obcí Poříčí nad Sázavou, Nespeky a Řehenice. Finální podoba trasy bude stanovena až na základě projednání s dotčenými obcemi a bude sloužit jako podklad pro navazující projektové práce a případnou úpravu územních plánů.

3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo podle čl. 2 v termínech uvedených v příloze 1). Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.2 Zhotovitel může provést Dílo před sjednanou dobou. Termíny uvedené v příloze 1) nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud Dílo nebude ukončeno v těchto termínech a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na Díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny Díla v případě změny právních předpisů Zhotovitel.

3.3 Objednatel připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během plnění Díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele.

3.4 Místem plnění Díla jsou správní území obcí Poříčí nad Sázavou, Nespeky a Řehenice, sídlo Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., oblastní pracoviště Klejnarská 894, Kolín a Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, Odbor veřejné mobility.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 313.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 65.730,- Kč. Celková cena tedy činí 378.730,- Kč (dále jen „**Cena**“)

4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré



práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

- 4.3 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury po řádném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem v souladu s čl. 4.7 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 4.7 této Smlouvy.
- 4.4 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
- 4.6 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
- 4.7 Práce požadované Objednatelem nad ujednaný nebo projektem stanovený rozsah prací, které přesáhnou Cenu, budou řešeny jako vícepráce v souladu s příslušnými právními předpisy a jako vícepráce budou Objednatelem uhrazeny.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli v jeho sídle předávacím protokolem.
- 5.2 O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci přejímacího řízení bude sepsán zápis a Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu přejímacího řízení.
- 5.3 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí do předávacího protokolu.

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje:

- dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zhotovování Díla,
- zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti při zhotovování Díla ve smyslu příslušných právních předpisů,
- vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik při zhotovování Díla.



- 6.2 Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky při zhotovování Díla, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 6.3 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcí, jichž bylo při plnění povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.
- 6.4 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

7 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
- 7.2 Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu prováděných prací.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.
- 7.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
- 7.6 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.



- 7.10 Objednatel se stává vlastníkem Díla okamžikem převzetí Díla dle čl. 5 této Smlouvy.
- 7.11 Zhotovitel poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití Díla a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace Díla, užívat Dílo neomezeně, a k pořizování kopií a rozmnoženin Díla.
- 7.12 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a Dílo provádí v souladu s článkem 2. této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami, Technickými podmínkami TP 179 - navrhování komunikací pro cyklisty, současnými poznatky v oblasti rozvoje bezmotorové dopravy a rekreačních aktivit nehendikepovaných a hendikepovaných uživatelů cyklistických komunikací.
- 7.13 Zhotovitel je povinen na požádání oprávněného zástupce Objednatele neprodleně předložit Objednateli veškeré písemné doklady o provádění Díla a poskytnout veškerá digitální data, která v průběhu plnění Díla zhotovuje.
- 7.14 Pro zpracování Díla může Zhotovitel využít referenční mapové podklady z datového skladu GIS Středočeského kraje, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě se zadavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS, WFS) s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů topografických a tematických map.
- 7.15 Pro zpracování elektronické podoby Díla jsou stanoveny následující podmínky:
- texty studie ve formátu *.doc, docx
 - přílohy zprávy studie proveditelnosti ve formátu *.pdf
 - fotodokumentace ve formátu *.jpeg v originálním rozlišení fotoaparátu, minimálně však o rozměrech 1920x1080 pix, metadata v exifů každé fotografie musí obsahovat skutečné datum a místo pořízení snímku;
 - tabulky *.xlsx budou dodány v MS Excel 2013 a vyšší;
 - výkresová dokumentace v odemčeném formátu, ve kterém je vyhotovena Zhotovitelem (např. CAD výkresy *.dgn, *.dwg, *.dwf apod., GIS vektorová data ve formátu ESRI shapefile nebo souborová geodatabáze) a jejich kopie (export) ve formátu PDF nebo georeferencovaný PNG, rozlišení minimálně 300 dpi.

Data budou předána na USB flash disku. O předání a převzetí takových dat bude sepsán předávací protokol.

8 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími



- přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
- 8.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 8.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
- 8.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

9 PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
- 9.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 9.3 Případná reklamáce musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamáce Objednatele. K podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamáce. V případě oprávněné reklamáce je povinen v téže době po doručení reklamáce zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se Zhotovitel zavazuje odstranit do 30 kalendářních dnů od dne, kdy je sám zjistil, nebo ode dne kdy mu vady Díla písemně oznámil Objednatel.
- 9.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem stvrzeného předávacím protokolem.
- 9.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
- a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní;
 - b) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 9.6 Smlouvy;



- c) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - d) nekvalitní provedení Díla;
 - f) ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na stávajících komunikacích při provádění Díla.
- 9.6 Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
- 9.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 9.8 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.9 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 9.10 V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6. odst. 6.1, 6.2 nebo 6.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.11 V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 7. odst. 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
- 9.13 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
- 9.14 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením některé ze Smluvních stran.



10 OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Oprávněný zástupce Objednatele při provádění a převzetí Díla a ve věcech technických (dále jen „**oprávněný zástupce Objednatele**“) je: Jan Zákostelský, DiS, vedoucí oddělení cyklostezek a P+R, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
- 10.2 Oprávněný zástupce Objednatele je oprávněn jednat za Objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce Objednatele oprávněn činit jménem Objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce Objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků k této smlouvě o Dílo.
- 10.3 Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele: Mgr. Petr Matura, vedoucí Odboru veřejné mobility.
- 10.4 Oprávněný zástupce Zhotovitele při provádění a převzetí Díla a ve věcech technických (dále jen „**oprávněný zástupce Zhotovitele**“) je: Ing. Pavel Ibl
- 10.5 Ve věcech smluvních zastupuje Zhotovitele: Mgr. Petr Pšenička

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. 1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
11. 2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
11. 3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
11. 4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
11. 5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
11. 6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 věta první Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.



11. 7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jejím podpisu druhou ze Smluvních stran.
11. 8 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. 9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
11. 10 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
11. 11 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
11. 12 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
11. 13 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
11. 14 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 věta první Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
11. 15 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jejím podpisu druhou ze Smluvních stran.
11. 16 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. 17 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.



V Praze

V Praze

ZA ZHOTOVITELE

ZA OBJEDNATELE

Mgr. Petr Pšenička
jednatel společnosti

Mgr. Petr Matura
vedoucí Odboru veřejné mobility

Přílohy:

- 1) Technická specifikace



Příloha č. 1 SoD

Technická specifikace

Identifikační údaje


Název stavby:	„Posázavská cyklotrasa, úsek Poříčí nad Sázavou - Nespeky“
Stupeň dokumentace:	Studie proveditelnosti
Zpracováno:	08/2024
Zpracovatel:	Pavel Klimeš

Současný stav

V současnosti vede cyklotrasa č.19 Posázavská v úseku Poříčí nad Sázavou - Nespeky po silnicích II/109 a II/603 s průměrnou intenzitou dopravy 2736 - 3754 aut za den a místních a účelových komunikacích s nepevným povrchem. Využívání takové trasy cyklisty je neatraktivní a nebezpečné. Cílem je vybudování nové cyklistické infrastruktury v celém řešeném úseku viz zápisy dále.

Návrh řešení

Řešení spočívá ve výstavbě nové cyklistické infrastruktury (dále jen **CI**), která naváže na stávající místní komunikace s nízkou intenzitou automobilového provozu a vytvoří bezpečný koridor pro cyklodopravu v celém řešeném úseku. Celý řešený úsek je dlouhý 7,6 km a je vyznačen na obrázku:

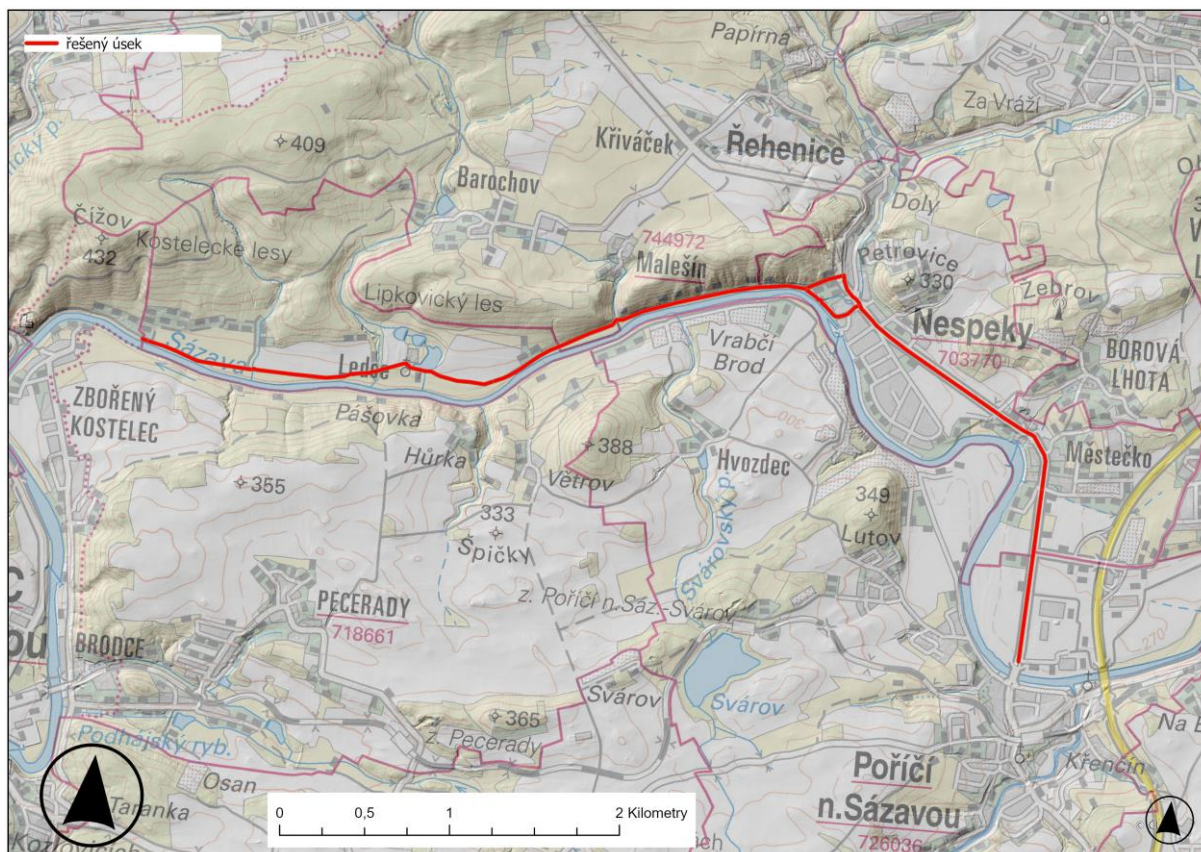



Ve studii bude navrženo, projednáno, posouzeno a vyhodnoceno řešení nové CI v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty ve správních územních jednotkách samosprávných subjektů – Poříčí nad Sázavou, Řehenice a Nespeky. V úseku od křižovatky II/603 X MK Pod Jezem – vyústění pěšiny podél Sázavy do ulice Ledecká bude nová CI navržena, projednána a vyhodnocena ve dvou variantách: 1. varianta pro vedení cyklotrasy ulicí Pod Jezem a dále po břehu Sázavy na pozemcích p. č. 3167 a 3163 včetně přemostění Mokřanského potoka, 2. varianta pro vedení cyklotrasy po nové cyklostezce podél II/603 a dále v ulici Ledecká.

Geodetické zaměření

Součástí studie bude také zhotovení polohopisného a výškopisného zaměření stávajícího stavu za účelem přesného určení hranic pozemků a jejich vlastníků a dalších prvků v území. Předpokládáme rozsah zaměření v celkové délce cca 3,5 km. Přesné zadání úseků pro zaměření bude dohodnuto po podpisu smlouvy dle aktuální potřeby.

Koordinace

Zhotovitel zajistí koordinaci s těmito organizacemi a jimi připravovanými akcemi v předmětné lokalitě:

- Správa železnic, s. o.
- Ředitelství silnic a dálnic
- Povodí Vltavy
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Předpokládaná lhůta plnění:

1. Studie proveditelnosti – 1. koncept k odsouhlasení zadavateli před projednáním s dotčenými subjekty
 - **Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy. Zaměření bude vyhotoveno nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy.**
2. Studie proveditelnosti – 2. koncept projednaný s dotčenými subjekty státní i soukromé sféry a vlastníky pozemků.
 - **Nejpozději do 3 měsíců od schválení 1. konceptu zadavatelem. 2. koncept bude objednateli předložen až po vypořádání připomínek dotčených subjektů.**
3. Studie proveditelnosti - čístopis
 - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke 2. konceptu studie od Objednatele.**

Finální projednání dokumentace u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury a odeslání žádosti na místně příslušný OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na ŽP.

- **Nejpozději do 1 měsíce od schválení čístopisu studie.**



Zápis jednání:

Středočeský kraj

Zápis z jednání

Posázavská cyklotrasa Poříčí nad Sázavou – Nespeky

16.2. 2024, OÚ Nespeky

Přítomni: Dle přiložené prezenční listiny

Jednání bylo svoláno za účelem konzultace zadání projektové dokumentace na stavbu Posázavská cyklotrasa Poříčí nad Sázavou – Nespeky. Podkladem pro jednání byl územní plán obce Nespeky ve fázi přípravy, GIS obce Nespeky a projektový záměr Posázavská cyklotrasa, úsek Poříčí nad Sázavou-Nespeky schválený v Radě Středočeského kraje.

Pavel Klimeš – záměrem Středočeského kraje je příprava a výstavba bezpečné komunikace pro cyklisty s asfaltovým povrchem přes celé správní území obce Nespeky a dále až k mostu přes Sázavu na území obce Poříčí nad Sázavou. Ve směru proti proudu řeky Sázavy bude cyklostezka připravována od hranice správních území města Týnec nad Sázavou a obce Nespeky a dále po stávajících místních komunikacích až do zastavěné části obce, dále by měla cyklostezka pokračovat podél silnice II/603 přes místní část Městečko až ke křižovatce s II/103 a dále územím Poříčí nad Sázavou podél silnice až k silničnímu mostu přes Sázavu.

Mgr. Michal Tyrner – na začátku řešeného úseku je problematický pozemek 3602/2 jehož majitelka odmítá jednat o majetkoprávním vypořádání s obcí, ani o opravě tamější komunikace v nevyhovujícím technickém stavu. Další pokračování cyklostezky v ose stávající místní komunikace chatovou osadou je nevhodné, protože zde jsou složité majetkové poměry a odpor obyvatelů chat k cyklistům, kteří tudy v současné době projíždějí.

Řešením je vedení nové cyklostezky podél Sázavy po pozemku se způsobem využití ostatní komunikace, kde je podle územního plánu vyznačená plocha pro dopravní infrastrukturu. Vlastník pozemku pan Vaništa není příliš ochoten pozemek odprodat, ale je ochoten k jednání, nejde mu o peníze, ale o zachování hospodářství a prostoru pro jeho zemědělskou činnost. Usedlost Ledce v řešeném úseku je také v jeho vlastnictví a tvoří základnu pro jeho činnost, kterou provozuje na mnoha pozemcích v okolí. Výjimkou je zdejší kostel, který je kulturní památkou ve vlastnictví římskokatolické církve. Pan Vaništa má od kostela klíče, udržuje ho, stará se o něj a na hřbitově kolem kostela jsou pohřbeni jeho předkové z několika generací. Dále je místní komunikace se zpevněným povrchem vedena střídavě po pozemcích obce Nespeky a po pozemcích pana Vaništy. Obec Nespeky spolupracuje s panem Vaništou na uvedení stávajícího stavu v terénu do souladu s katastrem a za tím účelem již probíhá geodetické zaměření a tvorba geodetických plánů na jejím základě provede obec s panem Vaništou směnu tak, aby komunikace byla na pozemcích v jejím vlastnictví a sousední zemědělské pozemky ve vlastnictví pana Vaništy. Část této komunikace je na území obce Řehenice jejím vlastnictví, ale zde není potřeba v rámci projektu řešit žádné stavební akce, protože je zde asfaltový povrch v dobrém technickém stavu. Část této komunikace od pozemku pana Vaništy až k osadě Ledce je vedena v pasportu místních komunikací jako účelová komunikace a od osady Ledce dále až k silnici II/603 jako komunikace místní komunikace.

Další pokračování cyklostezky v zastavěném území obce je variantní buď podél silnice II/603 kde jsou výškové rozdíly mezi povrchem silnice a sousedními pozemky, most přes Mokřanský potok a větší množství sjezdů do sousedních nemovitostí. 2. variantou je vedení cyklostezky obcí, která by zahrnovala stavbu nové komunikace na pozemku nad řekou ve vlastnictví povodí Vltavy, stavbu nové lávky přes Mokřanský potok a vyústila by přes pozemek p.č. 3117 na silnici II/603 v prostoru náměstí v Nespekách.

Další pokračování si cyklostezky navrhuje podél severní strany silnice II/603, kde je v současnosti dokončovaná stavba vodovodu. Na jižní straně silnice je stavba cyklostezky nevhodná z důvodů mnoha vjezdů do nemovitostí a plánované výstavby kanalizace. Výstavba vodovodu bude dokončena během léta 2024. Jednotlivé etapy stavby vodovodu zhotovitel zaměřuje bezprostředně po dokončení, takže zaměření vedení vodovodu bude k dispozici současně s jeho dokončením. Těleso silnice II/603 je ve správě a vlastnictví Krajské správy a údržby silnic, ale leží na pozemcích



ve vlastnictví obce Nespeky. Silnice patří do cestmistrovství Benešov, cestmistr pan Sochůrek. Přesné umístění cyklostezky u silnice a její průchod zastavěnými částmi obce Nespeky a Městečko je v současné době nejasný, takže pro její navržení musí být studie.

Nový územní plán obce je v procesu přípravy ve fázi vypořádání připomínek. Obec preferuje jednoznačně vznik nového bezpečného bezmotorového spojení pro chodce a cyklisty mezi Poříčím nad Sázavou, Městečkem a Nespekami. V Poříčí nad Sázavou je spádová 9 letá základní škola, v Nespekách škola není. Obec souhlasí s asfaltovým povrchem celé navrhované stavby.

Zapsal: Pavel Klimeš

Přílohy:

- 1) Prezenční listina

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail klimes@kr-s.cz

Tento zápis je rozeslán pouze elektronickou formou.
