



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele⁵⁸...../2013/NPZ
číslo zhotovitele SE/SC/2013/298

„III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce “

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Obec Šestajovice

se sídlem Husova 60, Šestajovice, 250 92

zastoupené: Romanem Hrdlicem, starostou obce

bankovní spojení KB Praha - východ

číslo účtu: 3423-201/0100

IČ: 00240851 DIČ: CZ00240851

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556
jednatel Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

IČ: 261 77 005 DIČ: CZ 261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, číslo účtu 7408-201/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu se
Smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů č. 2863/DOP/2011 ze dne 15.11.2011

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **“III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce “** podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracovaná firmou TOMIPRO, Ctěnická 692, 190 00 Praha 9 pod pracovním názvem „Šestajovice, okružní křižovatka Revoluční – Komenského a firmou Geodézie a projekce, Mírová 474/E Milovice n. L. pod pracovním názvem „Rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 ulice Revoluční a Komenského“, jež bude realizována na základě stavebního povolení, které vydal dne 18.2.2011 Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy pod č. j. 150/7288/2011 a souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného dne 18.2.2011 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy pod č.j. 150/7288/2011, to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **III/31110 a III/00116** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení
- zabezpečení povolení kácení zeleně
- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zajištění (zhotovení) a předání realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění průkazních a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a likvidace odpadu vzniklého na staveništi a úhrada poplatku za uložení takového odpadu, včetně stavební suti a nevyužitelných či kontaminovaných zemín;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 6 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 31.8.2015 doplní zadavatel s ohledem na podmínky poskytované dotace.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, uplynutím této doby se tato smlouva ruší. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11 361 814,80 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 385 981,11 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 13 747 795,91 Kč.

- 3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

- a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 30 000,-Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**

DPH 6 300,- Kč



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

cena včetně DPH 36 300,-Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 11 131 814,80 Kč

DPH 2 337 681,11 Kč

cena včetně DPH 13 469 495,91 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH 50 000,- Kč

DPH 10 500,- Kč

cena včetně DPH 60 500,-Kč

d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH 150 000,- Kč

DPH 31 500,- Kč

cena včetně DPH 181 500,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	11 361 814,80 Kč
	DPH celkem	2 385 981,11 Kč
	Celková cena včetně DPH	13 747 795,91 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadáání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednatel, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.

- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce „III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti..
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele . Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.

- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopriva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje:

Jan Mareš, vedoucí technického úseku na Mnichovo Hradiště, tel. 326 779 215, fax 327 514 160, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství, tel.: 733 780 101, e-mail: pavel.keller@colas.cz

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Albrecht, manažer regionu Střední Čechy a Praha, e-mail: jiri.albrecht@colas.cz, tel: 733 780 130

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

doklady o provádění díla.

- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20.000.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví – li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**

soudního řádu.



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 7. 10. 2013, č. usnesení 017-33/2013/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: 2x Rozhodnutí – stavební povolení /příloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění /příloha bude předložena v nabídce/ příkládá uchazeč/
 - Příloha č. 3: Formulář pro ohlášení změn stavby /příloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr / příloha bude předložena v nabídce//příkládá uchazeč/
 - Příloha č. 5: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor /příloženo zadavatelem/



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

Příloha č. 7: Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

V Praze dne 12 -11- 2013

Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel: 286003511, Fax: 286003500

V Praze dne 27 -11- 2013

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje

Objednatel č.2
obec Šestajovice

Roman Hrdlic
starosta obce





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 3

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.5

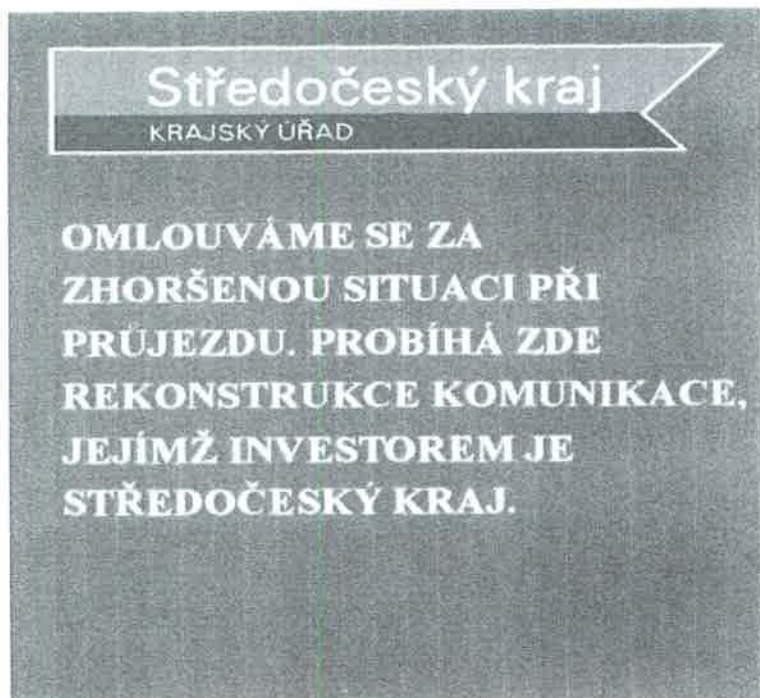

Označení stavby „VZOR“

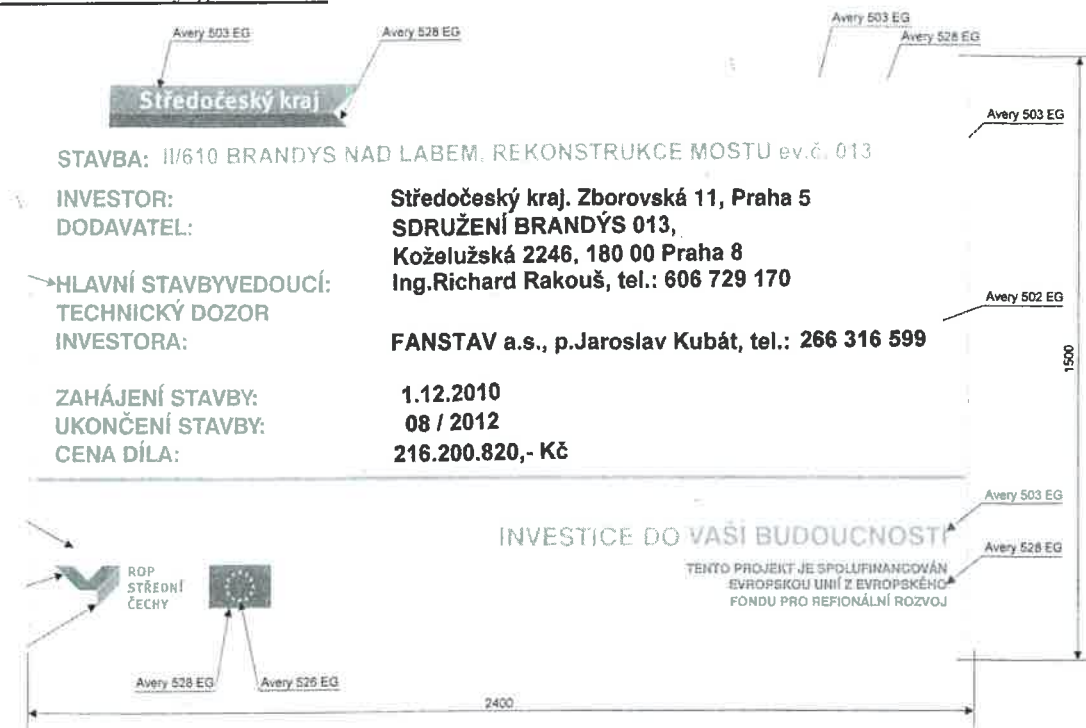

Pamětní deska „VZOR“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 7

Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů

SO Středočeský kraj

Okružní křižovatka Revoluční - Komenského

SO 01 Vozovky - 98,6 % z celkových nákladů SO 01		
Rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116, ulice Revoluční a Komenského		
Trasa 1		
Trasa 2		
Trasa 3		
TDI 92,5 % z celkových nákladů na TDI		
CELKEM za SO Středočeského kraje včetně DPH		

SO obce Šestajovice

Okružní křižovatka Revoluční - Komenského		
SO 02 Chodníky		
SO 01 Vozovky 1,4 z celkových nákladů SO 01		
TDI 7,5 % z celkových nákladů na TDI		
CELKEM za SO obce Šestajovice včetně DPH		

HARMONOGRAM

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	
Sestavpovice - rekonstrukce komunikace - zahájení do 6 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy	133 dní																			
Trasa I.	28 dní																			
Trasa II.	7 dní																			
Trasa III.	14 dní																			
Okružní křižovatka	133 dní																			
Chodníky	56 dní																			

Ing. Pavel Keller
zplnomocněný zástupce společnosti
a ředitel oblasti Sever

12 - 11 - 2013

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčové 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Sestavovace - rekonstrukce komunikace - zahájení do 6 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy	11 361 814,80 Kč	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí
Trasa I.	4 987 326,00 Kč	4 987 326,00 Kč	
Trasa II.	395 868,00 Kč	395 868,00 Kč	
Trasa III.	2 072 791,00 Kč	2 072 791,00 Kč	
Okružní křižovatka	3 109 677,20 Kč	1 504 838,60 Kč	1 604 838,60 Kč
Chodníky	796 152,60 Kč		796 152,60 Kč

8 960 823,60 Kč 2 400 991,20 Kč

12 -11- 2013

Ing. Pavel Keller
zplnomocněný zástupce společnosti
a ředitel oblasti Sever

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

DIC: CZ26177005 (6)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Zhotovitel: GRP

Krycí list - Cenová úroveň 2012/I

Stavba: Šestajovice

Zahájení:

Dokončení:

Objekt:

Rozpočet:

JKSO:

KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Viligr

Dat. kalkulace:

Odsouhlasil:

Datum:

podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	hmotnost v t
	Trasa 1	4 987 326,00	2 783,672
	Trasa 2	395 868,00	175,977
	Trasa 3	2 072 791,00	1 798,207
	Celkem:	7 455 985,00	4 757,856
	Zařízení staveniště		
	Celkový součet bez DPH:	7 455 985,00	
	DPH - SAZBA	21,00%	7 455 985,00
	Celkový součet včetně DPH:	9 021 741,90	

12 -11- 2013


COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 09 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (6)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003501

Zhotovitel: GRP

Krycí list - Cenová úroveň 2010/II

Stavba: Šestajovice Trasa 1

Zahájení:

Dokončení:

Objekt:

Rozpočet:

JKSO:
Měrná jednotka JKSO:

KSD:

Zpracoval: Vilingr

Dat. kalkulace:

Odsouhlasil:

Datum: . . .

.....
podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	hmotnost v t
0500	Stav. díl 5 - komunikace	4 469 927,00	2 782,793
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	517 399,00	0,879
	Celkem:	4 987 326,00	2 783,672
	Zařízení staveniště		
	Celkový součet bez DPH:	4 987 326,00	
	DPH - SAZBA	21,00%	4 987 326,00
	Celkový součet včetně DPH:	6 034 664,50	

Datum tisku:

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2012/I

Stavba:	Rekonstrukce komunikace Šestajovice			Kalkulanti:	Viligr	Kraj, okres:	
Objekt:	Trasa I			Kalkulace:		JKSO:	
Rozpočet:				Datum kalk.:		KSD:	
POŘ D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

				Stav. díl 5 - komunikace			
				Mimo obec:			
1	1410613	C56515-5111/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	5746,330 m2	205,00	1 177 998,00	
2	1411064	C57321-1111/00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	5746,330 m2	10,00	57 463,00	
3	1411210	C57714-5112/00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	5746,330 m2	209,00	1 200 983,00	
4	1411064	C57321-1111/00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	5746,330 m2	10,00	57 463,00	
5	1411201	C57713-4111/00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	5746,330 m2	196,00	1 126 281,00	
6	C57253-1132/00		Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	287,317 m	95,00	27 295,00	
7	C57258-1121/00		Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 40 mm tl 3 mm	574,633 m2	160,00	91 941,00	
				V obci:			
8	1411064	C57321-1111/00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1582,000 m2	10,00	15 820,00	
9	1411210	C57714-5112/00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1582,000 m2	209,00	330 638,00	
10	1411064	C57321-1111/00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1582,000 m2	10,00	15 820,00	
11	1411201	C57713-4111/00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1582,000 m2	196,00	310 072,00	
12	C57253-1132/00		Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	316,400 m	95,00	30 058,00	
13	C57258-1121/00		Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 40 mm tl 3 mm	158,200 m2	160,00	25 312,00	
14	6010236	C99822-5111/AH	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným (aut.vým.)	2782,793 t	1,00	2 783,00	
MEZISOUČET:				Stav. díl 5 - komunikace		4 469 927,00	

				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	1412449	C91973-5112/00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	13,000 m	64,00	832,00	
2	1412422	C11315-4222/00	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2	1582,000 m2	29,00	45 878,00	
3	1412423	C11315-4353/00	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2	13074,660 m2	36,00	470 688,00	
4	6010256	C99822-5311/AH	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letiště (aut.vým.)	0,879 t	1,00	1,00	
MEZISOUČET:				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce		517 399,00	

CELKEM: 4 987 326,00

Zařízení staveniště

CELKOVÝ SOUČET: 4 987 326,00

DPH-SAZBA 21% 4 812 720,00 1 010 671,20

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: 5 997 997,00

--

Zhotovitel: GRP

Krycí list - Cenová úroveň 2010/II

Stavba: Šestajovice Trasa 2

Zahájení:

Dokončení:

Objekt:

Rozpočet:

JKSO:
Měrná jednotka JKSO:

KSD:

Zpracoval: Vilingr

Dat. kalkulace:

Odsouhlasil:

Datum:

podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	hmotnost v t
0500	Stav. díl 5 - komunikace	343 935,00	175,895
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	51 933,00	0,082
	Celkem:	395 868,00	175,977
	Zařízení staveniště		
	Celkový součet bez DPH:	395 868,00	
	DPH - SAZBA 21,00%	395 868,00	83 132,30
	Celkový součet včetně DPH:		479 000,30

Datum tisku:

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2012/I

Stavba: Rekonstrukce komunikace Šestajovice
Objekt:
Rozpočet: Trasa 2

Kalkulant: Viingr
Kalkulace:
Datum kalk.:

Kraj, okres:
JKSO:
KSD:

POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA Kč	CELK. CENA Kč
				0500 Stav. díl 5 - komunikace			
1	1411064		C57321-1111/00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	747,300 m ²	10,00	7 473,00
2	1411210		C57714-5112/00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	747,300 m ²	209,00	156 186,00
3	1411064		C57321-1111/00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	747,300 m ²	10,00	7 473,00
4	1411201		C57713-4111/00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	747,300 m ²	196,00	146 471,00
5			C57253-1132/00	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	149,460 m	95,00	14 199,00
6			C57258-1121/00	Vyspravení trhlin živичným polymerovým páskem š 40 mm tl 3 mm	74,730 m ²	160,00	11 957,00
7	6010236		C99822-5111/AH	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným (aut. vým.)	175,895 t	1,00	176,00
MEZISOUČET:				0500 Stav. díl 5 - komunikace			343 935,00
				0900 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	1412449		C91973-5112/00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	40,800 m	64,00	2 611,00
2	1412422		C11315-4222/00	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ²	747,300 m ²	29,00	21 672,00
3	1412423		C11315-4223/00	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ²	747,300 m ²	37,00	27 650,00
4	6010256		C99822-5311/AH	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť (aut. vým.)	0,082 t	1,00	
MEZISOUČET:				0900 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			51 933,00
CELKEM:						395 868,00	
Zařízení staveniště							
CELKOVÝ SOUČET:						395 868,00	
DPH-SAZBA 21%						369 712,00	77 639,50
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:						473 508,00	

Zhotovitel: GRP

Krycí list - Cenová úroveň 2010/II

Stavba: Šestajovice Trasa 3

Zahájení:

Dokončení:

Objekt:

Rozpočet:

JKSO:
Měrná jednotka JKSO:

KSD:

Zpracoval: Vilingr

Dat. kalkulace:

Odsouhlasil:

Datum:

podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	hmotnost v t
0500	Stav. díl 5 - komunikace	1 800 684,00	957,739
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	272 107,00	840,468
	Celkem:	2 072 791,00	1 798,207
	Zařízení staveniště		
	Celkový součet bez DPH:	2 072 791,00	
	DPH - SAZBA	21,00%	2 072 791,00
	Celkový součet včetně DPH:	2 508 077,10	

Datum tisku:

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2012/I

Stavba: Rekonstrukce komunikace Šestajovice				Kalkulant: Viliagr	Kraj, okres:		
Objekt:				Kalkulace:	JKSO:		
Rozpočet: Trasa 3				Datum kalk.:	KSD:		
POŘ.Č.	ČÍS.KP.	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
0500				Stav. díl 5 - komunikace			
1	1410581		C56512-5111/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	1061,142 m2	126,00	133 704,00
2	1411064		C57321-1111/00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	3537,140 m2	10,00	35 371,00
3	1411210		C57714-5112/00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3537,140 m2	209,00	739 262,00
4	1411064		C57321-1111/00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	3537,140 m2	10,00	35 371,00
5	1411201		C57713-4111/00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3537,140 m2	196,00	693 279,00
6			C57253-1132/00	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	707,428 m	95,00	67 206,00
7			C57258-1121/00	Vyspravení trhlin živичným polymerovým páskem š 40 mm tl 3 mm	353,714 m2	160,00	56 594,00
8	1411678		C59776-1111/00	Rigol dlážďený do lože z betonu tl 100 mm z betonových desek	25,000 m2	727,00	18 175,00
9			5922759301	Best žlab II, rozmer 280/210/70-100	364,286 ks	57,00	20 764,00
10	6010236		C99822-5111/AH	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným (aut.vým.)	957,739 t	1,00	958,00
MEZISOUČET:				0500	Stav. díl 5 - komunikace		1 800 684,00
0900				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	1412449		C91973-5112/00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	58,600 m	64,00	3 750,00
2	1412422		C11315-4222/00	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2	3537,140 m2	15,00	53 057,00
3	1412423		C11315-4223/00	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2	3537,140 m2	19,00	67 206,00
4	1412435		C11320-1111/00	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	100,000 m	58,00	5 800,00
5	6020109		C97908-7212/AS	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti (aut.vým.)	840,079 t	13,00	10 921,00
6	6030014		C97908-4216/AV	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km (aut.vým.)	840,079 t	28,00	23 522,00
7	6030015		C97908-4219/AV	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu (aut.vým.)	4200,395 t	23,00	96 609,00
8	1412504		C97909-9115/00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	23,000 t	97,00	2 231,00
9	1412515		C97909-9145/00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	817,079 t	10,00	8 171,00
10	6010256		C99822-5311/AH	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť (aut.vým.)	840,468 t	1,00	840,00
MEZISOUČET:				0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce		272 107,00
CELKEM:							2 072 791,00
Zařízení staveniště							
CELKOVÝ SOUČET:							2 072 791,00
DPH-SAZBA 21%						1 948 991,00	409 288,10
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:							2 482 079,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0075_MTO

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

JKSO:
Místo: Šestajovice

CC-CZ: 21121
Datum: 19.08.2012

Objednavatel:
Obec Šestajovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. M. Tomeš

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. M. Tomeš

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	3 805 829,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100 000,00

Cena bez DPH 3 905 829,80

DPH základní	20,00%	ze	3 905 829,80	781 166,00
snížená	10,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 686 995,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

12 -11- 2013

Datum a podpis: Razítko

COVAČIČ, s.r.o.
IČ: 072617108 (G)
Tel: 266 003641, Fax: 266 003501

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0075_MTO

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Místo: Šestajovice

Datum: 19.08.2012

Objednavatel: Obec Šestajovice

Projektant: Ing. M. Tomeš

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. M. Tomeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 805 829,80	4 566 995,80
01	SO 01 Vozovky	3 009 677,23	3 611 612,73
02	SO 02 Chodníky	796 152,57	955 383,17
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		100 000,00	120 000,00
	Projektové práce	100 000,00	120 000,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 905 829,80	4 686 995,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Objekt: 01 - SO 01 Vozovky

JKSO: 822 25
Místo: Šestajovice

CC-CZ: 21121
Datum: 19.08.2012

Objednavatel:
Obec Šestajovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. M. Tomeš

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. M. Tomeš

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 994 677,23
Ostatní náklady	15 000,00
Cena bez DPH	3 009 677,23

DPH základní	20,00%	ze	3 009 677,23	601 935,50
snížená	10,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 611 612,73
-------------------	----------	------------	---------------------

MJ 1 [m2]:	3 786,00	ZRN/MJ 1:	790,99	Rozpočet/MJ 1:	794,95
------------	----------	-----------	--------	----------------	--------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Objekt: 01 - SO 01 Vozovky

Místo: Šestajovice

Datum: 19.08.2012

Objednavatel: Obec Šestajovice

Projektant: Ing. M. Tomeš

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. M. Tomeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 994 677,23
HSV - Práce a dodávky HSV	2 994 677,23
1 - Zemní práce CPV 45112000-5	749 104,17
2 - Zakládání	26 665,65
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45221000-2	20 404,06
469 - Stavební práce při elektromontážích	41 897,28
5 - Komunikace CPV 45233120-6	1 510 135,47
8 - Trubní vedení CPV 45230000-8	139 922,07
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4525900000-1	506 548,53
2) Ostatní náklady	15 000,00
Zařízení staveniště	15 000,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 009 677,23

ROZPOČET

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Objekt: 01 - SO 01 Vozovky

Místo: Šestajovice Datum: 19.08.2012
 Objednavatel: Obec Šestajovice Projektant: Ing. M. Tomeš
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. M. Tomeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 994 677,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 994 677,23

1 - Zemní práce CPV 45112000-5

749 104,17

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	0,30	29,00	8,70
		odstr_dlažby	0,3		0,30		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	8,30	24,00	199,20
		odstr_šterku	6,9+0,8+0,6		8,30		
3	K	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	1 520,00	55,00	83 600,00
		odstr_asfaltu200mr	"celková plocha komunikace"2339-"stř. ostr"526-"vozovka pod chodníky" 293		1 520,00		
97	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	600,00	17,00	10 200,00
		frézování	"40 mm" 300*"50 mm" 300		600,00		
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	73,90	58,00	4 286,20
		vytr_obrub	14,7+20,2+39		73,90		
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	839,23	10,00	8 392,30
			"60% z výkopu" výkop_vozovka/100*60		839,23		
8	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	2,50	2 136,00	5 340,00
		bour_betonu	2,5		2,50		
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 398,72	25,00	34 968,00
		sanace	"pro sanaci" (dlážďená_vozovka+asf_vozovka)*0,3		573,60		
			"pro trávníky" 1574*0,20		314,80		
			"pro asf. vozovku" 1790*0,42		751,80		
			"pro dl. vozovku" 122*0,48		58,56		
			"pro ozšíření pod obrubou" 56,5*0,3*0,48		8,14		
			-bour_betonu		-2,50		
			-odstr_asfaltu200mm*0,2		-304,00		
			-odstr_dlažby*0,06		-0,02		
			-odstr_šterku*0,2		-1,66		
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 398,72	1,00	1 398,72
			výkop_vozovka		1 398,72		
96	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	210,59	19,00	4 001,21
			jáma+rýha200+jáma+rýha60		210,59		
11	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,25	121,00	2 450,25
		jáma	"pro vpusti" 6*1,5*3		20,25		
12	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	20,25	1,00	20,25
			jáma		20,25		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro chráničky" 92,5*0,5*1 "pro drenáž" 151,2*0,5*0,4	m3	76,49	141,00	10 785,09
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 rýha60	m3	76,49	1,00	76,49
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rýha200 "pro přípojky vpustí" (1,5+10+15,5+3,5+3,5+5)*1,2*2	m3	93,60	131,00	12 261,60
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 rýha200	m3	93,60	1,00	93,60
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m pažení "pro přípojky vpustí" (1,5+10+15,5+3,5+3,5+5)*2*2	m2	156,00	20,00	3 120,00
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m pažení	m2	156,00	10,00	1 560,00
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz_vyk_skládka výkop_vozovka+jáma+rýha200+rýha60-násyp	m3	1 239,06	60,00	74 343,60
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz_vyk_skládka*10	m3	12 390,58	5,00	61 952,90
21	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných do 103 % PS sanace násyp	m3	923,60	40,00	36 944,00
22	M	583312000	kamenivo těžené zásykový materiál násyp*2*1,3	t	910,00	60,00	54 600,00
23	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina sanace*2*1,33	t	1 525,78	60,00	91 546,80
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) odvoz_vyk_skládka*1,7	t	2 106,40	35,00	73 724,00
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp_ŠP "zásyp ŠP se zhutněním rýh" 39*0,5*1,2 zásyp_zeminou "zásyp zásyovým materiálem" 39*1,2*1+92,5*0,8*0,5	m3	107,20	81,00	8 683,20
26	M	583312000	kamenivo těžené zásykový materiál zásyp_zeminou*2*1,33	t	222,91	81,00	18 055,71
27	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu obsyp "obsyp vpustí šterkopískem" jáma- (3,14*0,8^2)/4*1,5*6	m3	15,73	174,00	2 737,02
28	M	583312000	kamenivo těžené zásykový materiál (zásyp_ŠP+obsyp)*2*1,3	t	101,73	81,00	8 240,13
29	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 574,00	7,00	11 018,00
30	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační 1574*0,05	kg	78,70	68,00	5 351,60
33	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník	m2	1 574,00	10,00	15 740,00
34	M	103VP000001	Pořizovací náklady ornice (nákup a doprava nebo naložení a dovoz) trávník*0,2	m3	314,80	102,00	32 109,60
98	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 1574	m2	1 574,00	5,00	7 870,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 790,00	15,00	26 850,00
			1790		1 790,00		
			122		122,00		
			Součet		1 912,00		
35	K	182000001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení trávník	m2	1 574,00	6,00	9 444,00
					1 574,00		
36	K	183000002	Ostatní náklady na výsadbu křoviny - zalévání, řez, hnojení, ochrana před okusem atd.	m2	133,00	28,00	3 724,00
			výsadba		133,00		
37	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	133,00	74,00	9 842,00
			výsadba "kruh" 133		133,00		
38	M	02652023R	dodávka keře výšky cca 80 cm	kus	399,00	34,00	13 566,00
			"předpoklad 3 ks na 1 m2" výsadba*3		399,00		
2 - Zakládání							26 665,65
39	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	332,64	3,00	997,92
			opláštění 151,2*(0,4*3+0,5*2)		332,64		
40	M	693111460	geotextilie filtrační a separační 300 g/m2	m2	399,17	9,00	3 592,53
			opláštění*1,2		399,17		
100	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	151,20	146,00	22 075,20
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45221000-2							20 404,06
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,68	542,00	2 536,56
			"přípojky vpusti" 39*1,2*0,1		4,68		
43	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	8,75	2 042,00	17 867,50
			sed_lože "přípojky vpusti" (39*1,2*0,4-(3,14*0,2^2)/4*39)/2		8,75		
469 - Stavební práce při elektromontážích							41 897,28
44	K	388317777	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C12/15 v otevřeném výkopu	m3	8,37	2 104,00	17 610,48
			92,5*0,2*0,5-(3,14*0,11^2)/4*92,5		8,37		
45	K	388791120	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15	m	185,00	49,00	9 065,00
46	M	286VP0001	Trubka plastová chráničková DN 160 mm	m	199,80	66,00	13 186,80
			185*1,08		199,80		
47	K	388907777	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m	185,00	11,00	2 035,00
5 - Komunikace CPV 45233120-6							1 510 135,47
48	K	561000001	Vápenná stabilizace pláňe zemní frézou do hl. 300 mm	m2	1 912,00	50,00	95 600,00
			"zde uvedená položka vápněním, není jediná možná možnost provedení sanace" 0				
			"způsob provedení sanací je záležitostí dohody zhotovitele a stavebního dozoru po provedení zatěžovacích zkoušek pláňe" 0				
			"ve výkazu výměr je předpokládána sanace 100% pláňe vozovek" 0				
			"skutečný rozsah sanací je záležitostí dohody zhotovitele a stavebního dozoru po provedení zatěžovacích zkoušek pláňe" 0				
			dlážděná_vozovka+asf_vozovka		1 912,00		
101	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	1 928,97	90,00	173 607,30
			asf_vozovka+dlážděná_vozovka+"rozšíření pod obrubou" 56,55*0,3		1 928,97		
50	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 790,00	203,00	363 370,00
			asf_vozovka		1 790,00		
51	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	1 928,97	159,00	306 706,23
			asf_vozovka+dlážděná_vozovka+"rozšíření pod obrubou" 56,55*0,3		1 928,97		
52	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	300,00	12,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	300,00	9,00	2 700,00
54	K	576133121	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m	m ²	300,00	159,00	47 700,00
55	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asf_vozovka	m ²	1 790,00	196,00	350 840,00
					1 790,00		
56	K	577145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	300,00	160,00	48 000,00
57	K	577R10002	Oprava trhlin a prasklin v asfaltovém podkladu	m ²	300,00	20,00	6 000,00
58	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	122,00	383,00	46 726,00
59	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	23,93	2 458,00	58 819,94
					23,93		
					23,93		
60	K	599121111	Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m ²	122,00	53,00	6 466,00
					122,00		

8 - Trubní vedení CPV 45230000-8

139 922,07

61	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	6,00	10,00	60,00
62	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	39,00	209,00	8 151,00
63	M	597106330	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F Třída 160	m	39,59	697,00	27 594,23
					39,59		
64	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	12,00	634,00	7 608,00
					12,00		
65	M	597110269	oblouk kameninový glazovaný DN200mm 45° spojovací systém F	kus	12,36	620,00	7 663,20
					12,36		
66	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	6,00	1 012,00	6 072,00
67	M	597115740	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	6,18	4 612,00	28 502,16
					6,18		
68	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,00	1 813,00	10 878,00
69	M	592VP00001	Souprava dílců vpustí včetně mříže a koše na bláto	kus	6,06	3 533,00	21 409,98
70	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	kus	6,00	686,00	4 116,00
73	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	8,75	2 042,00	17 867,50
					8,75		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4525900000-1

506 548,53

112	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	5,00	7,00	35,00
					2,00		
					3,00		
					5,00		
113	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	5,00	7,00	35,00
					2,00		
					3,00		
					5,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m "1. etapa 30dnů" "Z2" 3 "2. etapa 30dnů" "Z2" 3 Součet	kus	6,00 3,00 3,00 6,00	142,00	852,00
115	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití "1. etapa 30dnů" "Z2" 3*30 "2. etapa 30dnů" "Z2" 3*30 Součet	kus	180,00 90,00 90,00 180,00	23,00	4 140,00
116	K	913212111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních "1. etapa 30dnů" "IS11c" 7 "IS11b" 1 "IP10a" 1 "IP10b" 2 "B1" 3 "P7" 1 "P8" 1 "E12" 3 Mezisoučet "2. etapa 30dnů" "IS11c" 5 "IS11b" 6 "IP10a" 2 "IP10b" 3 "B1" 3 "P7" 1 "P8" 1 "E12" 3 Mezisoučet Součet	kus	43,00 7,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 19,00 5,00 6,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 24,00 43,00	142,00	6 106,00
117	K	913212112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených "1. etapa 30dnů" "IP22" 15 "2. etapa 30dnů" "IP22" 16 Součet	kus	31,00 15,00 16,00 31,00	211,00	6 541,00
118	K	913212121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití "1. etapa 30dnů" "IS11c" 7*30 "IS11b" 1*30 "IP10a" 1*30 "IP10b" 2*30 "B1" 3*30 "P7" 1*30 "P8" 1*30 "E12" 3*30 Mezisoučet "2. etapa 30dnů" "IS11c" 5*30 "IS11b" 6*30 "IP10a" 2*30 "IP10b" 3*30 "B1" 3*30 "P7" 1*30 "P8" 1*30 "E12" 3*30 Mezisoučet Součet	kus	1 290,00 210,00 30,00 30,00 60,00 90,00 30,00 30,00 90,00 570,00 150,00 180,00 60,00 90,00 90,00 30,00 30,00 90,00 720,00 1 290,00	23,00	29 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití "1. etapa 30dnů" "IP22" 15*30 "2. etapa 30dnů" "IP22" 16*30 Součet	kus	930,00	36,00	33 480,00
74	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,00	534,00	3 738,00
75	M	404VP0000001	Značka dopravní reflexní základní velikost s rámečkem a upevňovacími prvky s dopravou 05-2009	kus	7,00	1 361,00	9 527,00
76	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,00	939,00	3 756,00
77	M	404VP0000003	Sloupek pro dopravní značku ocelový pozink nebo aluminiový D=76 mm s patkou	kus	4,00	774,00	3 096,00
78	K	915000001	Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč.předznačení	m2	85,40	444,00	37 917,60
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	586,09	231,00	135 386,79
		obruba_stojatá	702,54-obruba_ležatá		586,09		
81	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	591,95	120,00	71 034,00
		obruba_stojatá*1,01			591,95		
82	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	116,45	228,00	26 550,60
		obruba_bezbar	56,55+5,1+2*4,2+5,2+11+7,6+12,3+5,9+4,4		116,45		
83	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	117,61	87,00	10 232,07
		obruba_bezbar*1,01			117,61		
102	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,00	22,00	440,00
103	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	20,00	52,00	1 040,00
104	K	919735113	Řezání stavajících živičného krytu tl 20-100 mm	m	20,00	64,00	1 280,00
85	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	300,00	2,00	600,00
86	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	300,00	2,00	600,00
87	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,00	236,00	1 652,00
		odstr_značek	7		7,00		
95	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 238,57	1,00	4 238,57
105	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	768,79	19,00	14 607,01
		a_odvoz_asf	frézování*0,128		76,80		
		a_odvoz_bet	bour_betonu*2,4		6,00		
		a_odvoz_kam	odstr_štěrku*0,23		1,91		
		a_odvoz_asf1	odstr_asfaltu200mm*0,45		684,00		
		a_odvoz_bet2	odstr_dlažby*0,26		0,08		
		a_odvoz_suti	Součet		768,79		
106	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů "odvozná vzdálenost je určena pro potřebu kontrolního rozpočtu - skutečná odvozná vzdálenost je záležitostí zhotovitele" a_odvoz_suti*19	t	14 606,95	6,00	87 641,70
					14 606,95		
107	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,57	19,00	333,83
		a_odvoz_bet3	odstr_značek*0,04		0,28		
			odstr_značek*(0,082-0,04)		0,29		
		a_odvoz_bet4	vytr_obrub*0,23		17,00		
		a_odvoz_hmot	Součet		17,57		
108	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot "odvozná vzdálenost je určena pro potřebu kontrolního rozpočtu - skutečná odvozná vzdálenost je záležitostí zhotovitele" a_odvoz_hmot*19	t	333,85	6,00	2 003,10
					333,85		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) a_odvoz_bet+a_odvoz_bet2+a_odvoz_bet3+a_o dvoz_bet4	t	23,36	97,00	2 265,92
					23,36		
110	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) a_odvoz_asf+a_odvoz_asf1	t	760,80	10,00	7 608,00
					760,80		
111	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) a_odvoz_kam	t	1,91	74,00	141,34
					1,91		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Objekt: 02 - SO 02 Chodníky

JKSO: 822 25
Místo: Šestajovice

CC-CZ: 21121
Datum: 19.08.2012

Objednavatel:
Obec Šestajovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. M. Tomeš

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. M. Tomeš

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	791 152,57
Ostatní náklady	5 000,00

Cena bez DPH 796 152,57

DPH základní	20,00%	ze	796 152,57	159 230,60
snížená	10,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 955 383,17

MJ 1 [m2]: 977,00 ZRN/MJ 1: 809,78 Rozpočet/MJ 1: 814,90

Projektant
Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel
Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel
Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel
Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Objekt: 02 - SO 02 Chodníky

Místo: Šestajovice

Datum: 19.08.2012

Objednavatel: Obec Šestajovice

Projektant: Ing. M. Tomeš

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. M. Tomeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	791 152,57
HSV - Práce a dodávky HSV	791 152,57
1 - Zemní práce CPV 45112000-5	215 664,41
469 - Stavební práce při elektromontážích	15 859,28
5 - Komunikace CPV 45233120-6	471 437,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4525900000-1	88 191,74
2) Ostatní náklady	5 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	796 152,57

ROZPOČET

Stavba: Okružní křižovatka Revoluční - Komenského aktualizace 2012/02

Objekt: 02 - SO 02 Chodníky

Místo: Šestajovice Datum: 19.08.2012
 Objednavatel: Obec Šestajovice Projektant: Ing. M. Tomeš
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. M. Tomeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

791 152,57

HSV - Práce a dodávky HSV

791 152,57

1 - Zemní práce CPV 45112000-5

215 664,41

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	153,13	29,00	4 440,77
		odstr_dlažby	153,13		153,13		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	114,60	24,00	2 750,40
		odstr_šterku	53,5+39,1+10,9+11,1		114,60		
3	K	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	293,00	55,00	16 115,00
		odstr_asfaltu200mn	293		293,00		
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	290,32	10,00	2 903,20
		vykop_chodník			290,32		
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	290,32	51,00	14 806,32
			938,5*0,39+38,5*0,39		381,03		
			-odstr_asfaltu200mm*0,2		-58,60		
			-odstr_šterku*0,2		-22,92		
			-odstr_dlažby*0,06		-9,19		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	290,32	1,00	290,32
		vykop_chodník			290,32		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	17,50	19,00	332,50
		rýha60			17,50		
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,50	141,00	2 467,50
		"pro chráničky" 35*0,5*1			17,50		
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	17,50	1,00	17,50
		rýha60			17,50		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	307,82	108,00	33 244,56
		odvoz_vyk_skládka	vykop_chodník+rýha60		307,82		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 078,22	10,00	30 782,20
			"odvozná vzdálenost je určena pro potřebu kontrolního rozpočtu - skutečná odvozná je věcí zhotovitele" 0				
		odvoz_vyk_skládka*10			3 078,22		
12	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	175,00	75,00	13 125,00
		násyp	175		175,00		
13	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	455,00	81,00	36 855,00
		násyp*2*1,3			455,00		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	523,30	74,00	38 724,20
		odvoz_vyk_skládka*1,7			523,30		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,00	81,00	1 134,00
		zásyp_zeminou	"zásyp zásypovým materiálem"35*0,8*0,5		14,00		
16	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	37,24	81,00	3 016,44
		zásyp_zeminou*2*1,33			37,24		
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	977,30	15,00	14 659,50
		a_chodník	938,8		938,80		
		_chodník_OSP	38,5		38,50		
		Součet			977,30		

469 - Stavební práce při elektromontážích

15 859,28

18	K	388317777	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C12/15 v otevřeném výkopu	m3	3,17	2 104,00	6 669,68
			35*0,2*0,5-(3,14*0,11^2)/4*35		3,17		
19	K	388791120	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15	m	70,00	49,00	3 430,00
20	M	286VP0001	Trubka plastová chráničková DN 160 mm	m	75,60	66,00	4 989,60
			70*1,08		75,60		
21	K	388907777	Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu	m	70,00	11,00	770,00

5 - Komunikace CPV 45233120-6

471 437,14

33	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	977,30	71,00	69 388,30
			chodník+chodník_OSP		977,30		
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	977,30	94,00	91 866,20
			chodník+chodník_OSP		977,30		
24	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	38,50	194,00	7 469,00
			chodník_OSP		38,50		
25	M	59245267R	dlažba betonová pro nevidomé základní barevné provedení	m2	39,27	430,00	16 886,10
			chodník_OSP*1,02		39,27		
26	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	938,80	179,00	168 045,20
			chodník		938,80		
28	M	59245268R	dlažba betonová 6 cm standartní barevné provedení	m2	957,58	123,00	117 782,34
			chodník*1,02		957,58		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 4525900000-1

88 191,74

29	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	212,00	187,00	39 644,00
30	M	592172190	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	428,24	34,00	14 560,16
			obruba_parková*2*1,01		428,24		
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	204,59	19,00	3 887,21
		a_odvoz_bet	odstr_dlažby*0,26		39,81		
		a_odvoz_bet2	bour_betonu*2,4		6,00		
		a_odvoz_asf	odstr_asfaltu200mm*0,45		131,85		
		a_odvoz_kam	odstr_štěrku*0,235		26,93		
		a_odvoz_suti	Součet		204,59		
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 887,30	6,00	23 323,80
			"odvozná vzdálenost stanovena pro potřebu kontrolního rozpočtu - skutečná vzdálenost je záležitostí zhotovitele"				
			a_odvoz_suti*19		3 887,30		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,81	97,00	4 443,57
			a_odvoz_bet+a_odvoz_bet2		45,81		
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	131,85	10,00	1 318,50
			a_odvoz_asf		131,85		
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	26,93	0,00	0,00
			a_odvoz_kam		26,93		
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 014,50	1,00	1 014,50

VP - Vícepráce

0,00



Poznámka k výkazu výměr

Ve výkazu výměr, část „Okružní křižovatka Revoluční – Komenského“ je nesprávně uvedena sazba DPH 20 %, která však nelze opravit na správných 21 % (soubor je uzamčen a tudíž změny nejsou možné). Ve smlouvě o dílo je výše DPH uvedena správně.



UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012

vydává klientům

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9
IČ: 261 77 005
zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

SANGREEN, spol. s r.o.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9
IČ: 005 41 311
zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 76

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 150 00 Praha 5 – Řeporyje
IČ: 262 12 005
zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6848

SOMARO CZ, s.r.o.

Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 270 66 070
zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 93762

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je pojištěna pojistnou smlouvou č. 2731001523 pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/05 a UCZ /Odp/10 zvláštní část a dále výluk a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2731001523. Toto pojištění je sjednáno na níže uvedenou pojistnou částku.

Územní platnost:

celý svět s výjimkou USA a Kanady

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6

Číslo pojistné smlouvy:

2731001523

Pojistné období:

1. 1. 2013 do 1. 1. 2014

Pojistná částka, limit plnění:


Obecná odpovědnost za škodu..... 38.247.000,- Kč
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
za jednu a všechny škody v pojistném období..... 38.247.000,- Kč


Spoluúčast:

37.620,- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držitel žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádným podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze, dne 26. 3. 2013


Martina Radojčicová
junior underwriter
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu


Ing. Martina Vršecká
ředitelka
odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu

UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
