

SMLOUVA O DÍLO č. 2021-070

APARTMENTS STAVBY MB s.r.o.

IČ: 04022548, DIČ: CZ04022548

se sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 - Chodov

zastoupena jednatelem Miroslavem Klimkem

Adresa pro doručování písemností a kontaktní kancelář:

APARTMENTS STAVBY MB s.r.o., Čechova 667, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: +420 720 171 181, e-mail: stavby@apartmentsmb.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné)

a

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

IČ: 70107114

se sídlem Mladá Boleslav III, Na Celně 915/2

zastoupená: Mgr. Ivanou Pacovskou

(dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

1.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „Rekonstrukce chlapecké koupelny a WC“ dle rozpočtu dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je také závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla, vše za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel při provádění díla podrobně vychází z informací poskytnutých mu objednatelem a následujících podkladů a příloh, které se považují za nedílnou součást této smlouvy:
Grafický návrh obkladů
4. Součástí předmětu plnění díla není zajištění kolaudačního souhlasu.

2.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle nabídkového rozpočtu bude činit částku ve výši 249 972,63 Kč (slovy dvěstčtyřicetdevět tisíc devět set sedmdesát dvacelých šedesát tři haléřů korun českých) + DPH.
2. Příložený rozpočet se dle § 2622 občanského zákoníku považuje za rozpočet:
 - s **nezaručenou úplností**. Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností či materiálů do rozpočtu s výkazem výměr nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy nebo pokud byl rozpočet s výkazem výměr k nacenění poskytnut zhotoviteli objednatelem
 - Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o jakékoliv potřebě změny v rozsahu prací a činnostech na provedení díla, které vzniknou před nebo v průběhu provádění díla, a to jak z důvodu písemného požadavku objednatele, tak dle odborného názoru zhotovitele při provádění díla, nebo v důsledku vnějších vlivů („vícepráce“ nebo „méněpráce“). Pokud provedení víceprací znamená navýšení celkové ceny díla, pak zhotovitel informuje objednatele o ceně víceprací nebo o navýšené celkové ceně díla. Objednatel je povinen se písemně vyjádřit do 3 kalendářních dnů od obdržení takové informace (postačuje zápis do stavebního deníku). Pokud se objednatel

písemně nevyjádří v uvedené době, není zhotovitel povinen započít s prováděním víceprací a současně je oprávněn přerušit provádění díla. Hrozí-li nebezpečí škody nebo v případě, že objednatel nebude reagovat ve výše uvedené době, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla a požadovat po objednateli náhradu takto vzniklých nákladů.

3. Zhotovitel stavby si vyhrazuje právo v opodstatněných případech (např. nemožnost dodávky materiálu apod.) na změnu použitých materiálů či technologií oproti uvedeným v této smlouvě a jejích přílohách. V tomto případě má zhotovitel povinnost neprodleně po zjištění této skutečnosti informovat objednatele a navrhnout mu způsob řešení, včetně dopadů na celkovou cenu díla. Výsledek tohoto jednání musí být opět stvrzen písemnou formou a podepsán oběma smluvními stranami (postačí zápisem do stavebního deníku). Pokud objednatel neposkytne součinnost dle tohoto odstavce v době stanovené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.
4. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci, a to na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek, (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 30. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla a v souvislosti s dílem, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných v souvislosti s dílem subdodavatelem zhotovitele. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 3 pracovních dnů od data doručení, jinak se má za to, že je odsouhlasen.
5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a její přílohou bude zjišťovací protokol odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
6. Lhůta splatnosti faktur je 14 dní.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o dobu, kterou si přerušil provádění díla vynutilo, se automaticky prodlužují termíny plnění dle čl. 3 této smlouvy. Bude-li prodlení delší než 28 dnů, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto nemá vliv na možnost uplatnění smluvní pokuty.

3.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 17.12.2021. Termín zahájení a/nebo dokončení díla se posune, pokud zhotovitel nebude moci provádět dílo z důvodu překážky na straně objednatele, nebo z důvodu tzv. vyšší moci (okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku oběma stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této Smlouvy, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události) a to o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo provádět.
2. Čas plnění díla se přiměřeně prodlužuje při nedodržení podmínek dle této smlouvy, zejména v případě, že objednatel neposkytne řádně a včas (jinak v přiměřené době) součinnost nebo povinnost stanovenou touto smlouvou, v případě změny díla, v případě výskytu skrytých překážek místa, dále v případech, kdy se objeví jiné důvody, pro které není možné výše sjednané termíny dodržet, včetně zásahu vyšší moci či nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, vítr, sníh apod.), nebo jiných překážek nezávislých na vůli zhotovitele. V případě, že se zhotovitel dozví alespoň o jedné z výše uvedených skutečností, pro kterou se prodlužuje čas plnění, je povinen neprodleně informovat o tom objednatele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn dle svého vlastního uvážení přerušit provádění díla, přičemž se zavazuje objednateli, že přerušil provádění díla pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel bude vhodným způsobem objednatele informovat o potřebě přerušit dílo i zahájení pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel provádění díla nepřeruší a vlivem skutečností uvedených v tomto článku dojde k nedodržení času plnění, nebude toto považováno za prodlení zhotovitele s plněním díla. Pokud v důsledku skutečností dle tohoto článku vzniknou zhotoviteli vícenásledky, je oprávněn postupovat dle této smlouvy.

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci):
Cenová nabídka 2021-070

4.

Staveništní připravenost

1. Za připravenost staveniště pro účely provádění díla odpovídá objednatel.
2. Objednatel je povinen na vlastní náklady zajistit pro zhotovitele stavby stavební proud 230 V a 380 V s minimálním jističem 25 A, dále vodu pro staveništní účely a zajistit pro zhotovitele bezplatný odběr vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje využívat zdroje uvedené v tomto odstavci výhradně za účelem provedení díla, resp. stavby.
3. Objednatel je dále povinen v případě nutnosti použití nákladních vozidel zajistit na žádost zhotovitele volný průjezd vozidel těchto rozměrů z nejbližší komunikace I. nebo II. třídy až ke staveništi. Objednatel se zavazuje přistoupit ke splnění povinnosti stanovené v tomto odstavci bez zbytečného odkladu.
4. Mobilní WC včetně servisu, staveništní lešení, případně oplocení pozemku či jiné potřebné zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby, je-li uvedeno v přiloženém Rozpočtu stavby.

5.

Provedení díla, kontrola provádění, stavební deník

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí v době dle čl. 3 smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá od předání staveniště po předání díla za dodržování všech předpisů BOZP, PO, předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství.
3. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla zejména provedené práce, jakož i další okolnosti týkající se stavby. Kopii stavebního deníku obdrží Objednatel při předání díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.

Práva a povinnosti objednatele a jeho součinnost

1. Objednatel umožní zhotoviteli v dostatečném předstihu před zahájením prací dle této smlouvy v místě provádění díla prohlídku pozemku, resp. staveniště, jeho nezbytné zaměření pro provedení díla.
2. Zhotovitel na základě dostatečné možnosti shlédnout a prozkoumat staveniště sdělí objednateli případné potřebné úpravy staveniště pro zahájení provádění díla, resp. stavby. Tyto potřebné úpravy zajistí buď objednatel sám, nebo je provede zhotovitel jako vícepráce dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn dle stavebního zákona pro výstavbu určit svého technického dozora investora (dále jen „TDI“). V případě, že objednatel určí svého TDI, musí neprodleně písemně jeho jméno a příjmení, telefonický, korespondenční a e-mailový kontakt zaslat zhotoviteli, včetně rozsahu jeho pravomocí, resp. jeho práv a povinností vůči zhotoviteli, které mu objednatel udělil. V případě, že objednatel neurčí jasně a určitě žádnou osobu jako svého TDI, platí, že je ve vztahu ke zhotoviteli pro účely této smlouvy, zejména pro jednání během stavby, pro účast na kontrolních dnech, pro řešení vzniklých problémů apod., jako TDI sám objednatel. Případné změny na pozici TDI během plnění předmětu této smlouvy je povinen objednatel neprodleně písemně zaslat takovou informaci zhotoviteli, přičemž každá informace je vůči zhotoviteli účinná v okamžiku, kdy ji obdrží. Pokud objednatel určí TDI a sdělí zhotoviteli jasně a určitě jeho práva a povinnosti, je pod pojmem „objednatel“ v této smlouvě tam, kde to připadá v úvahu v závislosti na stanovených právech a povinnostech TDI, míněn také TDI, a to bez toho aniž by byl výslovně uveden.
4. Objednatel, případně jeho TDI, má za povinnost plně spolupracovat se zhotovitelem v průběhu provádění díla a poskytovat mu neprodleně na jeho výzvu veškerou potřebnou součinnost, a to zejména:
 - účastí na kontrolních dnech,
 - vyjadřováním se pravidelně a zejména v případech stanovených touto smlouvou do stavebního deníku k průběhu výstavby způsobem dle odst. níže,
 - účastí a kontrolami zkoušek prováděných zhotovitelem,
 - účastí na předání a převzetí staveniště a na předání a převzetí díla,
 - součinností v případě, že se objeví potřeba méněprací či víceprací,
 - součinností a spolupůsobením při odstraňování případných problémů a překážek během provádění díla,
 - součinností a spolupůsobením k odstraňování případných vad a nedodělků díla.
5. Objednatel má za povinnost pravidelně kontrolovat stavební deník, alespoň jednou za 3 kalendářní dny, a to i bez výzvy (pozvání) zhotovitele, činit do něj vlastní zápisy (nebo prostřednictvím TDI) a vyjadřovat se k zápisům prováděných zhotovitelem. Objednatel je v případě vlastního zápisu do stavebního deníku povinen uvést pod vlastní text svůj vlastnoruční podpis a/nebo své jméno a příjmení, v opačném případě není zhotovitel oprávněn brát zápisy objednatele za autentické, případně je oprávněn požadovat jejich písemné nebo telefonické potvrzení. Totéž platí i v případě, že zápis objednatele je nesrozumitelný, nečitelný či nesprávný apod. V případě, že objednatel nebude reagovat na zápis výzvy či požadavku zhotovitele zapsaný do stavebního deníku do 5 kalendářních dní od učinění takového zápisu, považuje se, že objednatel takový zápis plně odsouhlasil a že nemá jakýchkoliv výhrad proti postupu či navrhovanému postupu zhotovitele. Totéž platí pro TDI. Toto ustanovení se však nepoužije na práce měnící cenu díla (vícepráce či méněpráce, změnu materiálů a technologií), které jsou řešeny v článku 2 této smlouvy.
6. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba vyřešit otázky neupravené touto smlouvou, zavazuje se objednatel konzultovat je se zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od učinění výzvy zhotovitele (postačí zápisem ve stavebním deníku). Pakliže objednatel tuto konzultaci, svůj názor či svůj požadavek na řešení situace neposkytne, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit nebo zvolit vlastní řešení na náklady objednatele a v provádění díla pokračovat.
7. Objednatel, TDI, či ostatní osoby ze strany objednatele mají povinnost při návštěvě staveniště se chovat v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). POZOR! Návštěva staveniště je pro objednatele, pro TDI či jiné osoby z důvodu bezpečnosti možná pouze při konání kontrolních dní, nebo za účasti oprávněné osoby ze strany zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby pověřené vedením stavby zhotovitelem. Návštěva staveniště je ve výjimečných případech možná také bez přítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele, a to pouze po předchozím souhlasu oprávněného zástupce zhotovitele.

7.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy za cenu uvedenou v čl. 2 této smlouvy a v čase plnění uvedeném v čl. 3 této smlouvy. Dílo musí zhotovitel provádět takovým způsobem, aby bylo způsobilé po jeho dokončení k užívání obvyklým předpokládaným způsobem.
2. Zhotovitel je povinen během provádění stavby vést stavební deník a umožnit k němu přístup objednateli.
3. Do stavebního deníku se zapisují mimo jiné i skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost stavební deník předložit k nahlédnutí a umožnit mu činit do něj vlastní poznámky.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnost věcí, materiálu (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je povinen se k takovému vyjádření vyjádřit do 3 kalendářních dnů od učiněné výzvy zhotovitele (postačí zápisem ve stavebním deníku), přičemž platí ustanovení čl. 6, odst. 6 výše. Pakliže objednatel bude trvat na svých pokynech či věcech, neodpovídá zhotovitel za vady způsobené nevhodnými pokyny či nevhodnými věcmi. Tímto není dotčeno právo zhotovitele odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel nemá povinnosti dle tohoto odstavce, pokud nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
5. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho částí jinou osobu, avšak i v takovém případě odpovídá objednateli za provedené dílo, jako by ho prováděl sám.
6. Zhotovitel je povinen po dokončení plnění díla uvést staveniště do pořádku a opustit staveniště nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla. Stejně tak je zhotovitel povinen provádět pravidelný úklid staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje, že před započatím provádění stavby při převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku určí odpovědnou osobu zhotovitele, která bude průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a která bude označena jako „koordinátor stavby“.

8.

Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k zahájení prací na díle nejpozději 1.11.2021.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí staveniště minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dnem předání a převzetí staveniště. Je povinností objednatele, aby se osobně nebo v zastoupení TDI na toto předání a převzetí staveniště dostavil.
3. Smluvní strany se dohodly, že si staveniště předají nejpozději 7 kalendářních dní před plánovaným započatím stavby.
4. Z předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis, kde bude popsán aktuální stav staveniště, včetně případných překážek, které bude nutno ze strany objednatele odstranit ve stanovených termínech v tomto zápisu. O dobu, po kterou bude objednatel zajišťovat odstranění překážek dle předchozí věty, se prodlužuje čas plnění a zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla.
5. V den předání a převzetí staveniště bude založen stavební deník, který bude vést po celou dobu výstavby zhotovitel stavby.

9.

Předání a převzetí Díla

1. Dílo se považuje za provedené dnem předání díla.
2. Zhotovitel předá dílo objednateli v čase (termínu) plnění v souladu s touto smlouvou s přihlédnutím zejména k čl. 3 této smlouvy (oprávněné přerušení provádění díla či prodloužení času plnění). Zhotovitel může nabídnout objednateli dílo i před sjednaným termínem provedení, ale jen za předpokladu, že dílo nemá vady či nedodělky, které brání užívání díla, resp. stavby.
3. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dnem předání a převzetí díla. V takovém případě je povinností objednatele (či jeho TDI) se k předání a převzetí díla dostavit, či požádat zhotovitele o jiný termín předání a převzetí díla. V takovém případě se ale případné předání a převzetí díla objednatel po prvním termínu navrženém zhotovitelem nepovažuje za prodlení zhotovitele a nepoužije se ustanovení o smluvní pokutě dle článku 10 této smlouvy.
4. Z předání a převzetí díla sepiší obě smluvní strany písemný zápis, v němž bude zejména výslovně uveden stav předávaného díla, prohlášení objednatele, zda dílo přijímá, zda objednatel případně vytýká vady, které jsou při převzetí díla zřejmé.
5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel má právo převzetí díla odmítnout, jen pokud má dílo takové vady a nedodělky, které zcela znemožňují jeho užívání. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí uvést důvody takového odmítnutí.
6. Převzme-li objednatel dílo se zjevnými vadami či nedodělkami, dohodnou strany v zápise způsob a lhůtu jejich odstranění.
7. Pokud objednatel dílo nepřevzme, přestože byl povinen tak učinit, považuje se dílo za předané dnem, kdy byl objednatel povinen ho převzít. Dílo se považuje za předané objednateli též, pokud se objednatel bez omluvy nedostavil k převzetí

díla, přestože k tomu byl zhotovitelem vyzván. V takovém případě sepíše zhotovitel zápis jednostranně a doporučeně jej zašle objednateli.

10.

Smluvní pokuty

1. Pokud objednatel je v prodlení s platbou celkové ceny díla nebo její části dle článku 2 a 4 této smlouvy, náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. V tomto případě má zhotovitel nárok na přerušování provádění prací na díle, a to až do zaplacení dlužné částky a o tuto dobu se pak prodlužuje čas plnění pro dokončení a předání díla či jeho části. Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat úroky z prodlení a náhradu případné škody v plné výši.
2. Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží čas plnění díla (pakliže je zdržení prokazatelně a výlučně vinou zhotovitele), poskytne zhotovitel objednateli termínovou slevu ve výši 0,05% z ceny díla (jeho části) za každý den prodlení s předáním díla.

11.

Kvalitativní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle právně závazných a účinných právních předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými normami výrobců dodaných věcí a materiálu.
2. V případě, kdy objednatel bude po zhotoviteli požadovat jiné kvalitativní parametry díla, než jsou uvedeny v dokumentech podle článku 11, odst. 1 této smlouvy, pak musí tyto kvalitativní parametry písemně sdělit zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl plynule pokračovat v provádění díla (v případě provádění stavby postačí zápisem do stavebního deníku). V případě, že tyto požadavky objednatel budou mít vliv na výši ceny díla, není zhotovitel povinen takové požadavky provést, do té doby, než se s objednatel dohodne na změně díla čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit provádění díla, pokud vlivem požadavků objednatel nebude vhodné pokračovat v jeho provádění a případně požadovat náhradu nákladů na zvýšené nároky při provádění díla.

12.

Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu (újmu)

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se projeví po jeho předání v záruční lhůtě. Pro tento případ zhotovitel upozorňuje objednatele na odpovědnost na přebírání díla vyplývající z platné legislativy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatel, nevhodných pokynů čiací objednatel dle čl. 7 výše, ani za vady, které byly po předání díla způsobeny objednatel, zásahem třetí osoby, skutečností nezávislejší na vůli zhotovitele či neodvratitelnými událostmi nebo které vznikly v důsledku nevhodného užívání předmětu díla či nedostatečné nebo nesprávné údržby.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za stavbu po dobu 24 měsíců (2 roky) ode dne předání a převzetí díla dle čl. 9 této smlouvy. Záruční doba jednotlivých zařizovacích předmětů či spotřebičů zakoupených zhotovitelem pro splnění závazků z této smlouvy je shodná se záruční dobou poskytovanou jednotlivými výrobci těchto zařízení.
4. V případě výskytu záruční vady objednatel zhotoviteli písemně zašle reklamaci s popisem vady (postačí e-mailem). Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dní od doručení reklamace po předchozí dohodě navštívit místo staveniště a reklamovanou vadu zkontrolovat. Do 30 kalendářních dní je pak povinen se k reklamované vadě vyjádřit a v případě uznání záruční vady se s objednatel dohodnout na termínu a způsobu jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nedodrží termíny dle článku 12, odst. 4 ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, má objednatel právo reklamovanou vadu nechat opravit třetí osobou, a účelně vynaložené náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil objednateli zaviněně. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nepatřičným užitím díla objednatel nebo jeho právními nástupci. Stejně tak zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit, dále za prodlení, opominutí či rozhodnutí dotčených orgánů a institucí, ani neodpovídá za škodu, způsobenou třetí osobou (např. krádež, vandalismus apod.).
7. Zhotovitel nahradí objednateli škodu, způsobí-li jí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti a v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.
8. Zhotovitel není povinen nahradit objednateli nemajetkovou újmu podle § 2971 občanského zákoníku, s výjimkou případů, kdy tuto povinnost stanoví zákon kogentně.

13.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.
2. Objednatel má nárok na odstoupení od této smlouvy v případě, když je zhotovitel s prodlením s termínem plnění stavby o více jak 28 kalendářních dní, pokud je toto prodlení prokazatelně a zaviněně způsobeno zhotovitelem.
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy větším než 28 kalendářních dní.

4. Zhotovitel má nárok na odstoupení od smlouvy v případě, když objednatel nezíská stavební povolení či jiné oprávnění na provedení díla do 12 měsíců od podpisu této smlouvy.
5. V případě odstoupení jakékoliv strany od této smlouvy, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli cenu části díla provedené do dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud není pro určité případy v této smlouvě sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
6. Pokud oprávněné přerušení provádění díla dle této smlouvy trvá déle než 6 měsíců, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě má vedle ceny díla dle odst. 5 také nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů ve výši nejméně 5% z ceny díla. Tím není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
7. Jestliže objednatel bezdůvodně nebo bez pochybení či prodlení na straně zhotovitele ukončí tuto smlouvu, náleží zhotoviteli stornopoplatek ve výši 5% z ceny díla, a dále všechny náklady spojené s přerušením prací ohledně provádění díla a s ukončením této smlouvy.
8. Jestliže zhotovitel odstoupí od smlouvy z důvodu dle tohoto článku, odst. 3 nebo 4, náleží zhotoviteli všechny náklady spojené s přerušením prací ohledně provádění díla a s odstoupením od této smlouvy ve výši nejméně 5% z ceny díla.

14.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i veškeré závazky z nich vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva a jakékoliv její změny či dodatky mohou být uzavřeny jen v písemné formě odsouhlasené a podepsané oběma smluvními stranami, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
3. Ustanovení § 1757 odst. 2 a 3 občanského zákoníku se nepoužijí, tedy zachycení obsahu smlouvy či ujednání a vystavení potvrzení dle § 1757 odst. 2 občanského zákoníku nebude považováno za uzavření smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel takovou odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou výslovně neodmítne. Odpověď objednatele ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, které jakkoliv mění návrh smlouvy či návrh na uzavření jiného ujednání, nebude považována za přijetí takového návrhu, a to i v případě, že zhotovitel, resp. klient takovou odpověď druhé strany s dodatkem nebo odchylkou výslovně neodmítne.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné, nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního ustanovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že jakýkoliv důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu § 1730 občanského zákoníku musí být jako důvěrné označeny.
6. Objednatel není oprávněn k zápočtu své pohledávky proti pohledávce z této smlouvy, k postoupení pohledávky z této smlouvy ani k postoupení této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Objednatel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči zhotoviteli, bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
7. Před uzavřením této smlouvy zhotovitel ověřil se souhlasem objednatele jeho totožnost podle jeho platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
8. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude zpracovávat jeho osobní údaje automatizovaně nebo jinými prostředky v nezbytném rozsahu pro účely plnění této smlouvy, a po dobu nezbytně nutnou či stanovenou právními předpisy. Zhotovitel zpřístupní osobní údaje objednatele jen subjektům uvedeným v této smlouvě nebo pro účely plnění smluvních či zákonných povinností vyplývajících z této smlouvy. Objednatel má zejména právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
9. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Přílohy uvedené v textu této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí smlouvy se stanou také zápisy uvedené v této smlouvě a případně další výslovní dohody smluvních stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem, a že smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich svobodnou vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření. Objednatel dále prohlašuje, že s písemnostmi, na které se v této smlouvě odkazuje, a jejich významem byl seznámen a že jejich význam zná. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl seznámen se všemi údaji dle § 1811 občanského zákoníku.



IČO: 040 22 548 DIČ: CZ 040 22 548

-2-



APARTMENTS STAVBY MB s.r.o

Holušická 2221/3, 14800 Praha 4 Chodov

IČ: 04022548, DIČ: CZ04022548

Telefon: 326232000, 720171181 , E-mail: stavby@apartmentsmb.cz

C 240612 vedená u Městského soudu v Praze

CENOVÁ NABÍDKA

2021-070

Dobrý den,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na zakázku

Rekonstrukce chlapecké koupelny a WC

Nabídka je vystavena pro: SŠ, ZŠ, MŠ, DD a spec. ped. centrum MB

Předpokládané trvání prací: 6 týdnů

Platnost nabídky do: 8. 10. 2021

Cena bez DPH

249 972,63 CZK

DPH základní



21,00%

249 972,63

52 494,25

Cena s DPH


302 466,88 CZK

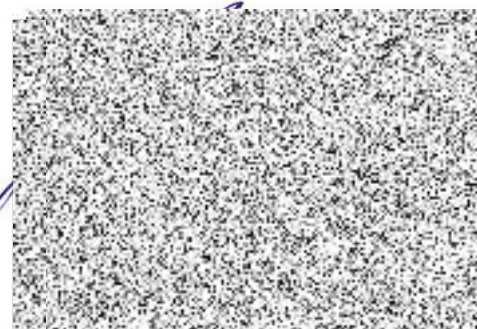


1. Tento rozpočet/nabídka se dle § 2622 občanského zákoníku považuje za rozpočet/nabídku:
 - s nezaručenou úplností tj. zhotovitel má nárok na zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění díla potřeba činností či materiálů do rozpočtu s výkazem výměr nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době sestavování nabídky nebo uzavření smlouvy nebo pokud byl výkaz výměr k nacenění poskytnut zhotoviteli objednatelem.
 - nezávazný tj. zhotovitel má nárok na zvýšení ceny díla o částku, o niž se nevyhnutelně převyšují náklady účelně vynaložené zhotovitelem (např. zvýšená spotřeba materiálu nebo zvýšení cen stavebních prací či materiálů).
 Tuto skutečnost musí zhotovitel objednateli prokázat.
 Nerealizované položky nebudou účtovány, změna položek možná po domluvě s objednatelem písemnou formou nebo zápisem ve stavebním deníku.
 Pokud není položkově uvedeno v rozpočtu/nabídce není počítáno s úpravou jakýchkoliv rozvodů ZTI, elektroinstalace, plynu, odpadů a zakrytím jakýchkoliv vnitřních součástí a s žádným protiprašným opatřením.
 Investor určí typ dlažby, obkladů, barvu fasády atd. a to písemně nebo zápisem do stavebního deníku.
 2. Cena díla je rozložena do splátek, které objednatel uhradí bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“), a to takto:
 - po odsouhlasení rozpočtu/ nabídky a do 5 dnů od zahájení prací (zápisem ve stavebním deníku) na objednaném díle a to 40 % z celkové ceny díla,
 - cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečných faktur k jednotlivým částem předmětu díla. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Konečné faktury vystaví zhotovitel vždy na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí celé části díla
 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu určenou cenovou předloženou nabídkou.
 Doba splatnosti faktury zhotovitele je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení. Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá vyúčtovaná částka byla připsána na určený bankovní účet zhotovitele.
 Výši celkové ceny s DPH (dále jen „celková cena“) je zhotovitel oprávněn upravit o případnou změnu v sazbě DPH.
 3. Cena a/nebo termíny provádění díla mohou být upřesněny na základě změny rozsahu provádění díla, nebo nových skutečností objektivně zjištěných až při provádění díla a nezjistitelných v průběhu přípravy nabídky zhotovitele jako podkladu pro uzavření smlouvy (např. spodní voda, rozvody médií, statika, základy apod.). Nová cena a/nebo termíny provádění díla budou znovu odsouhlaseny oběma stranami písemným dodatkem nebo zápisem ve stavebním deníku.
 Nebude-li takový dodatek uzavřen bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel skutečnosti dle první věty tohoto odstavce zjistil a oznámil objednateli, je zhotovitel do doby jeho uzavření oprávněn přerušit provádění díla. O tuto dobu se automaticky prodlužuje termín provedení díla. V případě, že nedojde k uzavření dodatku do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel skutečnosti dle první věty tohoto odstavce zjistil a oznámil objednateli, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení objednateli.
 V případě prodloužení objednatele s uhrazením splátek/dílčích faktur, které jsou podmínkou pro zahájení a pokračování v provádění díla v dohodnutých termínech, je zhotovitel oprávněn o dobu trvání prodloužení objednatele posunout termín uvedený v rozpočtu/nabídce, přičemž se nedostane do prodloužení s dokončením a předáním díla.
 Objednatel není oprávněn k zápočtu své pohledávky proti pohledávce z této nabídky/smlouvy, k postoupení pohledávky z této nabídky/smlouvy ani k postoupení této nabídky/smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
 Objednatel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči zhotoviteli, bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
 V případě, že nedojde k úhradě splátek ani do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy se objednatel dostal do prodloužení s placením splátek, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení objednateli.
 Bude-li objednatel v prodloužení se zajištěním stavební připravenosti dle rozpočtu/nabídky o více než 7 dní nebo v případě neposkytnutí veškeré potřebné součinnosti objednatelem dle požadavků zhotovitele pro zajištění plynulého provádění díla, delším než 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení části ceny díla dle článku č. 2 a skladovací poplatky ve výši 950,- Kč/denně, příp. s DPH. Skladovací poplatky budou vyúčtovány vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce.
 Případné vícepráce, požadované objednatelem nebo jejichž potřeba vznikne na základě nepředvídatelných skutečností v průběhu provádění díla, budou provedeny na základě objednatelem i zhotovitelem potvrzeného zápisu ve stavebním, nebo na základě jiné závazné písemné objednávky objednatele potvrzené zhotovitelem. Nedojde-li k odsouhlasení víceprací postupem dle předchozí věty bez zbytečného odkladu, je zhotovitel do doby jejich odsouhlasení oprávněn přerušit provádění díla, přičemž se nedostane do prodloužení. O tuto dobu se automaticky prodlužuje termín provedení díla.
 Nedojde-li k odsouhlasení víceprací ani ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení potřeby víceprací objednatelem nebo zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla dle původních ujednání. Práva a povinnosti smluvních stran se vztahují i na vícepráce. Doba splatnosti faktur zhotovitele na vícepráce je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení.
 Potvrzením nabídky objednatel výslovně souhlasí s podmínkami uvedenými v této nabídce.

Mladé Boleslavi 1. 10. 2021

Zpracováno systémem: KROS 4


 s.r.o.
 Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4
 IČO: 040 22 548 DIČ: CZ 040 22 548
 -2-

Rekapitulace objektů stavby

Kód a popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
 2021-070 - Rekonstrukce chlapecké koupelny a WC	249 972,63	302 466,88

Rozpočet

ČP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena	Celková Cena
		2021-070 - Rekonstrukce chlapecké koupelny a WC				249 972,63
	KL	Náklady z krycího listu				14 498,56
	VRN1	Zařízení staveniště	CZK	1,000	2 071,22	2 071,22
	VRN3	Územní vlivy	CZK	1,000	6 213,67	6 213,67
	VRN4	Provozní vlivy	CZK	1,000	6 213,67	6 213,67
	HSV	Práce a dodávky HSV				28 753,62
	3	Svislé a kompletní konstrukce				184,45
1	340271001	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórabetonovými tl 50 mm	m2	0,350	527,00	184,45
	4	Vodorovné konstrukce				4 584,00
2	411388621	Zazdění a začištění otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	6,000	764,00	4 584,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 532,82
3	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,122	4 760,00	580,72
4	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	325,00	975,00
5	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	1 217,70	3 653,10
6	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,000	188,00	4 324,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				820,80
7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,400	342,00	820,80
	997	Přesun sutě				12 551,10
8	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,910	879,00	3 436,89
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,910	251,00	981,41
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,300	16,00	1 876,80
11	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,910	1 600,00	6 256,00
	998	Přesun hmot				1 080,45
12	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,735	1 470,00	1 080,45
	PSV	Práce a dodávky PSV				193 297,89
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 650,17
13	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/55 celonerez 115x115	kus	1,000	687,05	687,05
14	721212121	Montáž odtokového sprchového žlabu Sprchový žlab S-Line Multi 70 cm plast chrom lesk čtverečky ZLAB70	kus	2,000	3 974,58	7 949,16

Zpracováno systémem: KROS 4

4/7

ČP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena	Celková Cena
15	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,011	721,00	7,93
16	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	548,00	6,03
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				537,00
17	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	367,00	367,00
18	59030750	dvířka revizní jednokřídlá plastová 200x300mm	kus	1,000	170,00	170,00
	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				27 276,75
19	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	231,00	462,00
20	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	313,00	313,00
21	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	153,00	459,00
22	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	161,00	322,00
23	725119122	Montáž zařizovacích předmětů	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
24	642311121	We stojel Laufen Baby zadní odpad H8220360000001	kus	1,000	1 034,01	1 034,01
25	55167399	WC průhonky Jika Baby plast bílé H8970373000001	kus	1,000	524,79	524,79
26	64234091	Nádržka na stěnu k WC Laufen H8937110000001	kus	1,000	595,87	595,87
27	64231011	We kombi komplet Jika Neo spodní odpad SIKOS.JNE61395	kus	2,000	2 149,59	4 299,18
28	64211030	Umyvadlo Multi 50x39,5 cm otvor pro baterii uprostřed EUR351	kus	3,000	446,73	1 340,19
29	55145686	Umyvadlová baterie S-Line Pro bez vypusti chrom SIKOBSLPRO271	kus	3,000	470,29	1 410,87
30	55166634	MULTI síťon umyvadlový vtok CR DN40 E957CR	kus	3,000	78,52	235,56
31	55145528	Sprchová baterie S-Line včetně podomítkového tělesa chrom SL210	kus	2,000	736,36	1 472,72
32	55145550	Sprchové rameno Optima na stěnu chrom OPB007	kus	2,000	1 182,65	2 365,30
33	55192950	Hlavová sprcha Siko s tlačítkem bílá/chrom SIKOBSHSP32	kus	2,000	609,17	1 218,34
34	642110R01	Jeans sprchový závěs 180x200cm, polyester	kus	2,000	488,00	976,00
35	642110R02	Teleskopická rozpěrná tyč 120-220cm, 100% ALU, bílá	kus	1,000	240,00	240,00
36	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,006	753,00	4,52
37	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	566,00	3,40
	741	Elektroinstalace - silnoproud				12 500,00
38	741136351	Montáž a úprava el. rozvodů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
39	34826001	světlo LED interiérové stropní IP44	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	766	Konstrukce truhlářské				7 686,25
40	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	787,00	2 361,00
41	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný pině 600x1970-2100mm	kus	3,000	1 164,90	3 494,70

Zpracováno systémem KROS 4

5/7

ČP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena	Celková Cena
42	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	110,00	330,00
43	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	176,00	528,00
44	54914622	Nerazová klika Natural provedení s WC kováníkem KLIKATIPAWC	kus	3,000	301,15	903,45
45	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,043	950,00	40,85
46	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	657,00	28,25
	771	Podlahy z dlaždic				18 829,83
47	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,448	101,00	1 156,25
48	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	11,448	14,70	168,29
49	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,095	54,30	1 471,26
50	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	11,448	273,00	3 125,30
51	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,548	519,00	7 031,41
52	59761011	Dlažba Multi Tahiti světlá šedá 33x33 cm mat DAA3B513.1	m2	15,960	215,00	3 431,40
53	771591184	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	80,000	19,40	1 552,00
54	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	13,548	24,60	333,28
55	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,480	652,00	312,96
56	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,480	516,00	247,68
	781	Dokončovací práce - obklady				96 803,44
57	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	57,200	80,90	4 627,48
58	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	114,400	54,30	6 211,92
59	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	57,200	156,00	8 923,20
60	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,163	409,00	7 837,67
61	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou, stěnou a stěnou	m	31,800	175,00	5 565,00
62	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000	189,00	2 268,00
63	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	8,000	182,00	1 456,00
64	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	57,200	569,00	32 546,80
65	59761026	Obklad Multi Cleopatra tyrkysová lesklá 25x33 cm	m2	43,500	222,60	9 678,75
66	59761026R01	Obklad Multi Cleopatra světlá šedá lesklá 25x33 cm	m2	19,500	222,50	4 338,75
67	781494111	Profily rohové, ukončující, lepené flexibilním lepidlem	m	51,500	72,34	3 725,51
68	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	26,800	44,40	1 189,92
69	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	21,400	46,20	988,68
70	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	17,000	60,50	1 028,50
71	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	5,000	72,60	363,00

Zpracováno systémem KROK 4

6/7

ČP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena	Celková Cena
72	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	3,000	84,70	254,10
73	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	2,000	139,00	278,00
74	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus	120,000	19,40	2 328,00
75	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	57,200	24,60	1 407,12
76	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,530	652,00	997,56
77	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,530	516,00	789,48
	783	Dokončovací práce - nátěry				4 904,42
78	783301401	Ometení s obroušením zámečnických konstrukcí	m2	17,760	35,15	624,26
79	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,760	120,00	2 131,20
80	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,760	121,00	2 148,96
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 110,03
81	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	120,773	34,70	4 190,82
82	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m - odhad	m	70,000	22,00	1 540,00
83	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000	5,62	140,50
84	58124844	fólie pro malířské poleby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	26,250	2,69	70,61
85	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	15,770	7,49	118,12
86	58124844	fólie pro malířské poleby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	16,559	2,69	44,54
87	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	35,90	718,00
88	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	120,773	17,70	2 137,68
89	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra střídně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	120,773	59,20	7 149,76
	M	Práce a dodávky M				1 022,56
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 022,56
90	460941221	Vypínění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	16,600	61,60	1 022,56
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				12 400,00
91	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - neměřitelné práce, spádování podlahy, rovnání stěn pod obklady, zazdění průrazů kanalizace atd	soubor	1,000	12 400,00	12 400,00

