



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele *S-2452/REG/2014*

číslo zhotovitele D50244/INV/2014/015

„Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou “

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing.Zuzanou Moravčíkovou – náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229

jednající: Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva

Jörg Mathew , člen představenstva

Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: CitibankEurope plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby: **“Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou “** podle dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, které byly zhotoviteli poskytnuty jako součást zadávacích podmínek a jsou vypracované projektovou kanceláří Novák & Partner, Perucká 5, Praha 2, 120 00 a v souladu se stavebním povolením, které vydal Městský úřad Benešov, odbor dopravy, silničního hospodářství a dopravně správních agend Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov pod č.j.: MUBN/8896/2010 ze dne 10. 2. 2010, rozhodnutím o prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí pod č.j.: MUBN/30815/2012/OSSU ze dne 15.05.2012. Dílo - stavba **“ Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou “** bude provedena v kvalitě a způsobem podle v tomto odstavci uvedené projektové dokumentace a v rozsahu podle výkazu výměr, které byly zhotoviteli poskytnuty jako součást zadávací dokumentace na předmět plnění v rámci veřejné zakázky s názvem **„Cyklostezka Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou“** dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „dílo“). Dopravní opatření v průběhu stavby si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále se zhotovitel zavazuje ke zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Zhotovitel se rovněž zavazuje ke zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Součástí předmětu díla není zajištění autorského dozoru..

Místem plnění veřejné zakázky je místo výstavby **“ Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou “**, katastrální území Týnec nad Sázavou, Krhanice, Bukovany u Týnce nad Sázavou, Čakovice u Řehenic, okres Benešov, a to v rozsahu dle realizační dokumentace stavby a včetně výkazu výměr uvedené v bodě 1.1 této smlouvy a požadovaného soupisu prací.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


- 1.2. Předmětem díla jsou i práce nespecifikované ve výkazu výměr, popsaném v čl. 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle projektové dokumentace tam uvedené, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (Zhotovitel) měl nebo mohl vědět, že tvoří součást položek výkazu výměr tak, jak je uveden výše. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).
- 1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- 1) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí;
- 2) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem;
- 3) zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
- 4) zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdnych tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdnych tras);
- 5) náklady na objízdne trasy a dopravní značení;
- 6) zabezpečení povolení kácení zeleně;
- 7) vytýčení prostoru staveniště a hranic záboru v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- 8) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 9) vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- 10) zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- 11) zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);
- 12) zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- 13) náklady na případnou likvidaci havárie; opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- 14) náklady na obnovení geodetických bodů;
- 15) náklady na protipožární ochranu;
- 16) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- 17) dodání materiálu a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátu a atestu;
- 18) zhotovení práce podle technologického předpisu;
- 19) veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- 20) zajištění billboardů a pamětních desek;
- 21) zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- 22) zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- 23) průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- 24) odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- 25) zhotovení potřebných provizorních přechodu či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 26) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - 27) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - 28) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - 29) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
 - 30) zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
 - 31) hospodaření s ornici dle vyjádření orgánu ochrany přírody;
 - 32) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - 33) zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
 - 34) pořízení fotodokumentace díla dle čl. I. bodu 1.9. a 1.10. této smlouvy
- 1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.8. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.5.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. této smlouvy v termínu do **7 kalendářních měsíců** ode dne doručení výzvy dle čl. II bodu 2.3. této smlouvy v souladu s Přílohou č. 3 – Finanční a časový harmonogram stavby. Smluvní strany se dále rozhodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději **do 30. 4. 2015** s ohledem na podmínky poskytované dotace.

2.2. Při respektování termínu provedení díla uvedeného v článku II. bodě 2.1. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS) v souladu s čl. IV. odst. 4.10. této smlouvy, kde bude rovněž zahrnuto následující plnění:

- a) geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí
- b) provedení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem
- d) zajištění billboardů a pamětních desek

Vlastní stavbou se rozumí v této smlouvě o dílo stavba **“Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou “** dle realizační dokumentace stavby vč. výkazu výměr.

- 2.3. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem, resp. osobou oprávněnou jednat ve věcech technických, vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 2.4. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v souladu s čl. II bodem 2.3. nejpozději do 1.10.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jednat strana svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do zahájení provádění díla, takové právo jim zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.3., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.6. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. I. bod 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **20 400 000,00 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **4 284 000,00 Kč**.

Celková cena za dílo **včetně DPH činí 24 684 000,00 Kč**.

- 3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v článku III. bodě 3.1. této smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí dle čl. I

bodu 1.5. 1) činí:

cena bez DPH	65 000,00 Kč
DPH	13 650,00 Kč
cena včetně DPH	78 650,00 Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	19 293 847,44 Kč
DPH	4 051 707,96 Kč
cena včetně DPH	23 345 555,40 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních dle čl. I bodu 1.5. 2) činí:

cena bez DPH	103 000,00 Kč
DPH	21 630,00 Kč
cena včetně DPH	124 630,00 Kč

d) za zajištění billboardů a pamětních desek dle čl. I bodu 1.5. 20) činí:

cena bez DPH	70 000,00 Kč
DPH	14 700,00 Kč
cena včetně DPH	84 700,00 Kč

e) za provedení prací a dodávek popsaných v čl. I bodu 1.5. této smlouvy o dílo vyjma bodu 1.5 1), 2) a 20):

cena bez DPH	868 152,56 Kč
DPH	182 312,04 Kč
cena včetně DPH	1 050 464,60 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	20 400 000,00 Kč
	DPH celkem	4 284 000,00 Kč
	Celková cena včetně DPH	24 684 000,00 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této Smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadáání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.

- 3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele jednat ve věcech technických, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce “ **Cyklostezka Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou**“ a číslo smlouvy CES objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. bodu 1.9. a 1.10.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený dle čl. 4.2 a fotodokumentace dle ustanovení čl. I. bodu 1.9. a 1.10. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel tyto platby bude pokazovat pouze na účet uvedený v záhlaví této smlouvy a tento účet musí být registrovaný. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném..
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II. bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 3 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle čl. IV. bodu 4.8. v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

výši dle článku III. bodu 3.2., písmenem a) této smlouvy.

- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle článku III. bodu 3.2., písmenem c) této smlouvy.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. II. bodu 2.3. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Dalšími oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatel“) jsou:

Za Odbor investic Středočeského kraje Mgr. Martin Roztočil, vedoucí odboru

Za Odbor regionálního rozvoje Středočeského kraje Mgr. Pavla Nováková, vedoucí odboru

Oprávnění zástupci objednatel jsou oprávněni jednat za objednatel ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci Objednatele oprávněni činit jménem objednatel právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele : Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Ing. Petr Zach, ředitel provozu Praha a Mosty, tel./fax: 271 085 498/257 406 006, email: petr.zach@hochtief.cz, Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod, tel/fax: 271 085 498/257 406 006, email: vaclav.polak@hochtief.cz

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1. této smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor regionálního rozvoje). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.6. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.6. této Smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. VI. bodu 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. bodě 8.16. této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: “ **Cyklostezka Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou**“ na této stavbě se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 4 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.24. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 25.852.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. VIII. bodu 8.2. této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu této Smlouvy, (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.


10.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. VIII. bodu 8.2.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

doklady popsané v čl. X. bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z čl. I. bodu 1.3., čl. VIII. bodu 8.2., čl. X. bodu 10.1. této Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do **30 dnů** ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do **24 hodin** ode dne jejího ohlášení, do **48 hodin** provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do **20 dnů** ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v čl. XI. bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví – li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. VIII. bodu 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části (oproti harmonogramu dle čl. 4.10.), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této Smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v článku XIII. bodě 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.6., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV. bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.“
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 14.7.2014, č. usnesení 009-22/2014/RK
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr /přikládá uchazeč/
Příloha č. 3: Finanční a časový harmonogram stavby /přikládá uchazeč - tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje,
Vzor propagační tabule /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy /

V Praze dne

V Praze dne **19-09-2014**

Zhotovitel:
HOCHTIEF CZ a.s.

Objednatel:
Středočeský kraj

na základě plné moci:



Ing. Petr Zach

-HOCHTIEF CZ a.s.



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast
investic a veřejných zakázek

ředitel provozu Praha a Mosty



Václav Polák

-HOCHTIEF CZ a.s.

zástupce ředitele provozu pro obchod





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„NÁZEV AKCE“

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina

radní pro oblast financí

(v kopii věcně příslušný odbor dopravy

Krajský úřad)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 001URS - Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	103110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	1 031,85	1 031,85
			Zemní práce				
1			Zemní práce				
2	11201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	M2	30,000	30,00	900,00
3	11201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	30,000	10,00	300,00
4	11201501		Spálení větví	KUS	18,000	100,00	1 800,00
5	112101104		Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	KUS	18,000	750,00	13 500,00
6	112201104		Odstranění pařezů D do 900 mm	KUS	18,000	750,00	13 500,00
7	162301414		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	KUS	18,000	200,00	3 600,00
8	162301424		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	KUS	18,000	100,00	1 800,00
							35 400,00
2			Základy				
9	211571111		Výplň odvodňovacích žaber nebo trativodů šterkopiskem tříděným zásyp studny	M3	3,000	800,00	2 400,00
10	247681114		Těsnění studny z jilu se zhutněním jílové těsnění, tl. 0,25 m ve dně studny	M3	0,300	1 000,00	300,00
							2 700,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	979083117		Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	T	2,410	100,00	241,00
12	979093111		Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	T	2,410	20,00	48,20
13	981511114		Demolice konstrukci objektů z betonu železobetonového postupným rozebíráním odstranění skruží studny	M3	1,000	3 000,00	3 000,00
14	998001123		Přesun hmot pro demolicí objektů v do 21 m	T	5,784	50,00	289,21
							3 578,41
							42 710,26

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013

číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou

číslo a název rozpočtu: SO 101URS - Cyklostezka Greenways (předpoli lávky)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
5	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
			Všeobecné konstrukce a práce				23 000,00
1			Zemní práce				
6	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	108,000	60,00	6 480,00
7	122201402		Výkopávky v zeminu na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 natežení a dovoz chybějící zem.	M3	847,000	50,00	42 350,00
8	122201409		Příplatek za lepivost u výkopávek v zeminu na suchu v hornině tř. 3	M3	550,550	10,00	5 505,50
9	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	64,000	70,00	4 480,00
10	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	956,000	40,00	38 240,00
11	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	6,000	35,00	210,00
12	171101102		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	M3	846,000	78,00	65 988,00
13	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	103,000	10,00	1 030,00
14	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	185,400	50,00	9 270,00
15	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	391,000	20,00	7 820,00
16	182101101		Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	20,000	25,00	500,00
17	182201101		Svahování násypů	M2	440,000	25,00	11 000,00
18	182301122		Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	460,000	40,00	18 400,00
19	183405211		Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	460,000	12,00	5 520,00
20	005724720		osivo směs travní krajinná - rovinná	KG	13,800	100,00	1 380,00
21	184802111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříkem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	460,000	5,00	2 300,00
22	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	1 380,000	2,00	2 760,00
23	185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	10,800	150,00	1 620,00
24	185851111		Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	M3	10,800	150,00	1 620,00
25	081139100		voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	M3	10,800	50,00	540,00
							227 013,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 102URS - Cyklostezka Zbořený Kostelec - Čížov

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
5	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
			Všeobecné konstrukce a práce				55 000,00
1			Zemní práce				
6	11307170		Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	60,000	150,00	9 000,00
7	11307243		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	308,000	90,00	27 720,00
8	113154333		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase s naložením	M2	2 370,000	25,00	59 250,00
9	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	105,000	60,00	6 300,00
10	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	457,000	60,00	27 420,00
11	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	337,500	40,00	13 500,00
12	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	80,000	35,00	2 800,00
13	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	297,500	10,00	2 975,00
14	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	297,500	50,00	14 875,00
15	181101102		Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	448,000	20,00	8 960,00
16	181301102		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	50,000	40,00	2 000,00
17	182201101		Svahování násypů	M2	50,000	25,00	1 250,00
18	183405211		Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	50,000	15,00	750,00
19	005724720		osivo směs travní krajinná - rovinná	KG	1,500	90,00	135,00
20	184802111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	50,000	5,00	250,00
21	185803111		Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	M2	150,000	2,00	300,00
22	185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	2,500	150,00	375,00
23	185851111		Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m	M3	1,500	150,00	225,00

24	081139100		voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	M3	1,500	50,00	75,00
5							
25	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	573,000	110,00	63 030,00
26	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	2 727,000	195,00	531 765,00
27	567522124		Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm do 3000 m2	M2	2 350,000	240,00	564 000,00
			pojivo CA				
28	569731111		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	M2	800,000	75,00	60 000,00
29	569903311		Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	257,000	190,00	48 830,00
30	573111111		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	2 727,000	14,00	38 178,00
			0,5 kg/m3				
31	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	2 627,000	15,00	39 405,00
32	577123121		Asfaltový beton vrstva ohrasná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 627,000	156,00	409 812,00
9							
Ostatní konstrukce a práce							
33	979082213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	400,688	10,00	4 006,88
34	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km do 5km, tj. příplatek 4x	T	1 602,752	5,00	8 013,76
35	979099145		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	400,688	70,00	28 048,16
36	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	952,793	10,00	9 527,93
37	998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	952,792	5,00	4 763,96
54 360,69							
2 042 540,69							

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 103URS - Cyklostezka Brodce – Týnec nad Sázavou

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7		8
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	10 000,00		10 000,00
2	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA pamětní kámen vč. označení stavby	KČ	1,000	15 000,00		15 000,00
3	02939		OSTATNÍ POŽADAVKY cena za pronájem informační cedule stavby min 2x3 m	KUS	2,000	10 000,00		20 000,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	15 000,00		15 000,00
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	10 000,00		10 000,00
6	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	5 000,00		5 000,00
7	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	15 000,00		15 000,00
								90 000,00
1			Zemní práce					
8	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	282,000	50,00		14 100,00
9	113107241		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	M2	282,000	50,00		14 100,00
10	113154123		Frézování živiného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase s naložením	M2	387,000	60,00		23 220,00
11	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	394,000	60,00		23 640,00
12	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	350,000	70,00		24 500,00
13	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	M3	175,000	10,00		1 750,00
14	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	993,000	40,00		39 720,00
15	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	249,000	35,00		8 715,00
16	171101102		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	M3	123,000	80,00		9 840,00
17	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	744,000	10,00		7 440,00
18	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	T	1 339,200	50,00		66 960,00
19	181101102		Úprava pláň v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	M2	2 613,000	18,00		47 034,00
								281 019,00
5			Komunikace					

20	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	1 810,000	110,00	199 100,00
21	564911411		Podklad z asfaltového recykliátu tl 50 mm	M2	1 810,000	85,00	153 850,00
22	569903311		Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	126,000	190,00	23 940,00
23	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	1 915,000	14,00	26 810,00
24	577143121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 915,000	230,00	440 450,00
844 150,00							
Ostatní konstrukce a práce							
25	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	1 510,000	150,00	226 500,00
26	592174900		obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	KUS	1 525,100	90,00	137 259,00
27	919122111		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem zaliti u obrubníků	M	1 510,000	58,00	87 580,00
28	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm proříznutí u obrubníků	M	1 510,000	65,00	98 150,00
29	979082213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	143,442	10,00	1 434,42
30	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km do 5km, tj. příplatek 4x	T	573,768	5,00	2 868,84
31	979099145		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	T	77,180	70,00	5 402,60
32	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 346,550	10,00	13 465,50
33	998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	1 346,536	5,00	6 732,68
579 393,04							
1 794 562,04							

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 151URS - Odpočinkové místo

Poř. č. pol.	Kód položky	Variaanta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	102910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
5	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
			Všeobecné konstrukce a práce				11 000,00
1			Zemní práce				
6	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	M2	100,000	30,00	3 000,00
7	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	100,000	10,00	1 000,00
8	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	15,000	60,00	900,00
9	12202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3	M3	12,500	80,00	1 000,00
10	12202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	M3	6,250	10,00	62,50
11	162601102		Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	47,500	40,00	1 900,00
12	171101102		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	M3	20,000	90,00	1 800,00
13	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	12,500	10,00	125,00
14	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22,500	80,00	1 800,00
15	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	M2	100,000	20,00	2 000,00
							13 587,50
3			Svislé konstrukce				
16	327212345		Oprava zdiva z lomového kamene opěrných zdí do 3 m ³ obkladního	M3	2,000	5 000,00	10 000,00
							10 000,00
5			Komunikace				
17	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	95,000	105,00	9 975,00
18	596211111		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	M2	95,000	150,00	14 250,00

19	592453140	DLAZBA KOSTKA 20X20X6 dlažba Best Korso - nepravidelná skladba	M2	103,000	280,00	28 840,00
53 065,00						
9		Ostatní konstrukce a práce				
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	13,000	180,00	2 340,00
21	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	13,130	90,00	1 181,70
22	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	KUS	3,000	500,00	1 500,00
23	562459999a	ochranná mříž ke stromům kruhová sns 110	KUS	2,000	13 000,00	26 000,00
24	562459999b	Info tabule	KUS	1,000	10 500,00	10 500,00
25	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00
26	562419999	odpadkový koš 70l	KUS	1,000	6 400,00	6 400,00
27	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	KUS	3,000	1 600,00	4 800,00
28	562429999	lavička	KUS	1,000	6 800,00	6 800,00
29	562439999	lavička	KUS	2,000	9 200,00	18 400,00
30	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	KUS	7,000	1 800,00	12 600,00
31	562449999	stojan na kola	KUS	3,000	2 600,00	7 800,00
32	562459999a	stojan na kola	KUS	4,000	3 000,00	12 000,00
33	966049999	Demontáž sloupku vč. uložení na skládku a skládkovného	KUS	3,000	500,00	1 500,00
34	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	57,442	50,00	2 872,09
35	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	T	57,442	25,00	1 436,05
417 329,84						
204 982,34						

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013**
 číslo a název SO: **1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou**
 číslo a název rozpočtu: **SO 161URS - Dopravní značení cyklostezky**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0	102943		Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	500,00	500,00
2	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	500,00	500,00
							1 000,00
9	391411111		Ostatní konstrukce a práce Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu znac dopr	KUS	24,000	360,00	8 640,00
4	404440049		znac dopr	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
5	404441110		znac svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	KUS	4,000	800,00	3 200,00
6	404443240		znac svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm	KUS	19,000	350,00	6 650,00
7	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	12,000	1 100,00	13 200,00
8	404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	12,000	620,00	7 440,00
9	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1,502	100,00	150,21
10	998225195		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	1,502	50,00	75,10
							41 855,31
							42 855,31

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013**
 číslo a název SO: **1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou**
 číslo a název rozpočtu: **SO 162URS - Dopravní značení silnice II/107**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	102943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	500,00	500,00
2	103110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	500,00	500,00
							1 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	91411111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	350,00	1 750,00
4	404440040		značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	KUS	1,000	460,00	460,00
5	404440450		značka dopravní svislá FeZn NK A32a, 700 mm	KUS	4,000	460,00	1 840,00
6	914111121		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000	600,00	1 200,00
7	404440049		znac dopr	KUS	4,000	5 800,00	23 200,00
8	91451111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	9,000	1 100,00	9 900,00
9	404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	9,000	620,00	5 580,00
10	91523112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	M2	83,000	350,00	29 050,00
11	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1,287	100,00	128,71
12	998225195		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	1,287	50,00	64,35
							73 173,06
							74 173,06

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 163URS - Dopravní značení komunikací pro cyklisty

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7		8
0			Všeobecné konstrukce a práce	KČ	1,000	1 000,00		1 000,00
1	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vyracování RDS	KČ	1,000	1 000,00		1 000,00
2	03110		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ					2 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce					
3	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	67,000	350,00		23 450,00
4	404441030		značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	KUS	10,000	500,00		5 000,00
5	404442610		značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	KUS	1,000	2 600,00		2 600,00
6	404443240		značka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm	KUS	49,000	240,00		11 760,00
7	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	11,000	1 100,00		12 100,00
8	404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	11,000	620,00		6 820,00
9	915231112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	M2	110,000	350,00		38 500,00
10	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2,000	800,00		1 600,00
11	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	15,000	230,00		3 450,00
12	966006261		Odstranění zpomalovacího plastového prahu	M	12,000	280,00		3 360,00
13	979084216		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	0,560	100,00		56,00
14	979099199		Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,560	200,00		112,00
15	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1,824	100,00		182,42
16	998225195		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	1,824	50,00		91,20
								108 081,62
								111 081,62

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 181URS - Úpravy stávajících komunikací

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7		8
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	02910		OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	2 000,00		2 000,00
2	02943		OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	4 000,00		4 000,00
3	02944		OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	4 000,00		4 000,00
4	02960		OSTATNI POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	1 000,00		1 000,00
5	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	4 000,00		4 000,00
			Všeobecné konstrukce a práce					15 000,00
1			Zemní práce					
6	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	52,000	60,00		3 120,00
7	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	92,000	80,00		7 360,00
8	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	M3	46,000	10,00		460,00
9	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	137,000	40,00		5 480,00
10	171201201		Uložení sypání na skládky	M3	92,000	10,00		920,00
11	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	T	165,600	50,00		8 280,00
12	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	370,000	20,00		7 400,00
								33 020,00
2			Základy					
13	275311128		Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 zakončení dlažby	M3	0,900	4 000,00		3 600,00
14	275354111		Bednění základových patek - zřízení	M2	6,720	350,00		2 352,00
15	275354211		Bednění základových patek - odstranění	M2	6,720	100,00		672,00
								6 624,00
4			Vodorovné konstrukce					
16	451317799		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm vyztužený KARI sítí	M2	50,000	420,00		21 000,00
								21 000,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 182URS - Rekonstrukce MK Pod Hradištěm

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
5	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
							18 000,00
1			Zemní práce				
6	113154233		Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase s naložením	M2	945,000	45,00	42 525,00
							42 525,00
5			Komunikace				
7	57321111		Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 0,3 kg/m3	M2	945,000	14,00	13 230,00
8	577143121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	945,000	230,00	217 350,00
							230 580,00
8			Potrubi				
9	89933111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	5,000	1 200,00	6 000,00
							6 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	91912211		Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem zaliti u obrubníků	M	315,000	58,00	18 270,00
11	919735112		Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm profiznutí u obrubníků	M	315,000	65,00	20 475,00
12	979084216		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	T	120,960	40,00	4 838,40

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 201URS - Lávka přes Sázavu

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
2	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA pamětní kámen vč. označení stavby	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
3	02939		OSTATNÍ POŽADAVKY cena za pronájem informační cedule stavby min 2x3 m	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	580 000,00	580 000,00
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	55 000,00	55 000,00
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hl. prohlídka mostu	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
8	02960.1	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor zodpovědného geologa	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
9	02960.2	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
10	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00
11	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
12	0379		INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE	SOUB	1,000	20 000,00	20 000,00
			Všeobecné konstrukce a práce				870 000,00
1			Zemní práce				
13	115101202		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	HOD	1 440,000	30,00	43 200,00
14	122201401		Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	M3	24,856	55,00	1 367,08
15	122201409		Příplatek za lepivost u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 3	M3	12,428	10,00	124,28
16	131201102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	297,480	90,00	26 773,20
17	131201109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	148,740	10,00	1 487,40
18	15171111		Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	120,000	900,00	108 000,00
19	151713111		Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporů do 8 m	KUS	6,000	5 000,00	30 000,00
20	151713112		Odstranění vrchního kotvení zápor při délce záporů do 8 m	KUS	6,000	2 000,00	12 000,00
21	151721112		Zřízení pažení do ocelových zápor hl vykopu do 10 m s jeho následným odstraněním	M2	178,000	300,00	53 400,00

47	334323999	Mostní pilíře a sloupy z oceli pylon, vč. spojovacího materiálu	T	22,864	52 000,00	1 188 928,00
48	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	242,200	480,00	116 256,00
49	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	242,200	80,00	19 376,00
50	334353112	Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - zřízení	M2	150,200	500,00	75 100,00
51	334353212	Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek - odstranění	M2	150,200	90,00	13 518,00
52	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 140 kg/m ³	T	21,627	20 000,00	432 540,00
53	334361236	Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505 180 kg/m ³	T	13,035	20 000,00	260 700,00
84	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek zábradlí výšky 1,30m na předmostích	M	28,000	2 200,00	61 600,00
4.15 Konstrukce						
4						
Vodorovné konstrukce						
54	421959999	Dřevěná mostovka vč. spojovacího materiálu	M3	117,106	32 450,00	3 800 089,70
55	423901121	Rektifikace mostní konstrukce - hydraulické zvedáky zatížení do 250 kN	KUS	52,000	1 500,00	78 000,00
56	423905199	Rektifikace lan a závěsů	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
57	428941199	Osazení mostního ložiska zatížení do 2500 kN	KUS	8,000	1 250,00	10 000,00
58	4289499	Dodání ocel. ložiska	KUS	8,000	4 000,00	32 000,00
59	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	104,760	280,00	29 332,80
60	451351111	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zřízení	M2	6,690	440,00	2 943,60
61	451351211	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstranění	M2	6,690	80,00	535,20
62	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopisků tl do 200 mm	M2	133,600	170,00	22 712,00
63	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30	M2	133,600	950,00	126 920,00
4.16 Izolace						
7						
Přidružená stavební výroba						
64	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	M2	30,000	10,00	300,00
65	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal 9 kg	T	0,023	35 000,00	805,00
66	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	M2	72,900	12,00	874,80
67	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal 9 kg	T	0,062	35 000,00	2 170,00
68	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	M2	60,000	10,00	600,00
69	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	T	0,090	35 000,00	3 150,00
70	71122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	M2	145,800	12,00	1 749,60
4.17 Úprava povrchů						
4 162 533,30						

71	111631500	1	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	T	0,248	35 000,00	8 680,00
9							
Ostatní konstrukce a práce							
72	931941211		Dilatační mostní závěr flexibilní s elastickou výplní a krycím plechem	M3	0,250	100 000,00	25 000,00
73	933902031		Zatěžovací zkoušky statické prvního rámového nebo zavěšeného mostního pole rozpětí do 50 m	KUS	1,000	50 000,00	50 000,00
74	933902032		Zatěžovací zkoušky statické druhého a třetího rámového nebo zavěšeného mostního pole rozpětí do 50 m	KUS	2,000	20 000,00	40 000,00
75	933902098		Zatěžovací zkoušky dynamické prvního rámového nebo zavěšeného mostního pole rozpětí do 50 m	KUS	1,000	140 000,00	140 000,00
76	933902099		Zatěžovací zkoušky dynamické druhého a třetího rámového nebo zavěšeného mostního pole rozpětí do 50 m	KUS	2,000	30 000,00	60 000,00
77	936172197		Osazení a dodání doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli zavětrování, vč. spojovacího materiálu	T	3,230	76 000,00	245 480,00
78	936172198.1	a	Osazení a dodání doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli ocelové táhlo M20 vč. PKO a komponentů	M	230,000	1 000,00	230 000,00
79	936172198.2	b	Osazení a dodání doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli ocelové táhlo M64 vč. PKO a komponentů	M	285,000	5 600,00	1 596 000,00
80	936172199		Osazení a dodání doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli dynam. tlumiče, vč. zkoušení a rektifikace	KPL	4,000	100 000,00	400 000,00
85	936172999		Osazení a dodání doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli madlo na zábradlí vč. ukotvení	KG	2 600,000	78,00	202 800,00
81	998003111		Přesun hmot pro piloty, kůly, jeřáby a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	T	26,610	20,00	532,20
82	998004011		Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	T	43,180	20,00	863,60
83	998218111		Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m vč. ocelových prvků	T	2 158,480	20,00	43 169,60
							3 033 845,40
							14 541 895,66

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013
 číslo a název SO: 1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
 číslo a název rozpočtu: SO 421URS - Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
2	02944		OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování DSPS, geometrické plány, věcná břemena	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
3	029522		OSTATNÍ POZADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	15,000	450,00	6 750,00
4	02960		OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
5	029612		OSTATNÍ POZADAVKY - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE	HOD	24,000	450,00	10 800,00
6	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
							44 550,00
1			Zemní práce				
7	131201101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	1,500	420,00	630,00
8	131201109		hloubení jámy pro osvětlovací stožáry, odvoz přebyteč. zeminy	M3	1,500	10,00	15,00
9	132101101		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	18,900	280,00	5 292,00
10	162601102		Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	M3			
11	171201201		výkop rýhy-90m,350x600 mm	M3	20,400	50,00	1 020,00
12	171201211		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	20,400	20,00	408,00
			Uložení sypaniny na skládky	T	36,720	80,00	2 937,60
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				10 302,60
3			Svislé konstrukce				
13	388995297	a	Chránička kabelů HFGPAVO TR 1236	M	140,000	130,00	18 200,00
14	388995298	b	Chránička kabelů HFGPAVO TR 1229	M	75,000	130,00	9 750,00
15	388995299	c	Chránička kabelů HFGPAVO TR 1213	M	18,000	130,00	2 340,00
							30 290,00
7			Přidružená stavební výroba				
16	741113110		Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	KUS	3,000	1 850,00	5 550,00


17	316722220				STOZAR MESTSKÉHO OSVETLENÍ L8 1M					27 300,00
18	741119999				Kabelové přechody rezerva					1 110,00
19	743611111				Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu					27 000,00
20	743619999				Uzemňovací připojení					4 800,00
21	743642100				Montáž tvč zemnicí délky do 2 m					960,00
22	744431400				Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uloženy volně kabel CYKY 3x2,5					4 160,00
23	744431800				Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 10,00 kg uloženy volně kabel CYKY 4x10					11 040,00
24	746421122				Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil KSM 35 jednoduchý nástavec					10 500,00
25	748132998				Svitidla zářivková Z1/70W					12 600,00
26	748132999				Svitidla speciální Medio 50W vč. upevnění					13 500,00
					CELKOVÝ součet včetně výroby					118 520,00
					CELKOVÝ součet					203 662,60

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou_11_2013**
 číslo a název SO: **1 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou**
 číslo a název rozpočtu: **SO 811URS - Vegetační úpravy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0	102943		Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
2	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
							2 000,00
1			Zemní práce				
3	183101313		Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	140,000	35,00	4 900,00
4	183205111		Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	M2	113,000	15,00	1 695,00
5	183405211		Výsev trávniku hydroosevem na ornici	M2	289,000	15,00	4 335,00
6	005724720		osivo směs travní krajinná - rovinná	KG	8,670	100,00	867,00
7	184102113		Výsadba dřeviny s bařem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	140,000	60,00	8 400,00
8	184801121		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	140,000	25,00	3 500,00
9	184802611		Chemické odplevelení po založení kultury posířkem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	289,000	3,00	867,00
10	184921093		Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	113,000	90,00	10 170,00
11	185803111		Ošetření trávniku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	M2	289,000	2,00	578,00
12	185804312		Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	8,670	150,00	1 300,50
13	185851111		Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	M3	8,670	150,00	1 300,50
14	081139100		voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	M3	8,670	50,00	433,50
							38 346,50
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	T	9,708	400,00	3 883,24
							3 883,24
							44 229,74

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VII 2014 30. 7.	VIII 2014 14.21.28. 4. 11.18.25. 1. 8. 15.22.29. 6. 13.20.27. 3. 10.17.24. 1. 8. 15.22.29. 5. 12.	IX 2014	X 2014	XI 2014	XII 2014	I 2015
1	Cyklostezka Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou	170 dny	14.7. 14	30.12. 14							
2	Předání staveniště	0 dny	14.7. 14	14.7. 14	14.7.						
3	SO 001 Příprava území	5 dny	14.7. 14	18.7. 14							
4	SO 101 Cyklostezka Greenways	75 dny	2.9. 14	15.11. 14							
5	SO 102 Cyklostezka Zbořený Kostelec - Čížov	90 dny	13.8. 14	10.11. 14							
6	SO 103 Cyklostezka Brodce – Týnec nad Sázavou	90 dny	13.8. 14	10.11. 14							
7	SO 151 Odpočinkové místo	15 dny	11.11. 14	25.11. 14							
8	SO 161 Dopravní značení cyklostezky	10 dny	16.11. 14	25.11. 14							
9	SO 162 Dopravní značení silnice II/107	15 dny	16.11. 14	30.11. 14							
10	SO 163 Dopravní značení komunikací pro cyklisty	30 dny	11.11. 14	10.12. 14							
11	SO 181 Úpravy stávajících komunikací	25 dny	16.11. 14	10.12. 14							
12	SO 182 Rekonstrukce MK Pod Hradištěm	50 dny	22.10. 14	10.12. 14							
13	SO 201 Lávka přes Sázavu	135 dny	19.7. 14	30.11. 14							
14	SO 421 Veřejné osvětlení	15 dny	1.12. 14	15.12. 14							
15	SO 811 Vegetační úpravy	10 dny	21.11. 14	30.11. 14							
16	Předání dokončeného díla	0 dny	30.12. 14	30.12. 14							30.12.

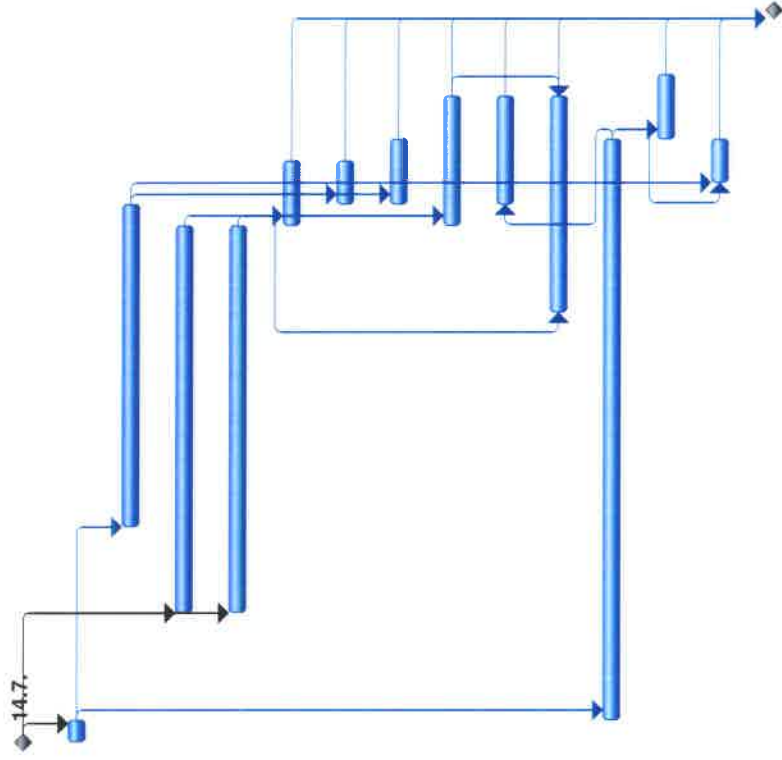

Finanční harmonogram


"Cyklostezka Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou"

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 000
Fax: +420 257 406 008
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz


07/2014	1 210 131,93
08/2014	2 919 558,39
09/2014	4 860 422,48
10/2014	6 383 618,11
11/2014	4 145 664,59
12/2014	880 604,50
Celkem bez DPH	20 400 000,00

V Praze, dne 11. 6. 2014

na základě plné moci:




Ing. Petr Začh
HOCHTIEF CZ a. s.,
ředitel provozu Praha a Mosty


Václav Polák
HOCHTIEF CZ a. s.,
zástupce vedoucího provozu pro obchod




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 4

Vzor billboardu umístěného v průběhu stavby:

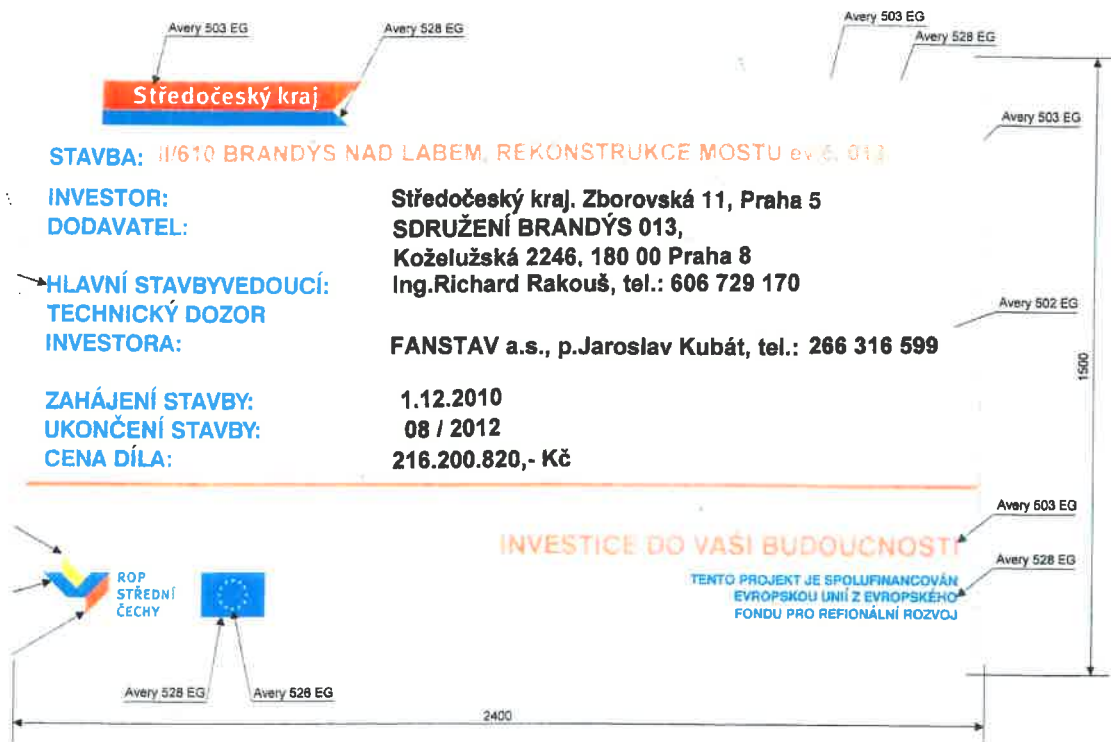

Vzor omluvné tabulky umístěné v průběhu stavby:

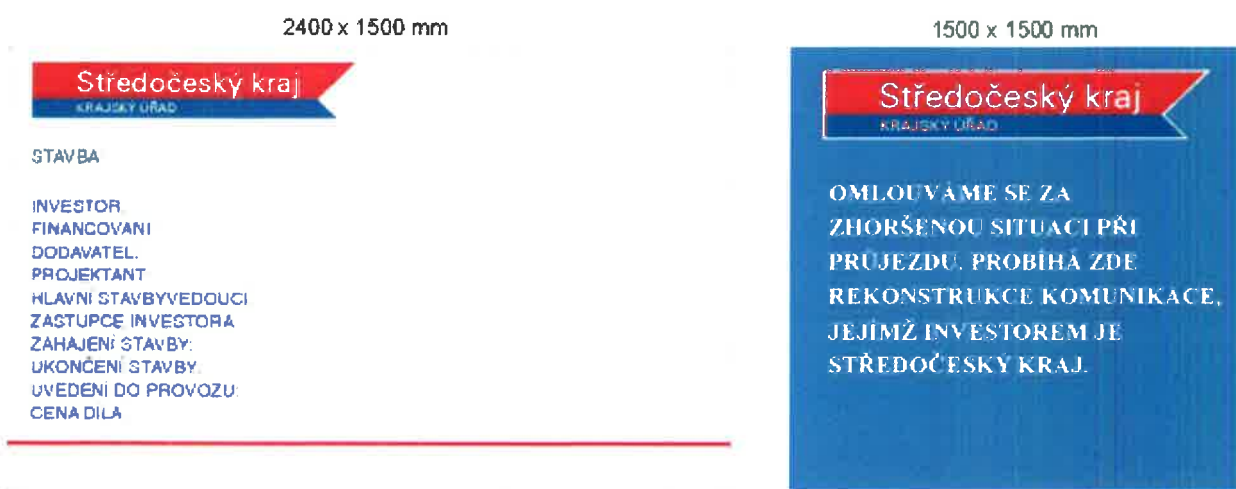



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Vzor pamětní tabulky umístěné po dokončení stavby:

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



EXPERTING, spol. s r. o.
Antala Staška 34
140 00 PRAHA 4, Česká republika
obchodní rejstřík Praha, oddíl C, vložka 20082

IČ: 49 35 84 81
Tel.: 26 12 12 980
Fax: 26 12 12 981
E-mail: praha@experting.cz

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

číslo EG – 070 ODP/ 2014

Pojistník: **HOCHTIEF CZ a. s.**
150 00 Praha 5, Plzeňská 16/3217, Česká republika, IČ: 46 67 84 68
obchodní rejstřík Praha, oddíl B, vložka 6229

Pojistná smlouva číslo: **2937199194**

Pojistitelé: **Generali Pojišťovna a.s.**
120 84 Praha 2, Bělehradská 132, Česká republika, IČ: 618 59 869
obchodní rejstřík Praha, oddíl B, vložka 2866 (jako vedoucí pojistitel)

a
Česká Pojišťovna a.s.
113 04 Praha 1, Spálená 75/16, Česká republika, IČ: 452 72 956
obchodní rejstřík Praha, oddíl B, vložka 1464 (jako pojistitel)

Potvrzujeme, že pojistník má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, kterou je dle smluvních ujednání od 01.01.2014 do 31.12.2014 pojištěna:

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistná smlouva se vztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z provozní činnosti (vč. stavebně montážní činnosti) a na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem (vč. vadné práce po jejím předání) třetí osobě na životě, zdraví nebo věci, vč. finančních škod a čistých finančních škod. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na celý svět mimo území USA a Kanady.

Rozsah pojištění a limity plnění	Limit plnění
a) pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem	4 000 000 EUR/108 000 000 Kč
b) čisté finanční škody (roční agregát)	4 000 000 EUR/108 000 000 Kč
c) křížová odpovědnost	4 000 000 EUR/108 000 000 Kč
d) věci třetích osob	4 000 000 EUR/108 000 000 Kč

Spoluúčast

a) škody na majetku	100 000 Kč
b) škody na životě a zdraví	bez spoluúčasti
c) čisté finanční škody	10%

Pojištěný je ten na jehož odpovědnost se pojištění vztahuje. Pro účely tohoto pojištění je pojištěným: **pojistník a jeho dceřiné společnosti**; pro stavebně montážní pojištění jsou pojištěnými také **investor/objednatel (zadavatelé), subdodavatelé, architekti, projektanti, konzultanti a další strany** s pojištěným zájmem a se souhlasem pojistníka.



V Praze dne 9.ledna 2014

Daniel Pěnička
ředitel
