



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
(č. smlouvy objednatele: S-0789/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: [.....])

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: **M + M: RS PP Středočeský kraj**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000


zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem společnosti a Ing. Janem Loškem, Ph.D.,
jednatelem společnosti

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Mgr. Kateřina Vokalová, 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: czech@mottmac.com

tel.: 

ID: qwents7

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitelem – Členem sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-5573340267/0100

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-5570440297/0100

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace mostu ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 u obce Zápy v rozsahu zpracování, kdy bude přednostně zpracován diagnostický průzkum, na jehož základě bude stanoven další postup:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 290.000,- Kč
DPH: 60.900,- Kč
včetně DPH: 350.900,- Kč

c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 385.000,- Kč
DPH: 80.850,- Kč
včetně DPH: 465.850,- Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 190.000,- Kč
DPH: 39.900,- Kč
včetně DPH: 229.900,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 140.000,- Kč
DPH: 29.400,- Kč
včetně DPH: 169.400,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 240.000,- Kč
DPH: 50.400,- Kč
včetně DPH: 290.400,- Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb



Celkem bez DPH: 1.419.300,- Kč

DPH: 298.053,- Kč

Celkem vč. DPH: 1.717.353,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj



Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace;
 2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 19-04-2018

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



MVDr.

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 884/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48587733
DIČ: CZ48588733

MOTT
MACDONALD

Podpis:

Ing. Raňko Bucek, Ph.D., jednatel

Podpis:


atel



řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.

Technická specifikace

Název akce: „III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy.“

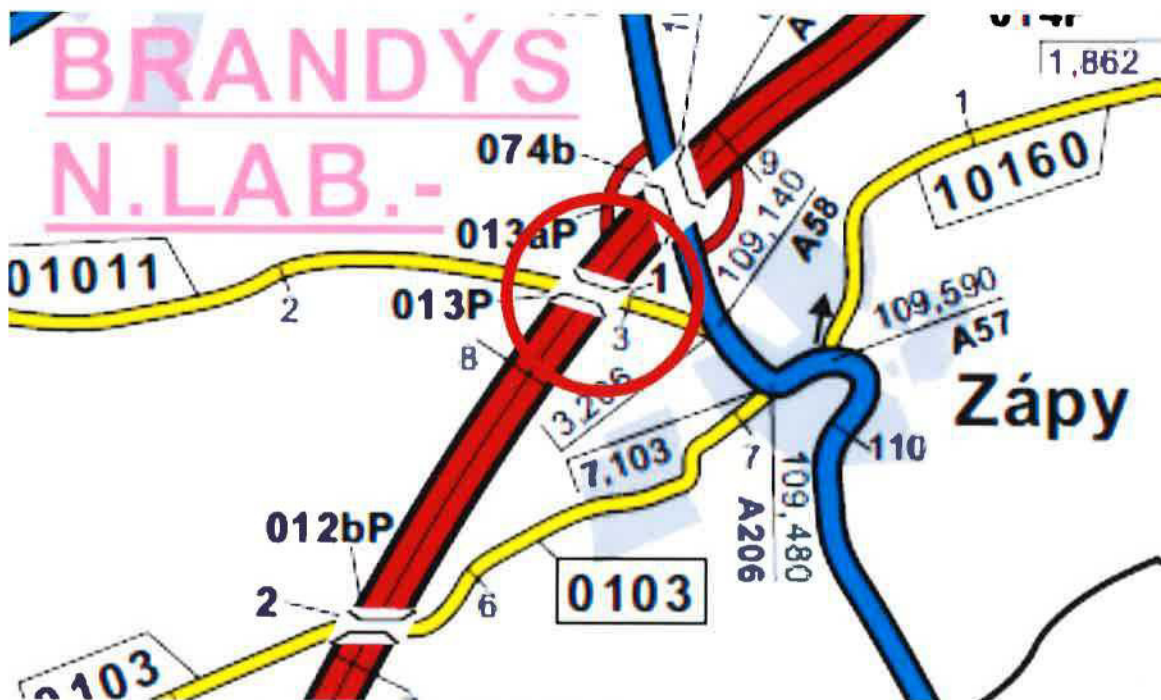

Staničení provozní v km : 2,853, CMS: Mochov

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o šikmou nosnou konstrukci o čtyřech polích s rozpětími 11,40+17,40+17,40+11,40 m tvořenou předpjatými betonovými prefabrikovanými nosníky KA - 73 dl. 18 m, které jsou zkrácené v 1. a 4. poli. V příčném směru 9 nosníků tvoří tzv. žaluziovou desku. U koncových příčníků je beton povrchově až hloubkově degradován - lokálně je obnažena výztuž. Do nosné konstrukce zatéká, v dutině pravého krajního nosníku v 1. poli zjištěna stojící voda. Spáry mezi nosníky (zejména 2-3 krajní spáry) jsou proteklé s výluhy a krápníčky. Rovněž do některých nosníků zatéká o čem svědčí výluhy v okolí otvoru odvodnění dutiny nosníků. Na spodním líci nosníků jsou odhalené podkladní pruty výztuže, které korodují. Lokálně na některých nosnicích jsou patrné podélné trhliny pravděpodobně sledující směr předpínacích kabelů. Nekvalitně provedené dobetonávky mezi nosníky. Ve 4 poli nad OP5 jsou v podhledu mokré nosníky v celé ploše. V bočních plochách krajních nosníků četné projevy zatékání pod římsami. Spodní stavba - Členěné pilíře ze železobetonu B 250 a B 400 - dvě stojky kruhového průřezu vycházející ze společného základu, vetknuté do stativa. Celkem 3 ks vnitřních podpěr. Na stativa pilířů zatéká zejména přes příčné spáry mezi nosníky - nejvíce mezi krajními. Na pohledových plochách jsou četné výluhy. Zejména na krajních nechráněných částech dochází k degradaci betonu a obnaženy jsou pruty korodující výztuže. V podhledu stativ mezi stojkami jsou obnaženy pruty distanční výztuže. U stojek pilířů jsou ve spodních částech lokálně patrné svislé trhliny v místě výztuže i v provedeném ochranném nátěru (proti vylepování plakátů).

Stavební stav NK- IV. uspokojivý, SS – V. špatný, III - Podmíněně použitelný

Výčet požadovaných oprav: Zahájit přípravu rekonstrukce mostu na základě provedeného diagnostického průzkumu a PD. V rámci rekonstrukce provést minimálně

výměnu izolace NK, mostního svršku a vybavení a sanaci NK a SS. Případnou variantu novostavby musí potvrdit zmiňovaný diagnostický průzkum. Objekt musí mít dostatečné šířkové uspořádání vzhledem k převáděné komunikaci, normový záchytný systém a plnou zatížitelnost.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné provizorní přeložky (v průběhu přípravy PD budou projednány možnosti trvalého vymístění sítí nebo uložení zpět do mostního objektu), inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné záборы všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP.

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky včetně uložení do BMS.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: 22 407 tis.Kč bez DPH, 27 112,47 tis. Kč s DPH. Financování stavby předpokládáno z prostředků IROP.

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- SO 000 - DIO
- SO 001 - DEMOLICE
- SO 181 - KOMUNIKACE
- SO 240 - MOSTNÍ OBJEKT
- Přeložky inženýrských sítí dle zjištění

4. Územně-technické podmínky

- Demolice a výstavba se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Most převádí komunikaci III/01011 přes D10 – bude projednáno DIO s ŘSD ČR dle etap výstavby.

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace:

- **Předpokládaná doba výstavby: 9 měsíců**
- **Stavba (AD): předpoklad zahájení v r. 2019**

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: jan.bocek@ksus.cz

Vladimír Buchar, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě MH, mobil 736 623 713 , e-mail: vladimir.buchar@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jan Boček

Datum : 24.10.2017

Fotodokumentace





Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ – PD

žluté - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
22,407,000	1.294%	0.625%	1.718%	1.071%	0.848%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	249	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	300,000	150,000	400,000	255,800	200,000	175,200	1,481,000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	290,000	140,000	385,000	240,000	190,000	174,300	1,419,300
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	96.67%	93.33%	96.25%	93.82%	95.00%	99.49%	95.83%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze

Mott
Ing. P.Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48508733
DIČ: CZ435886733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

„III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí
Zápy“ – PD

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	30.000,00
Předběžný GTP dle TP 76	20.000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	30.000,00
Průzkumy DUR celkem	80.000,00
DUR	
Průvodní zpráva	50.000,00
Výkresová část	130.000,00
Dokladová část	30.000,00
DUR celkem	210.000,00
DUR celkem včetně průzkumů	290.000,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	60.000,00
Podrobný GTP dle TP 76	40.000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	20.000,00
Průzkumy DSP celkem	120.000,00
DSP	
Průvodní zpráva	50.000,00
Souhrnné technické řešení	50.000,00
Stavební část	125.000,00
DIO	15.000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15.000,00
BOZP	10.000,00
DSP celkem	265.000,00
DSP celkem včetně průzkumů	385.000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	70.000,00
majetkoprávní podklady	40.000,00
podání žádosti bez poplatků	30.000,00
IČ celkem	140.000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	95.000,00
majetkoprávní podklady	115.000,00
podání žádosti bez poplatků	30.000,00
IČ celkem	240.000,00
PDPS	
Technická zpráva	50.000,00
Výkresová část	100.000,00
ZTKP	20.000,00
Soupis prací a rozpočet	20.000,00
PDPS celkem	190.000,00
celkem bez DPH	1.245.000,00

V Praze



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Rádka Bucek, jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel



MOTT
MACDONALD

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 93/115, 110 00 Praha 1
IČ: 48548733
DIČ: CZ48548733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48		33,600
Cena AD celkem bez DPH	201	700	140,700
Celkem	249		174,300

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	35
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	21
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> účasti kontrolních dnech stavby účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	80
celkem hodin	201
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	140,700

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze, c



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mvstmac.com



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jah Loško, Ph.D., jednatel
