




PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)


K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1761/DOP/2017 , č. smlouvy zhotovitele: 17NO01003)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**
zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849
další společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice **II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - PD** v rozsahu zpracování:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

| | |
|-------------|-------------|
| bez DPH: | 399 000,-Kč |
| DPH: | 83 790,-Kč |
| včetně DPH: | 482 790,-Kč |

- b. Dokumentace ke stavebnímu povolení

| | |
|-------------|-------------|
| bez DPH: | 799 400,-Kč |
| DPH: | 167 874,-Kč |
| včetně DPH: | 967 274,-Kč |

- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby

| | |
|-------------|-------------|
| bez DPH: | 199 500,-Kč |
| DPH: | 41 895,-Kč |
| včetně DPH: | 241 395,-Kč |

- d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

| | |
|-------------|-------------|
| bez DPH: | 91 000,-Kč |
| DPH: | 19 110,-Kč |
| včetně DPH: | 110 110,-Kč |

- e. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

| | |
|-------------|-------------|
| bez DPH: | 241 500,-Kč |
| DPH: | 50 715,-Kč |
| včetně DPH: | 292 215,-Kč |

- f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

| | |
|-------------|---|
| bez DPH: | 490,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb |
| DPH: | 102,90 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb |
| včetně DPH: | 592,90 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb |

| | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 830 360,00 Kč | (předp. rozsah TP 204 hod) |
| DPH | 384 375,60 Kč | |
| Cena celkem vč. DPH | 2 214 735,60 Kč | |

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: ales.cermak@ksus.cz.
5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od objednání

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj



Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace;
 2. Soupis služeb;
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 23-08-2017

V Praze dne 11.8.2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Podpis: _____

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Sdružení NOVA**
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Podpis: _____

ing. František
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák **Partner** | 02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Převrsta 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ: 46535955, diČ: CZ48585955




Technická specifikace

Název akce : II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - PD

Místo realizace akce: silnice II/322 Kolín od křižovatky s II/125 včetně všech větví –konec Kolína, včetně návrhu opravy mostů ev.č. 125-035.1, 125-035.2 a 322-002, vyprojektování okružní křižovatky II/322 x ul. Tovární, K Vinici, s min. vnějším prstencem 25 m.

Staničení: cca 1,366 – 3,042 km

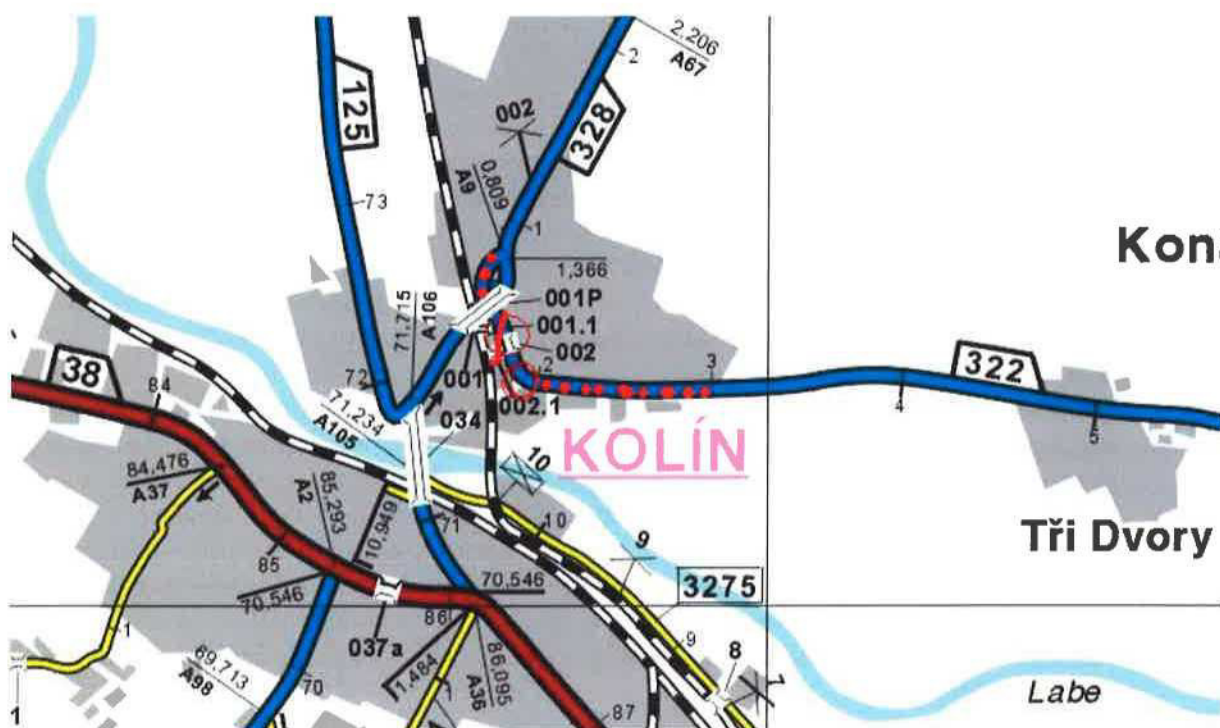

Základní popis akce:

Provedení diagnostiky vozovky, mostů a PD (vč. případné opravy objízdných tras) zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DUR, DSP, PDPS, AD a výkon IČ k UR a SP včetně majetkoprávní přípravy, koordinace s Městem Kolín (Bc. Jan Kokeš, 702 186 038, jan.kokes@mukolin.cz) a správci sítí (rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Třídvorská).

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DUR, DSP a PDPS.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, soliterních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.



- b) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zpracována tak, aby byl minimalizován zábor pozemků.
- c) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele
- d) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**zákon o VZ**“) a vyhláškou č. vyhláškou 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**vyhláška o předmětu stavebních prací**“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
- e) Výkon IČ k ÚR
Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.
- f) Výkon IČ k SP
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě ne zahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.
- e) Výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).

Součástí prací je oprava/rekonstrukce všech propustků a mostů na trase.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či



darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Technologie obnovy povrchu a konstrukčních vrstev silnice PD:

Vypracování projektové dokumentace na opravu mostů ev.č. 125-035.1, 125-035.2 a 322-002 a rekonstrukci vozovky. PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a na základě výsledků diagnostiky vozovky a mostů. Zajištění autorského dozoru, právoplatného územního rozhodnutí a právoplatného stavebního povolení.

Na základě výsledků diagnostiky a PD provedení navržené technologie obnovy/rekonstrukce povrchu vozovky v délce 1680 m + odpojovací větev 130 m + přípojovací větev 250 m dle PD, v proměnné šířce 7,5 - 17 m, staničení 1,366 – 3,042 km. Obnova popř. doplnění odvodňovacího systému. Návrh oprav mostů ev.č. 125-035.1, 125-035.2 a 322-002, projektování PD na okružní křižovatku ul. Třídvorská x ul. Tovární, K Vinici, VDZ, prověření stavu inženýrských sítí – projednání se správcem a majiteli jejich eventuelní rekonstrukce (přeložky), koordinace s Městem Kolín – zapracování cyklotrasy (stezky).

Neurčí-li diagnostika mostů jiné řešení, bude provedena oprava zábradlí – demontáž, PKO, úprava kotvení, výměna živičného povrchu včetně oprav dilatací a zálivek u řím a chodníků, opravy svahování u opěr (nejlépe LK do betonu), opravy odvodnění (pokročilá koroze a degradace), sanace trhlin a místy odpadávajícího betonu v podhledu NK a následná oprava sjednocujícím ochranným nátěrem NK. Jedná se o mosty ev.č. 125-035.1, 125-035.2 a 322-002 na nájezdových větvích. Podrobnější rozsah opravy mostů bude stanoven na základě zpracované diagnostiky.

Neurčí-li diagnostika vozovky jiné řešení, bude provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev, sanace vozovky, spojovací postřik, pokládka ložné a obrusné vrstvy (v celém úseku s protihlukovými vlastnostmi), seřiznutí a dosypání krajnic se zhutněním. Výšková úprava znaků inženýrských sítí (případná výměna poškozených), výměna (přerovnění) obrub a vodícího proužku, zajištění odvodnění v celém úseku, pročištění a obnovení příkopů, výměna a doplnění svodidel, zajištění a realizace DIO, konzultace se správcem sítí a vlastníky přípojek – prověření jejich stavebního stavu a příp. přeložky, koordinace – spolupráce s Městem Kolín na případném zapracování cyklotrasy (stezky) v souběhu s II/322. Vybudování okružní křižovatky s min. vnějším průměrem 25 m.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VDZ v plastu, pročištění nebo obnovení odvodnění, osazena veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky...), vyrovnaní inženýrských uzávěrů .

Celý úsek vykazuje závady prasklin, mozaikových trhlin, výtluky, místy projeté koleje, časté propady vozovky vlivem havarijního stavu inž. sítí, příčné nerovnosti.

Zdůvodnění záměru akce : Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, mostů a inž. sítí. Zejména nebezpečné a nepřehledné místo křižovatky ul. Třídvorská x ul. Tovární a K Vinici, jak pro silniční tak i pěší provoz na této komunikaci. Navržené úpravy byly projednány na místním šetření dne 2.10.2012.

Předpokládané termíny plnění:

PD: 11/2016 až 11/2017

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kontakt : Oblast Kutná Hora

Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil 724 706 242, e-mail: petr.holan@ksus.cz

Ján Kukura, investiční technik DOSS oblast Kutná Hora, 606 059 214, jan.kukura@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

AKCE

II/322 Kolín, ul. Třídvořská, okružní křižovatka - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH****) |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| 35 000 000 | 1,140% | 0,260% | 2,284% | 0,690% | 0,570% | 490 | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | x | x | x | x | x | 204 | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***) | 400 000 | 100 000 | 800 000 | 327 000 | 200 000 | 163 000 | 1 990 000 |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH | 399 000 | 91 000 | 799 400 | 241 500 | 199 500 | 99 960 | 1 830 360 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | 99,75% | 91,00% | 99,93% | 73,85% | 99,75% | 61,33% | 91,98% |

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

| | |
|--|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl: | Ok |

V Praze dne 11.8.2017

Ing. František Hanuš, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Novák & Partner

02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585955, diČ CZ48585955

**II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - PD
II. a III. etapa**

| žlutě ocenění uchazeč | |
|--|------------------------------|
| popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč |
| Průzkumy a podklady | |
| Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření | 60 000,00 |
| Diagnostika vozovky | 80 000,00 |
| Digitální katastrální mapa | 5 000,00 |
| Místí šetření | 5 000,00 |
| Průzkumy celkem | 150 000,00 |
| DÚR | |
| Průvodní zpráva | 29 000,00 |
| Výkresová část | 190 000,00 |
| Dokladová část | 30 000,00 |
| DÚR celkem | 249 000,00 |
| DUR celkem včetně průzkumů | 399 000,00 |
| DSP | |
| Průzkumy pro DSP (diagnostika, doměření, apod.) | 30 000,00 |
| Průvodní zpráva | 20 000,00 |
| Souhrnné technické řešení | 105 000,00 |
| Stavební část | 590 000,00 |
| DIO | 30 000,00 |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady, doplňující průzkumy | 15 000,00 |
| BOZP | 9 400,00 |
| DSP celkem | 799 400,00 |
| IČ-zajištění vydání ÚR | |
| projednání dokumentace | 66 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 5 000,00 |
| podání žádosti bez poplatků | 20 000,00 |
| IČ celkem | 91 000,00 |
| IČ-zajištění vydání SP | |
| projednání dokumentace | 171 500,00 |
| majetkoprávní podklady | 50 000,00 |
| podání žádosti bez poplatků | 20 000,00 |
| IČ celkem | 241 500,00 |
| PDPS | |
| Technická zpráva | 10 000,00 |
| Výkresová část | 105 000,00 |
| ZTKP | 4 500,00 |
| Soupis prací a rozpočet | 90 000,00 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| PDPS celkem | 199 500,00 |
| | |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| celkem bez DPH | 1 730 400,00 |
|-----------------------|---------------------|

V Praze dne 11.8.2017



Ing. Fr... el
osoby oprávněné podepisovat nabidku
Podpis

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Porucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585955, diČ CZ48585955

02

kp.

Autorský dozor

II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - PD

| | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|---|------------|------------|---------------|
| Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby | 48 | 490 | 23 520 |
| Cena AD celkem bez DPH | 156 | | 76 440 |

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při výkonu AD | AD hodin |
|---|---------------|
| činnost | |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | 18 |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | 28 |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | 30 |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | 20 |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | 20 |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | 40 |
| celkem hodin | 156 |
| Kč/hod | 490 |
| Celkem Kč bez DPH | 76 440 |

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 11.8.2017

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Porucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585955, diČ CZ48585955

Ing. František
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Předspis

Pa

Kp.

