



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

č. smlouvy objednatele: S-0984/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 3139/08

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu 4440009090/6000  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC**  
zastoupenou správcem společnosti: **Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.**  
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 1700305424/0600  
IČ: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 31260  
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

### společníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:

#### **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 2994

#### **TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 9396

*Handwritten signature*



## GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### Prováděcí smlouvu

#### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- **ETAPA – úsek od kř. III/1108 Choratice , km 22,458 – konec obce Dojetřice km cca 25,750 .**  
Celková délka úseku 3292 m
  - V tomto úseku bude provedena celková rekonstrukce vozovky (směrová a výšková retifikace včetně rozšíření vozovky, úprava odvodnění, sanace podkladních vrstev atp)
  - etapa prochází převážně lesním úsekem ( pozemky Lesy ČR, silniční těleso v majetku města Sázava )
  - V případě, že by rozšíření nebylo možné vzhledem k nesouhlasu vlastníků pozemků, doporučujeme provést alespoň rekonstrukci ve stávajících šířkových parametrech.
  - *Předpoklad nutnosti podání žádosti o SP*
  - *Rozsah zpracování PD:*  
*DSP/IČ k SP/PDPS/AD*
  
- **ETAPA- úsek od konce obce Dojetřice km 25,750 – začátek obce Sázava km cca 27,500( viadukt ) .**  
Celková délka úseku 1750 m
  - Tento úsek bude nejsložitější vzhledem k vedení p.k. – silnice je zde převážně v násypu, svahy jsou velmi strmé. Dochází zde k sesedání a krajnic a svah ujíždí. Bude nutno vybudovat opěrné stěny ( nebo svahy vyztužené) tak, aby byla zajištěna stabilita silničního tělesa.
  - *Předpoklad částečného záboru sousedních pozemků, z tohoto důvodu je předpoklad nutnosti zpracovat též dokumentaci pro ÚR.*
  - *Rozsah zpracování PD:*  
*DÚR/IČ k ÚR/DSP/IČ k SP/PDPS/AD*
  
- **Etapa – začátek obce Sázava km 27,500 ( viadukt )- km 27,972 ( předpolí mostu ) a km 28,088 ( konec mostu ) km 28,311( kř. II/110 x II/335 )**

le w



### Dále II/335 km 16,008 – km 17,008 konec obce Sázava

Celková délka úseku II/110 cca 695 m.

Celková délka úseku II/335 cca 1000 m.

- zmíněný úsek je nutno koordinovat se záměry Města Sázava
- doporučujeme řešit celý úsek komplexně, tj. včetně vyřešení nevyhovujícího dopravně technického stavu křižovatek, vodorovného a svislého dopravního značení a přechodů pro chodce, které již neodpovídají současným normám.
- obrusná vrstva na úseku bude provedena z důvodu nevyhovujících parametrů ze zvukopohltivé směsi, např. typu BBTM ( gumoasfalt )
- z úseku je vyjmut most ev.č. 110-008 přes Sázavu ( je součástí jiné zakázky, projektantem je APIS s.r.o. )
- *Předpoklad nutnosti projednat návrh dopravního řešení v úseku s PČR před podáním žádosti o stavební řízení*
- *Rozsah zpracování PD:*  
*DÚR/IČ k ÚR/DSP/IČ k SP/PDPS/AD*

Zhotovitel provede koordinaci s projektem rekonstrukce mostu přes Sázavu (zpracovatel APIS, kontakt ing. Nejedlý – 602 254 560 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou č. S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

I. etapa

bez DPH: 566 000,- Kč

DPH: 118 860,- Kč

včetně DPH: 684 860,- Kč



## II. a III. etapa

bez DPH: 1 470 000,- Kč

DPH: 308 700,- Kč

včetně DPH: 1 778 700,- Kč

### b. Technická pomoc objednateli/autorský dozor

bez DPH: 620,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 130,20 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 750,20 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: ales.cermak@ksus.cz.

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

#### Etapa I:

Koncept DSP – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu realizace stavby

#### Etapa II a III

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem



Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od podpisu smlouvy  
Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR  
Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem  
Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP  
PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  
AD – v průběhu stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: původní dokumentaci zpracovanou společností CR Projekt, s.r.o..
2. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

#### Článek V.

##### Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: Technická specifikace,
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 14 -06- 2017

V Praze dne 24. 5. 2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Ateliér projektování  
inženýrských staveb, s.r.o.**

Podpis:

Jméno: Karel Nejedlý

Funkce: jednatel




ATELIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.  
Ohradní 24B  
140 00 Praha 4 - Michle

# Technická specifikace

Název akce: II/110 Ostředek – Sázava, aktualizace PD

Staničení provozní v km : 22,458 – 28,311 ( II/110 )  
16,008 – 17,008 ( II/335 )

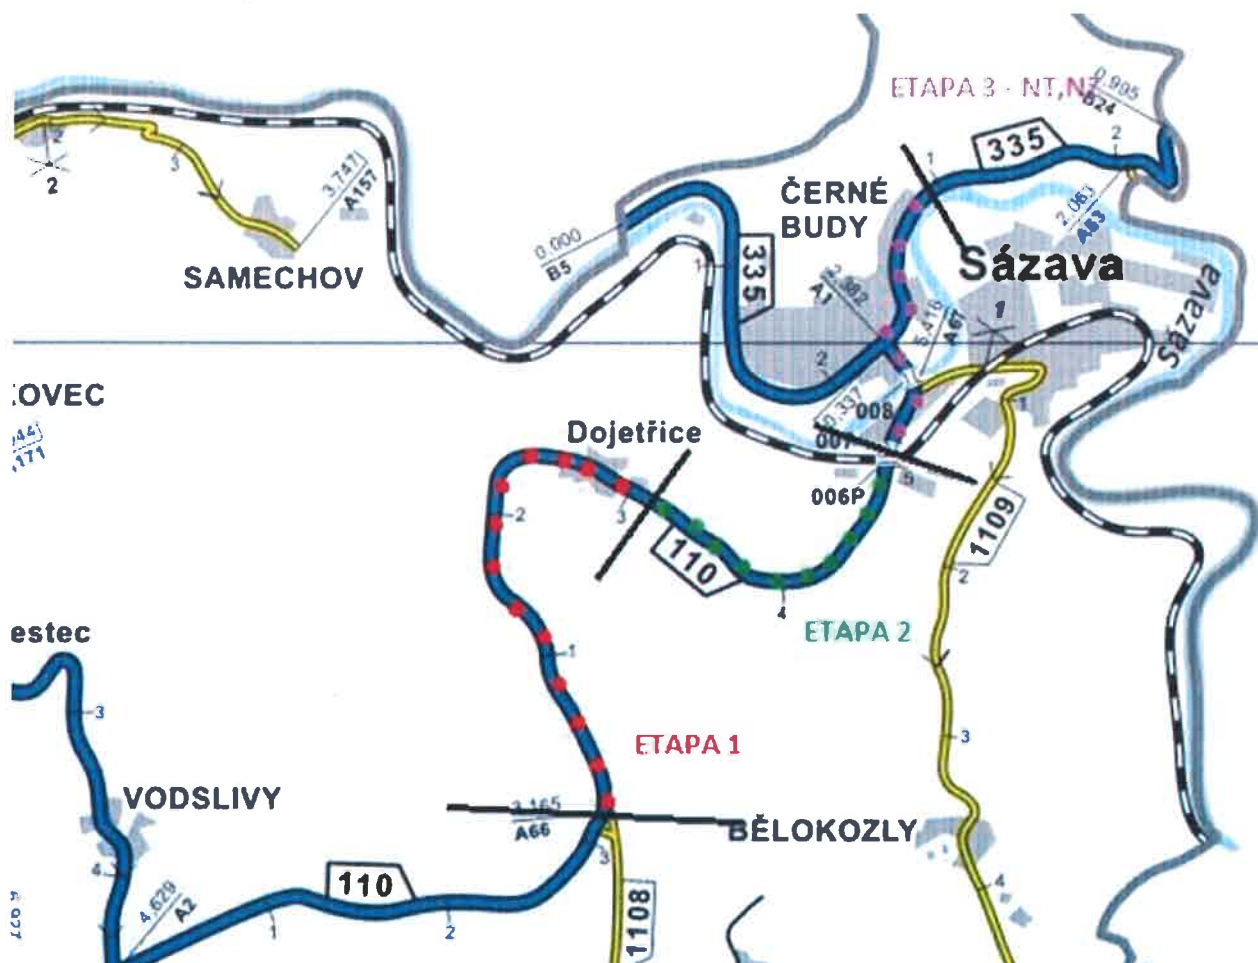

## Stručný popis zakázky:

Jedná se o aktualizaci části dokumentace ve stupni ZDS a její dopracování do podoby DÚR/DSP/ PDPS včetně aktualizovaného rozpočtu v cenách URS, inženýrské činnosti a zajištění územního rozhodnutí /ohlášení stavby / stavebního povolení, vyřešení případných majetkoprávních vztahů.

V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro komplexní rekonstrukci komunikace II/110 v úseku Ostředek – Sázava. Vzhledem ke složitosti celé akce tato rekonstrukce nebyla realizována a nebylo též vydáno stavební povolení. Zpracovatelem byla společnost Metroprojekt Praha a.s. , dílčím projektantem části CR Project s.r.o. .

Do současné doby byly provedeny pouze některé dílčí rekonstrukce objektů propustků a některé úseky rekonstrukce vozovky – bez změny stávajících parametrů. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce úseku od kř. II/113 – km 22,000, a v roce 2015/2016 rekonstrukce mostu ev.č. 110-005 v souvislosti s modernizací D1. V roce 2016/2017 je předpoklad zahájení rekonstrukce mostu 110-008 přes řeku Sázavu – tento stavební objekt není součástí aktualizace PD.

V souladu s navrhovanými řešením uvedeným v dokumentaci bude provedena rekonstrukce, rozšíření a zesílení konstrukce vozovky vybraného úseku komunikace II/110 a II/335. Z projektu budou vyjmuty stavební objekty propustků č. 1 – 4 a č. 9 ( II/110 ). Tyto byly již realizovány v minulosti.

**Současný technický stav je značně nevyhovující. Hlavními problémy jsou zejména poruchy v konstrukci vozovky – neúnosné krajnice, značně nevyhovující šířkové a směrové parametry, poruchy vozovky – síťové trhliny, koleje, poklesy vozovky a vysprávký. Od stavu popsaného v dokumentaci DZS z roku 2010 se stavební stav zhoršil – doporučujeme ověřit návrh provedením nové diagnostiky ve vybraných úsecích.**

**Vzhledem k předpokladu specifických problémů získání souhlasů vlastníků pozemků a zajištění souhlasů státní správy ( ÚR,SP) je nutno rozdělit projekt tak, aby jednotlivé etapy byly projednatelné a realizovatelné samostatně viz níže:**

**1.) ETAPA – úsek od kř. III/1108 Choratice , km 22,458 – konec obce Dojetřice km cca 25,750 .**

Celková délka úseku 3292 m

- V tomto úseku bude provedena celková rekonstrukce vozovky (směrová a výšková retifikace včetně rozšíření vozovky, úprava odvodnění, sanace podkladních vrstev atp)
- etapa prochází převážně lesním úsekem ( pozemky Lesy ČR, silniční těleso v majetku města Sázava )
- V případě, že by rozšíření nebylo možné vzhledem k nesouhlasu vlastníků pozemků, doporučujeme provést alespoň rekonstrukci ve stávajících šířkových parametrech.
- *Předpoklad nutnosti podání žádosti o SP*
- *Rozsah zpracování PD:*  
*DSP/IČ k SP/PDPS/AD*

**2.) ETAPA- úsek od konce obce Dojetřice km 25,750 – začátek obce Sázava km cca 27,500( viadukt ) .**

Celková délka úseku 1750 m

- Tento úsek bude nejsložitější vzhledem k vedení p.k. – silnice je zde převážně v násypu, svahy jsou velmi strmé. Dochází zde k sesedání a krajnic a svah ujíždí. Bude nutno vybudovat opěrné stěny ( nebo svahy vyztužené) tak, aby byla zajištěna stabilita silničního tělesa.
- *Předpoklad částečného záboru sousedních pozemků, z tohoto důvodu je předpoklad nutnosti zpracovat též dokumentaci pro ÚR.*
- *Rozsah zpracování PD:*  
*DÚR/IČ k ÚR/DSP/IČ k SP/PDPS/AD*

**3.) Etapa – začátek obce Sázava km 27,500 ( viadukt )-km 27,972( předpolí mostu ) a km 28,088 ( konec mostu ) km 28,311( kř. II/110 x II/335 )**

**Dále II/335 km 16,008 – km 17,008 konec obce Sázava**

Celková délka úseku II/110 cca 695 m.

Celková délka úseku II/335 cca 1000 m.

- zmíněný úsek je nutno koordinovat se záměry Města Sázava
- doporučujeme řešit celý úsek komplexně, tj. včetně vyřešení nevyhovujícího dopravně technického stavu křižovatek, vodorovného a svislého dopravního značení a přechodů pro chodce, které již neodpovídají současným normám.



- obrusná vrstva na úseku bude provedena z důvodu nevyhovujících parametrů ze zvukopohltivé směsi, např. typu BBTM ( gumoasfalt )
- z úseku je vyjmut most ev.č. 110-008 přes Sázavu ( je součástí jiné zakázky, projektantem je APIS s.r.o. )
- *Předpoklad nutnosti projednat návrh dopravního řešení v úseku s PČR před podáním žádosti o stavební řízení*
- *Rozsah zpracování PD:*  
*DÚR/IČ k ÚR/DSP/IČ k SP/PDPS/AD*

### **Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- a) Průzkumy a zaměření  
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.  
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).  
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.  
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
- b) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zpracována tak, aby byl minimalizován zábor pozemků.
- c) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele
- d) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**zákon o VZ**“) a vyhláškou č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o předmětu stavebních prací**“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních

staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

e) Výkon IČ k ÚR

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.

f) Výkon IČ k SP

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

g) Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na vyzvu Objednatele. Rozsah činnosti AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz [http://www.pjpk.cz/TKP\\_01.htm](http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm)).

**Kontakty :**

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov, mobil 725 144 165,  
e-mail : [ludek.benes@ksus.cz](mailto:ludek.benes@ksus.cz)

Jan Hašek, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě, mobil 725 880 215  
e-mail: [jan.hasek@ksus.cz](mailto:jan.hasek@ksus.cz)

Vladimír Sochůrek, provozní cestmistr, mobil: 602 577 790,  
e -mail: [vladimir.sochurek@ksus.cz](mailto:vladimir.sochurek@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

## Fotodokumentace



Etapa 1 – výtluky, ztráta makrotextury, deformace



Etapa 1 – výtluky, vysprávkky





Etapa 1 před Dojetřicemi – deformace krajnic, síťové trhliny, vysprávkky



Etapa 2 za Dojetřicemi – deformace krajnic, podélné trhliny,



Etapa 2 za Dojetřicemi – deformace krajnic, podélné trhliny,



Etapa 2 za Dojetřicemi – chybějící krajnice, nestabilní svah



Etapa 2 Sázava – konec úseku



Etapa 3 – II/110 před mostem ev.č. 110-008



Etapa 3 – II/110 za mostem ev.č. 110-008



Etapa 3 – kř. II/110 x II/335





Etapa 3 – II/335 – ztráta protismykových vlastností, deformace, síťové trhliny



Etapa 3 – II/335 – příčné a podélné trhliny, síťové trhliny

Konec úseku etapy 3.



## Podrobná specifikace ceny

## AKCE

## Příloha č. 2

## II/110 Ostrédek – Sázava, aktualizace PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. - část VD-ZDS*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednatel - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>29 800 000</b>	1,497%	0,436%	3,252%	0,792%	0,792%	620	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	180	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	447 000	179 000	983 000	373 000	238 000	163 000	2 383 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	446 000	190 000	969 000	255 000	236 000	117 800	2 153 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	99,78%	72,63%	98,58%	68,36%	99,16%	72,27%	90,38%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedené v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" - příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit \*\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

## Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR	OK
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k	OK
ÚR Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP	OK
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP	OK
Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	OK

V Praze dne 26.4.2017

Ing. Karel Mejstřík, jednatel  
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

*K. Mejstřík*

ATLIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENÝRSKÝ SERVIS s.r.o.  
Chrástní 249  
a p i s 140 00 Praha 4 - Michle

II/110 Ostředek – Sázava, aktualizace PD  
II. a III. etapa

Žlutě oceněná uchazeč	Nabídková cena uchazeče v Kč
0 popis položky	
Průzkumy a podklady	
Zjištění průběhu a zářez IS, zaměření	10 000,00
Diagnostika vozovky	86 000,00
Digitální katastrální mapa	10 000,00
Místí šetření	10 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>116 000,00</b>
DUR	
Průvodní zpráva	20 000,00
Výkresová část	290 000,00
Dokladová část	20 000,00
<b>DUR celkem</b>	<b>330 000,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>446 000,00</b>
DSP	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	150 000,00
Stavební část	320 000,00
DIO	25 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady, doplňující průzkumy	10 000,00
<b>BOZP</b>	<b>8 000,00</b>
<b>DSP celkem</b>	<b>533 000,00</b>
IC-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	60 000,00
majetkoprávní podklady	60 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
<b>IC celkem</b>	<b>130 000,00</b>
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	50 000,00
majetkoprávní podklady	135 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
<b>IC celkem</b>	<b>195 000,00</b>
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	130 000,00
ZTKP	6 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>166 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 470 000,00</b>

V Praze dne 26.4.2017

Ing. Karel Nejedlý, jednatel  
osobně oprávněný podepisovat za obh.

Podpis

*Wojcody*

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB s.r.o.  
Chvátník 246  
140 00 Praha 4 - Michle

I. etapa

Žlutě oceněná uchazeč	Nabídková cena uchazeče v Kč
0 popis položky	
Průzkumy a podklady	
Zjištění průběhu a zářez IS, zaměření	10 000,00
Diagnostika vozovky	80 000,00
Digitální katastrální mapa	10 000,00
Místí šetření	10 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>110 000,00</b>
DSP	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	100 000,00
Stavební část	170 000,00
DIO	20 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	8 000,00
<b>BOZP</b>	<b>8 000,00</b>
<b>DSP celkem</b>	<b>326 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>436 000,00</b>
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	20 000,00
majetkoprávní podklady	30 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
<b>IC celkem</b>	<b>80 000,00</b>
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	40 000,00
ZTKP	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	15 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>70 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>566 000,00</b>

## Autorský dozor

## II/110 Ostředek – Sázava, aktualizace PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>190</b>	<b>620</b>	<b>117 800</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	35
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	60
celkem hodin	190
Kč/hod	620
Celkem Kč bez DPH	117 800

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 26.4.2017

Ing. Karel Nejedlý, jednatel  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENYRSKÝCH STAVEB s.r.o.  
Onraďm 24B  
140 00 Praha 4 - Michle
